

přehled staveb **ŘSD**



Dálnice D3


Stav k 11/2020

Středočeský úsek (Praha – Nová Hospoda)

Klíčová data

Úsek	DÁLNIČE D3 – název stavby	Délka (km)	Zahájení	Zprovoznění	Cena (Kč)
0301	Praha–Jílové	9,5	2024	2028	8 462 000 000*
0302	Jílové–Hostěradice	4,5	2024	2028	5 589 000 000*
0303	Hostěradice–Václavice	11,3	2024	2028	6 782 000 000*
0304	Václavice–Voračice	16,7	2024	2028	9 422 000 000*
0305/I	Voračice–Nová Hospoda	16,5	2024	2028	7 646 000 000*
Celkem km / Kč		58,5			37 901 000 000

* Předpokládaná cena

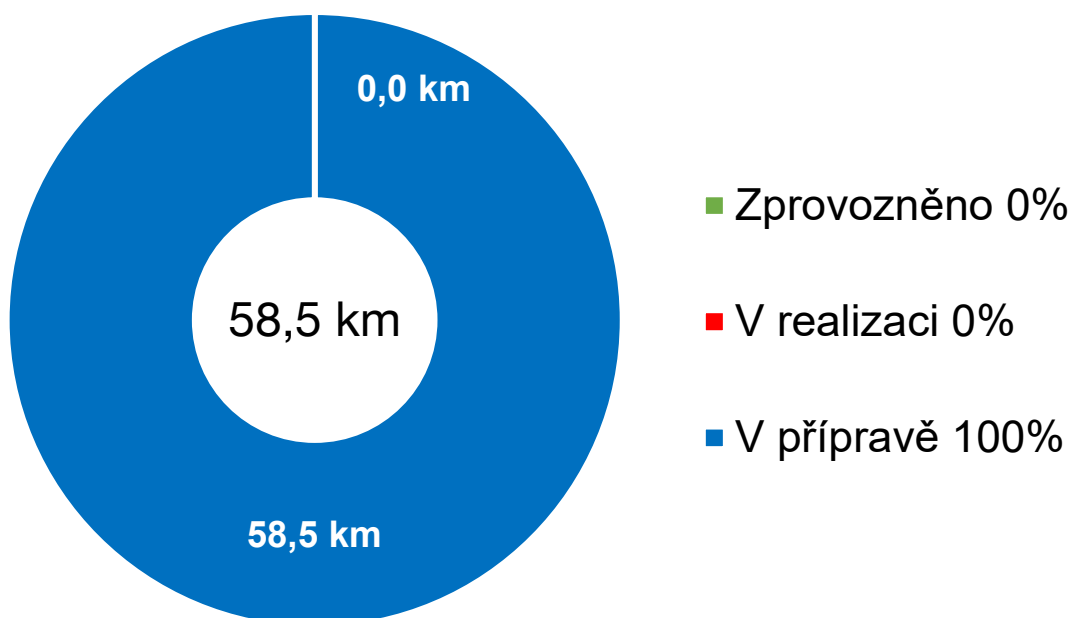

SILNICE – dálniční přivaděče*	Délka (km)	Zahájení	Zprovoznění	Cena (Kč)
Přivaděč Benešov	5,8	2024	2028	1 138 000 000*
Jižní přivaděč Jílové u Prahy	1,9	2024	2028	226 000 000*
Přivaděč Týnec n.S.	3,2	2024	2028	203 000 000*
Celkem km / Kč	10,9			1 567 000 000

* Přivaděče budou uvedeny do provozu až společně s dálnicí.

5

Praha

Dálnice D3

Středočeský úsek

Černošice

Říčany

0

D3 x D0

Pšáry

Jílové

Hostěradice

Dunávice

Václavice

Neštětice

Voračice

Loudilka

62

70 Chotoviny

Benešov

3

3

18

Sedlčany

Votice

3

19



předpoklad zahájení v roce 2024 – 58,5 km

Celková délka: 58,5 km
stav k 11/2020

0302 Jílové – Hostěradice (4,5 km)
(předpokl. realizace 2024 – 2028)

0301 Praha – Jílové (9,5 km)
(předpokl. realizace 2024 – 2028)

0301 Jižní obchvat Jílového u Prahy (2,0 km)
(předpokl. realizace 2024 – 2028)

0303 Přivaděč Týnec n. S. (3,2 km)
(předpokl. realizace 2024 – 2028)

0303 Hostěradice – Václavice (11,3 km)
(předpokl. realizace 2024 – 2028)

0304 Václavice – Voračice (16,7 km)
(předpokl. realizace 2024 – 2028)

0305/I Voračice – Nová Hospoda (16,5 km)
(předpokl. realizace 2024 – 2028)

Legenda

dálnice
silnice I. třídy, 4pruhově
silnice pro motorová vozidla
silnice I. třídy
silnice II. třídy

- - - státní hranice

3 číslo dálnice

34 číslo silnice

0 5 10 km



Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2015

ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR



Územní řízení	- Územní řízení zahájeno podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí dne 31. 10. 2018 na úseky 0301–0305/1 včetně přívaděče Týnec nad Sázavou. - Dne 26. 3. 2019 obdržena výzva ke stavbě D3 0301–0303 (Praha–Václavice) od MěÚ Benešov, Odbor výstavby a územního plánování k doplnění podkladů (mj. výjimky ze zvláště chráněných druhů živočichů podle §56, závazného stanoviska ke kácení mimolesní zeleně), řízení přerušeno do 30. 6. 2021. - Dne 6. 5. 2019 obdržena výzva ke stavbě D3 0303 přívaděč Týnec nad Sázavou od MÚ Benešova, Odbor výstavby a územního plánování k doplnění podkladů (mj. výjimky ze zvláště chráněných druhů živočichů podle §56, závazného stanoviska ke kácení mimolesní zeleně), řízení přerušeno do 30. 6. 2021. - Výzva k doplnění podkladů pro D3 0304 Václavice – Voračice vydána 25. 11. 2019, termín doplnění podkladů stanoven do 30. 6. 2021. - Dne 11. 8. 2020 obdržena výzva stavebního úřadu Benešov k doplnění podkladů do řízení na stavbu D3 0305/1 Voračice – Nová Hospoda, řízení přerušeno do doby doplnění podkladů, nejpozději do 30. 12. 2020.
Závazná stanoviska ke kácení mimolesní zeleně (stavby 0301–0305/I)	Chybí některá závazná stanoviska pro kácení mimolesní zeleně (legislativu k 1. 4. 2019 opravilo MŽP po urgencích MD), některá závazná stanoviska z formálního hlediska nesplňují požadavky legislativy, vydání některých stanovisek obce účelové blokují – probíhají jednání s obcemi, řešení opatření proti nečinnosti – stížnost na nesprávný úřední postup. Aktuální stav: - O závazná stanoviska bylo požádáno v červnu 2019, na úseku 0301–0303 se jedná celkem o 18 stanovisek obcí, dosud získáno devět závazných stanovisek, ostatní obce buď závazné stanovisko nevydaly (účelové blokování řízení), nebo je jejich stanovisko v rozporu s § 8, odst.6 zák.č.114/1992 Sb. – v řešení opatření proti nečinnosti nebo stížnost na nesprávný úřední postup. - U přívaděče Týnec nad Sázavou zajišťována 4 stanoviska – zatím získána 2 stanoviska. - Pro stavbu D3 0305/I zajišťováno celkem 7 stanovisek – , zatím získáno 5 stanovisek, v řešení opatření proti nečinnosti. Pro stavbu D3 0304 aktuálně zajišťováno 7 závazných stanovisek – zatím získáno 5 stanovisek, v řešení opatření proti nečinnosti. Opatření proti nečinnosti obcí řešeno ve spolupráci se stavebním úřadem Benešov, který se obrátil na nadřízený správní orgán – tj. na KÚ Středočeského Kraje se žádostí o metodické doporučení.
Verifikace EIA a problematika změn provedených v DUR v úseku MÚK Jílové – MÚK Hostěradice	- ŘSD ČR obdrželo dne 25. 10. 2018 v rámci své žádosti o vyjádření ve smyslu §23 odst. 3 Zákona č. 100/2001 Sb. stanovisko MŽP ČR, podle kterého MŽP předběžně v km 9,0–14,0 (úsek MÚK Jílové – MÚK Hostěradice) vyhodnotilo, že změny provedené v záměru oproti EIA podléhají zjišťovacímu řízení a doporučilo vzhledem k charakteru změny zpracovat dokumentaci v rozsahu přílohy č. 4 zákona. Vývoj projednávání připomínek k dokumentaci EIA a aktuální stav: - Dne 26. 11. 2019 bylo předloženo Oznámení změny záměru „D3 0301–0303 Praha–Václavice, změny v úseku MÚK Jílové – MÚK Hostěradice“ na KÚSK, odbor životního prostředí a zemědělství. Dne 5. 12. 2020 zahájeno zjišťovací řízení (zveřejněno na portálu CENIA). Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 24. 6. 2020 - provedené změny záměru nemohou mít významný vliv na životní prostředí, a proto nebudou dále posuzovány v procesu EIA. K vydanému závěru zjišťovacího řízení přišly 3 rozklady, okrašlovací spolek v Jílovém u Prahy, Alternativa. Po vydání rozkladu MŽP se rovněž předpokládá podání správní žaloby proti obsahu rozhodnutí. - Dne 26. 11. 2019 bylo předloženo Oznámení změny záměru „D3 – odpočívka Dunávice“ na KÚSK, odbor životního prostředí a zemědělství. Dne 5. 12. 2020 bylo zahájeno zjišťovací řízení (zveřejněno na portálu CENIA). Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 12. 3. 2020 – změny záměru musí být posouzeny v procesu EIA. . K závěru zjišťovacího řízení v zákonné lhůtě přišly 3 rozklady: - Spolek Krajina 2000 zastoupená JUDr. Bernardem. - Okrašlovací spolek v Jílovém u Prahy a - Alternativa Středočeské D3.

Výjimky ze zvláště chráněných druhů organismů podle §56 zákona č. 114/1992 Sb.

Aktuálně chybí pro všechny úseky Středočeské D3 pravomocná Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1997 Sb. (Středočeský kraj byl MŽP uznán jako systémově podjatý a nově vede řízení Plzeňský kraj – spis byl zaslán z MŽP na KÚ Plzeňského kraje).

Aktuální stav k řízení o výjimkách dle § 56 ZOPK:

Řízení vedená na KÚ Plzeňského kraje z důvodu systémové podjatosti KÚ Středočeského kraje:

- **D3 0301–0303 Praha–Václavice** – oznámení o pokračování řízení a výzva vyjádření se k podkladům – 18. 10. 2019. Lhůta pro podání námitek uplynula 20. 11. 2019 => KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí 18. 5. 2020. K vydanému rozhodnutí bylo doručeno 11. odvolání (Krajina 2000, Město Jesenice, Děti Země, ČSOP Benešov, Obec Lešany, Obec Krňany, Městys Netvořice, Obec Okrouhlo, Sdružení Miláčov, Věra Červová, Josef Žížala). Odvolací řízení ukončeno – dne 5. 11. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1997 Sb. ze dne 18. 5. 2020 a vrátilo věc k novému projednání.
- **D3 0304 Václavice–Voračice** – oznámení o pokračování řízení a výzva vyjádření se k podkladům – 1. 11. 2019. Lhůta pro podání námitek uplynula 20. 11. 2019 => KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí 25. 3. 2020. K vydanému rozhodnutí bylo doručeno 9 odvolání (Krajina 2000, Děti Země, Sdružení Miláčov, ČSOP Benešov, Obec Tisem, Městys Maršovice, Ing. Petr Hanzlík, Josef Žížala, Zdeněk Štěpánek). Odvolací řízení ukončeno – dne 10. 9. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1997 Sb. ze dne 20. 3. 2020 a vrátilo věc k novému projednání.
- **D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda** – oznámení o pokračování řízení a výzva vyjádření se k podkladům – 7. 11. 2019. Lhůta pro podání námitek uplynula 22. 11. 2019 => KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí 13. 3. 2020. K vydanému Rozhodnutí byla doručena 3 odvolání (Krajina 2000, Děti Země, Sdružení Miláčov), odvolací řízení ukončeno – dne 1. 9. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1997 Sb. ze dne 13. 3. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 23. 10. 2020 oznámil KÚ Plzeňského kraje pokračování řízení a vyzval ŘSD ČR k doplnění podkladů (stanoviska vlastníků dotčených realizací kompenzačních opatření, konkretizaci časové působnosti požadované výjimky, řádovou kvantifikaci počtu jedinců druhů jednotlivých zvláště chráněných druhů živočichů).
- **D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou** – oznámení o pokračování řízení a výzva vyjádření se k podkladům – 26. 11. 2019. Lhůta pro podání námitek uplynula 22. 11. 2019 => KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí 2. 4. 2020. K vydanému rozhodnutí doručena 3 odvolání (Sdružení Miláčov, Městys Netvořice, Josef Žížala). Odvolací řízení ukončeno – dne 28. 8. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1997 Sb. ze dne 2. 4. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 15. 10. 2020 oznámil KÚ Plzeňského kraje pokračování řízení a vyzval ŘSD ČR k doplnění podkladů (stanoviska vlastníků dotčených realizací kompenzačních opatření, odůvodnění veřejného zájmu, řádovou kvantifikaci počtu jedinců druhů jednotlivých zvláště chráněných druhů živočichů).

Řízení vedené KÚ Středočeského kraje:

- **D3 0301 Přivaděč Jižní Obchvat Jílového u Prahy** – dne 22. 1. 2020 vydáno nepravomocné Rozhodnutí – proti vydanému Rozhodnutí byla podána dvě odvolání (Krajina 2000, Děti Země). Dne 4. 8. 2020 bylo MŽP potvrzeno vydané Rozhodnutí a nabylo právní moci. Dne 26. 10. 2020 bylo doručeno podání žaloby na vydané Rozhodnutí spolkem Krajina 2000.




D3 0301 Jižní obchvat Jílového	Stavba Jižního přivaděče Jílového byla z důvodu nesouladu územního plánu města Jílového a vedení trasy vyčleněna do samostatného řízení. Inženýrská činnost byla přerušena, 28. 1. 2019 byla schválena 4. změna ÚP plánu města Jílového. V současné době probíhá inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí. Předpoklad podání žádosti o vydání územního rozhodnutí je v 31. 3. 2021.
D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou	- Rozhodnutím MŽP ze dne 8. 2. 2019 bylo zrušeno již vydané Rozhodnutí o výjimkách ze zákazu zvláště chráněných živočichů pro stavbu D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou rovněž z důvodu systémové podjatosti Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství na základě podaných námitek účastníků řízení. - Žádost o vydání výjimek podána 22. 8. 2018, na základě velkého množství námitek v řízení několikrát prodlužována lhůta na seznámení účastníků s podklady v řízení, Rozhodnutí bylo KÚSK, Odborem životního prostředí vydáno dne 13. 11. 2018, 7. 12. 2018 dne podána odvolání Sdružením Miláčov, z.s. - Dne 25. 4. 2019 vydáno Usnesení o přerušení řízení Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem životního prostředí do doby doplnění podkladů. Aktuální stav řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK: - D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou – oznámení o pokračování řízení a výzva vyjádření se k podkladům – 26. 11. 2019. Lhůta pro podání námitek uplynula 22. 11. 2019 => KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí 2. 4. 2020 – k vydanému rozhodnutí doručena 3 odvolání (Sdružení Miláčov, Městys Netvořice, Josef Žížala). Odvolací řízení ukončeno – dne 28. 8. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1997 Sb. ze dne 2. 4. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 15.10. 2020 oznámil KÚ Plzeňského kraje pokračování řízení a vyzval ŘSD ČR k doplnění podkladů (stanoviska vlastníků dotčených realizací kompenzačních opatření, odůvodnění veřejného zájmu, řádovou kvantifikaci počtu jedinců druhů jednotlivých zvláště chráněných druhů živočichů).
Stavby D3 0301–D3 0303	- Vydáno kladné stanovisko EIA (platné do 1. 2. 2022). - Dne 31. 10. 2018 podána žádost o vydání územního rozhodnutí a vydání certifikačního stanoviska k EIA. ÚR má vydat stavební úřad Benešov, odvolání bude řešit Krajský úřad Středočeského kraje. - Předpoklad vydání nepravomocného územního rozhodnutí je do 06/2022. Probíhá doplňování podkladů do řízení. RIZIKA: - Velký odpor občanských sdružení a s nimi sympatizujících obcí, blokáce a zdržování veškerých správních procesů (Alternativa D3, Krajina 2000, zájmové sdružení Klid, Občanské sdružení Miláčov, Klidné údolí, aj.). - Odvolání proti vydaným správním rozhodnutím. - Vydání pravomocného Rozhodnutí o výjimkách ze zvláště chráněných druhů organismů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb - reálně lze očekávat prodloužení standardních správních lhůt a odvolání proti vydanému Rozhodnutí ze stran občanských sdružení přihlášených do řízení – zdržení získání pravomocné výjimky až o 1 rok. - Obesilání oznámení o zahájení územního řízení účastníkům řízení stavebním úřadem Benešov po seznámení s podklady může dle zkušeností z jiných obdobně rozsáhlých staveb trvat až 9 měsíců. - Reálně lze očekávat odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí ze stran občanských sdružení a obcí, což může vyvolat zdržení získání pravomocného územního řízení až o 1 rok. - Posouzení vlivu změn v úseku MÚK Jílové – MÚK Hostěradice, km 9,00–14,00 na životní prostředí z důvodu provedených změn v dokumentaci DUR oproti EIA provedených ve prospěch dotčených obcí. Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 24. 6. 2020 - provedené změny záměru nemohou mít významný vliv na životní prostředí, a proto nebudou dále posuzovány v procesu EIA. K vydanému závěru zjišťovacího řízení přišly tři rozklady (okrašlovací spolek v Jílovém u Prahy, Alternativa). Po vydání rozkladu MŽP se rovněž předpokládá podání správní žaloby proti obsahu rozhodnutí.
Stavby D3 0304 a D3 0305/I	- Vydáno kladné stanovisko EIA (platné do 1. 2. 2022). - Dne 26. 10. 2018 podána žádost o vydání certifikačního stanoviska k EIA a dne 31. 10. 2018 žádost o vydání územního rozhodnutí. - Předpoklad vydání územního rozhodnutí je do 06/2021. Výzva k doplnění podkladů pro D3 0304 Václavice – Voračice vydána 25. 11. 2019, termín doplnění podkladů je prodloužen do 30. 6. 2021. - Probíhá zajišťování chybějících závazných stanovisek ke kácení mimolesní zeleně. RIZIKA - Velký odpor občanských sdružení a s nimi sympatizujících obcí, blokáce a zdržování veškerých správních procesů (Alternativa D3, Krajina 2000, zájmové sdružení Klid, Občanské sdružení Miláčov aj.). - Odvolání proti vydaným správním rozhodnutím. - Vydání pravomocného Rozhodnutí o výjimkách ze zvláště chráněných druhů organismů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb - reálně lze očekávat prodloužení standardních správních lhůt a odvolání proti vydanému Rozhodnutí ze stran občanských sdružení přihlášených do řízení, což může vyvolat zdržení získání pravomocné výjimky až o 1 rok. - Obesilání oznámení o zahájení územního řízení účastníkům řízení stavebním úřadem Benešov po seznámení s podklady může dle zkušeností z jiných obdobně rozsáhlých staveb trvat až 9 měsíců. - Reálně lze očekávat odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí ze stran občanských sdružení a obcí, což může vyvolat zdržení získání pravomocného územního řízení až o 1 rok.

Poznámky



D3 0301 Praha–Jilové

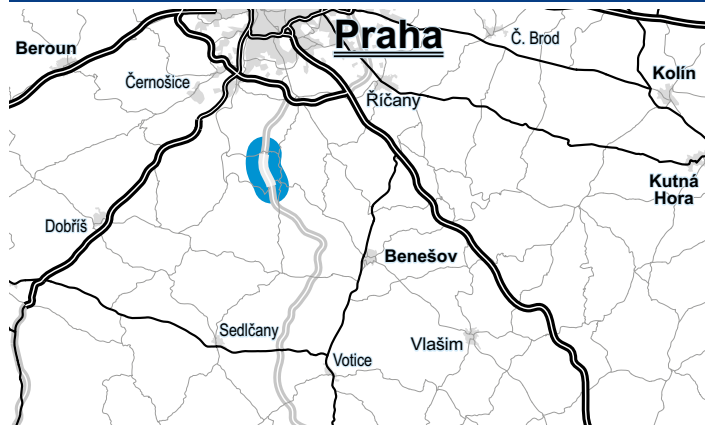

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2012	10/2015	2022	2024	2024	2024	2028

Stav	V přípravě
Délka (m)	9514
Kategorie	D 27,5/120
Tunely	Libeň; Kamenná Vrata (celková délka: 3207 m)
Mosty (dálniční)	5
MÚK	MÚK Jilové, MÚK Psáry, MÚK D3xD0
Zhotovitel DÚR	Pragoprojekt, Amberg, Mott Macdonald
Cena (bez DPH)	8 462 000 000 Kč

Stav MPV

Dosud nebylo zahájeno.

Aktuální problém v přípravě

- **Územní řízení je přerušeno** – chybí pravomocné Rozhodnutí o výjimkách ze zvláště chráněných druhů organismů podle §56 zákona č. 114/1992 Sb., závazná stanoviska ke kácení mimolesní zeleně.
- Nutnost posouzení vlivu změn v dokumentaci DUR v km 0,9 – 0,14 a změn provedených u Odpočívky Dunávice na životní prostředí.

Další informace

- Usnesením MŽP ze dne 8. 2. 2019 byl k pokračování v řízení a k vydání Rozhodnutí o výjimkách na stavby D3 0301–0303 pověřen Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí z důvodu systémové podjatosti Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství na základě podaných námitek účastníků řízení.
- Žádost o vydání výjimek podána 3. 7. 2018, na základě velkého množství námitek v řízení několikrát prodlužována lhůta na seznámení účastníků s podklady v řízení.
- Dne 7. 5. 2019 vydáno Usnesení o přerušení řízení Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem životního prostředí do doby doplnění podkladů.

Aktuální stav řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK:


- D3 0301–0303 Praha–Václavice – oznámení o pokračování řízení a výzva vyjádření se k podkladům – 18. 10. 2019, lhůta pro podání námitek uplynula 20. 11. 2019 => KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí 18. 5. 2020 – k vydanému rozhodnutí bylo doručeno 11 odvolání (Krajina 2000, Město Jesenice, Děti Země, ČSOP Benešov, Obec Lešany, Obec Krňany, Městys Netvořice, Obec Okrouhlo, Sdružení Miláčov, Věra Červová, Josef Žizala).). Odvolací řízení ukončeno – dne 5. 11. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1997 Sb. ze dne 18. 5. 2020 a vrátilo věc k novému projednání.

Posuzování změn záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí – akt. stav:

- 26. 11. 2019 bylo předloženo Oznámení změny záměru „D3 0301–0303 Praha–Václavice, změny v úseku MÚK Jilové – MÚK Hostěradice“ na MŽP. Dne 5. 12. 2020 zahájeno zjišťovací řízení (zveřejněno na portálu CENIA). Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 24. 6. 2020 - provedené změny záměru nemohou mít významný vliv na životní prostředí, a proto nebudou dále posuzovány v procesu EIA. K vydanému závěru zjišťovacího řízení přišly 3 rozklady, okrašlovací spolek v Jilovém u Prahy, Alternativa. Po vydání rozkladu MŽP se rovněž předpokládá podání správní žaloby proti obsahu rozhodnutí.
- Dne 26. 11. 2019 bylo předloženo Oznámení změny záměru „D3 – odpočívka Dunávice“ na KÚSK, odbor životního prostředí a zemědělství. Dne 5. 12. 2020 bylo zahájeno zjišťovací řízení (zveřejněno na portálu CENIA). Závěr zjišťovacího řízení vydán dne 12.3.2020=>změny záměru musí být posouzeny v procesu EIA.
- Odpočívka Dunávice bude vyčleněna do samostatné přípravy, žádost o vydání územního rozhodnutí bude o odpočívku Dunávice zúžena.

Opatření k urychlení přípravy/výstavby

Opatření vyžadovaná od ministra/premiéra

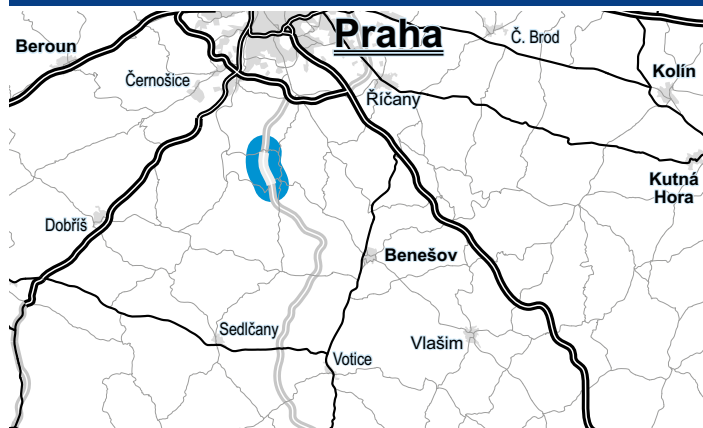

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2012	10/2015	2022	2024	2024	2024	2028
Stav		V přípravě				
Délka (m)		4486				
Kategorie		D 27,5/120				
Tunely		Luka (1843 m)				
Mosty (dálniční)		3				
MÚK		MÚK Hostěradice				
Zhotovitel DÚR		Pragoprojekt, Amberg, Mott Macdonald				
Cena (bez DPH)		5 589 000 000 Kč				

Stav MPV

Dosud nebylo zahájeno.

Aktuální problém v přípravě

- **Územní řízení je přerušeno** – chybí pravomocné Rozhodnutí o výjimkách ze zvláště chráněných druhů organismů podle §56 zákona č. 114/1992 Sb., závazná stanoviska ke kácení mimolesní zeleně.
- Nutnost posouzení vlivu změn v dokumentaci DUR v km 0,9 – 0,14 a změn provedených u Odpočívky Dunávice na životní prostředí.

Další informace

- Usnesením MŽP ze dne 8. 2. 2019 byl k pokračování v řízení a k vydání Rozhodnutí o výjimkách na stavby D3 0301–0303 pověřen Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí z důvodu systémové podjatosti Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství na základě podaných námitek účastníků řízení.
- Žádost o vydání výjimek podána 3. 7. 2018, na základě velkého množství námitek v řízení několikrát prodlužována lhůta na seznámení účastníků s podklady v řízení.
- Dne 7. 5. 2019 vydáno Usnesení o přerušení řízení Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem životního prostředí do doby doplnění podkladů.

Aktuální stav řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK:

- D3 0301–0303 Praha–Václavice – oznámení o pokračování řízení a výzva vyjádření se k podkladům – 18. 10. 2019, lhůta pro podání námitek uplynula 20. 11. 2019 => KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí 18. 5. 2020 – k vydanému rozhodnutí bylo doručeno 11 odvolání (Krajina 2000, Město Jesenice, Děti Země, ČSOP Benešov, Obec Lešany, Obec Krňany, Městys Netvořice, Obec Okrouhlo, Sdružení Miláčov, Věra Červová, Josef Žížala).). Odvolací řízení ukončeno – dne 5. 11. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1997 Sb. ze dne 18. 5. 2020 a vrátilo věc k novému projednání.


Posuzování změn záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. , O posuzování vlivů na životní prostředí – akt. stav:

- 26. 11. 2019 bylo předloženo Oznámení změny záměru „D3 0301–0303 Praha–Václavice, změny v úseku MÚK Jilové – MÚK Hostěradice“ na MŽP. Dne 5. 12. 2020 zahájeno zjišťovací řízení (zveřejněno na portálu CENIA). Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 24. 6. 2020 - provedené změny záměru nemohou mít významný vliv na životní prostředí, a proto nebudou dále posuzovány v procesu EIA. K vydanému závěru zjišťovacího řízení přišly 3 rozklady, okrašlovací spolek v Jilovém u Prahy, Alternativa. Po vydání rozkladu MŽP se rovněž předpokládá podání správní žaloby proti obsahu rozhodnutí.
- Dne 26. 11. 2019 bylo předloženo Oznámení změny záměru „D3 – odpočívka Dunávice“ na KÚSK, odbor životního prostředí a zemědělství. Dne 5. 12. 2020 bylo zahájeno zjišťovací řízení (zveřejněno na portálu CENIA). Závěr zjišťovacího řízení vydán dne 12.3.2020=>změny záměru musí být posouzeny v procesu EIA.
- Odpočívka Dunávice bude vyčleněna do samostatné přípravy, žádost o vydání územního rozhodnutí bude o odpočívku Dunávice zúžena.

Opatření k urychlení přípravy/výstavby**Opatření vyžadovaná od ministra/premiéra**



0303 Hostěradice–Václavice

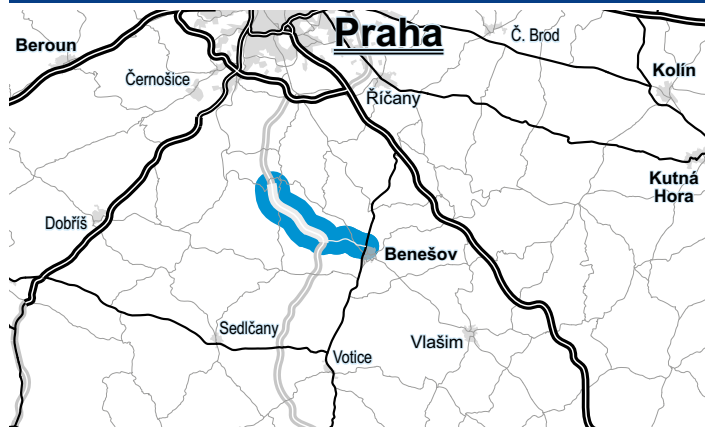

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2012	10/2015	2022	2024	2024	2024	2028

Stav	V přípravě
Délka (m)	11 292
Kategorie	D 27,5/120
Tunely	Hostěradice; Vršky; Krňany (celkem 946 m)
Mosty (dálniční)	11
MÚK	MÚK Václavice, MÚK Dunávice
Zhotovitel DÚR	Pragoprojekt, Amberg, Mott MacDonald
Cena (bez DPH)	7 965 000 000 Kč

Stav MPV

Dosud nebylo zahájeno.

Aktuální problém v přípravě


Územní řízení je přerušeno – chybí pravomocné Rozhodnutí o výjimkách ze zvláště chráněných druhů organismů podle §56 zákona č. 114/1992 Sb., závazná stanoviska ke kácení mimolesní zeleně. Nutnost posouzení vlivu změn v dokumentaci DUR v km 0,9 – 0,14 a změn provedených u Odpočívky Dunávice na životní prostředí.

Další informace

- Usnesením MŽP ze dne 8. 2. 2019 byl k pokračování v řízení a k vydání Rozhodnutí o výjimkách na stavby D3 0301–0303 pověřen Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí z důvodu systémové podjatosti Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství na základě podaných námitek účastníků řízení.
- Žádost o vydání výjimek podána 3. 7. 2018, na základě velkého množství námitek v řízení několikrát prodlužována lhůta na seznámení účastníků s podklady v řízení.
- Dne 7. 5. 2019 vydáno Usnesení o přerušení řízení Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem životního prostředí do doby doplnění podkladů.
-
- Aktuální stav řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK:**
- D3 0301–0303 Praha–Václavice – oznámení o pokračování řízení a výzva vyjádření se k podkladům – 18. 10. 2019, lhůta pro podání námitek uplynula 20. 11. 2019 => KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí 18. 5. 2020 – k vydanému rozhodnutí bylo doručeno 11 odvolání (Krajina 2000, Město Jesenice, Děti Země, ČSOP Benešov, Obec Lešany, Obec Krňany, Městys Netvořice, Obec Okrouhlo, Sdružení Miláčov, Věra Červová, Josef Žízala). Odvolací řízení ukončeno – dne 5. 11. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1997 Sb. ze dne 18. 5. 2020 a vrátilo věc k novému projednání.
- Posuzování změn záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí – akt. stav:**
- 26. 11. 2019 bylo předloženo Oznámení změny záměru „D3 0301–0303 Praha–Václavice, změny v úseku MÚK Jilové – MÚK Hostěradice“ na MŽP. Dne 5. 12. 2020 zahájeno zjišťovací řízení (zveřejněno na portálu CENIA). Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 24. 6. 2020 - provedené změny záměru nemohou mít významný vliv na životní prostředí, a proto nebudou dále posuzovány v procesu EIA. K vydanému závěru zjišťovacího řízení přišly 3 rozklady, okrašlovací spolek v Jilově u Prahy, Alternativa. Po vydání rozkladu MŽP se rovněž předpokládá podání správní žaloby proti obsahu rozhodnutí.
- Dne 26. 11. 2019 bylo předloženo Oznámení změny záměru „D3 – odpočívka Dunávice“ na KÚSK, odbor životního prostředí a zemědělství. Dne 5. 12. 2020 bylo zahájeno zjišťovací řízení (zveřejněno na portálu CENIA). Závěr zjišťovacího řízení vydán dne 12.3.2020=>změny záměru musí být posouzeny v procesu EIA.
- Odpočívka Dunávice bude vyčleněna do samostatné přípravy, žádost o vydání územního rozhodnutí bude o odpočívku Dunávice zúžena.

Opatření k urychlení přípravy/výstavby

Opatření vyžadovaná od ministra/premiéra

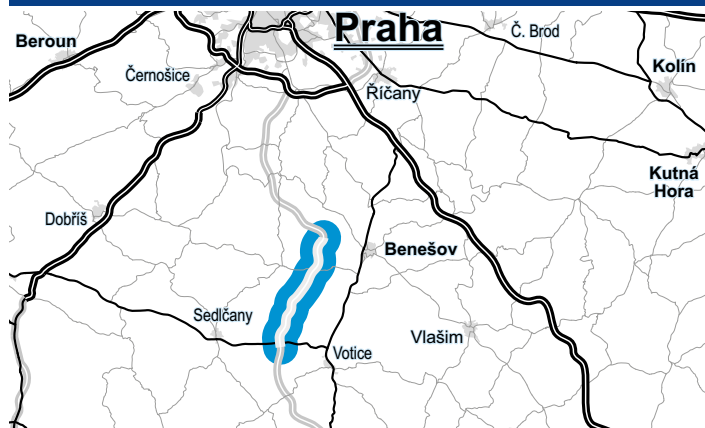

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2012	10/2015	2022	2024	2024	2024	2028

Stav	V přípravě
Délka (m)	16 700
Kategorie	D 27,5/120
Tunely	Prostřední vrch (960 m)
Mosty (dálniční)	12
MÚK	MÚK Voračice, MÚK Neštětice
Zhotovitel TS	SUDOP PRAHA a.s.
Cena (bez DPH)	9 422 000 000 Kč

Stav MPV

Dosud nebylo zahájeno.

Aktuální problém v přípravě

Probíhá zajišťování chybějících stanovisek a Rozhodnutí – chybí pravomocné Rozhodnutí o výjimkách ze zvláště chráněných druhů organismů podle §56 zákona č. 114/1992 Sb., závazná stanoviska ke kácení mimolesní zeleně.

Další informace

- Žádosti o vydání výjimek podány 1. 12. 2017 a 3. 1. 2018, na základě velkého množství námitek v řízení několikrát prodlužována lhůta na seznámení účastníků s podklady v řízení.
- Usnesením MŽP ze dne 8. 2. 2019 byl k pokračování v řízení a k vydání Rozhodnutí o výjimkách na stavbu 0304 pověřen Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí z důvodu systémové podjatosti Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství na základě podaných námitek účastníků řízení.
- Dne 13. 5. 2019 vydáno Usnesení o přerušení řízení Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem životního prostředí do doby doplnění podkladů.


Aktuální stav řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK:

- D3 0304 Václavice–Voračice – oznámení o pokračování řízení a výzva vyjádření se k podkladům – 1. 11. 2019. Lhůta pro podání námitek uplynula 20. 11. 2019 => KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí 25. 3. 2020. K vydanému rozhodnutí bylo doručeno 9 odvolání (Krajina 2000, Děti Země, Sdružení Miláčov, ČSOP Benešov, Obec Tisem, Městys Maršovice, Ing. Petr Hanzlík, Josef Žížala, Zdeněk Štěpánek). Odvolací řízení ukončeno – dne 10. 9. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1997 Sb. ze dne 20. 3. 2020 a vrátilo věc k novému projednání.

Opatření k urychlení přípravy/výstavby**Opatření vyžadovaná od ministra/premiéra**



0305/1 Voračice–Nová Hospoda

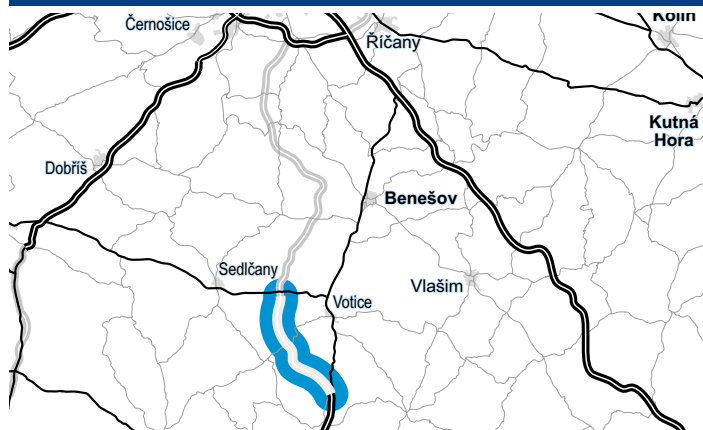

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2012	10/2015	2022	2024	2024	2024	2028

Stav	V přípravě
Délka (m)	16 454
Kategorie	D 27,5/120
Mosty (dálniční)	20
MÚK	MÚK Mezno, MÚK Loudilka
Zhotovitel DÚR	VPÚ DECO PRAHA a.s.
Cena (bez DPH)	7 646 000 000 Kč

Stav MPV

Dosud nebylo zahájeno.

Aktuální problém v přípravě


Probíhá zajišťování chybějících stanovisek a Rozhodnutí – chybí pravomocné Rozhodnutí o výjimkách ze zvláště chráněných druhů organismů podle §56 zákona č. 114/1992 Sb, závazná stanoviska ke kácení mimolesní zeleně.

Další informace

- Žádosti o vydání výjimek podány 1. 12. 2017 a 3. 1. 2018, na základě velkého množství námitek v řízení několikrát prodlužována lhůta na seznámení účastníků s podklady v řízení.
- Usnesením MŽP ze dne 8. 2. 2019 byl k pokračování v řízení a k vydání Rozhodnutí o výjimkách na stavbu 0305 pověřen Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí z důvodu systémové podjatosti Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství na základě podaných námitek účastníků řízení.
- Dne 13. 5. 2019 vydáno Usnesení o přerušení řízení Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem životního prostředí na stavbu „D3 0305/1 Voračice – Nová Hospoda“ do doby doplnění podkladů.
- D3 0305/1 Voračice – Nová Hospoda - oznámení o pokračování řízení a výzva vyjádření se k podkladům – 7. 11. 2019. Lhůta pro podání námitek uplynula 22. 11. 2019 => KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí 13. 3. 2020. K vydanému Rozhodnutí byla doručena 3 odvolání ((Krajina 2000, Děti Země, Sdružení Miláčov), odvolací řízení ukončeno – dne 1. 9. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1992 Sb. ze dne 13. 3. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 23. 10. 2020 oznámil KÚ Plzeňského kraje pokračování řízení a vyzval ŘSD ČR k doplnění podkladů (stanoviska vlastníků dotčených realizací kompenzačních opatření, konkretizaci časové působnosti požadované výjimky, řádovou kvantifikaci počtu jedinců druhů jednotlivých zvláště chráněných druhů živočichů).

Opatření k urychlení přípravy/výstavby

Opatření vyžadovaná od ministra/premiéra

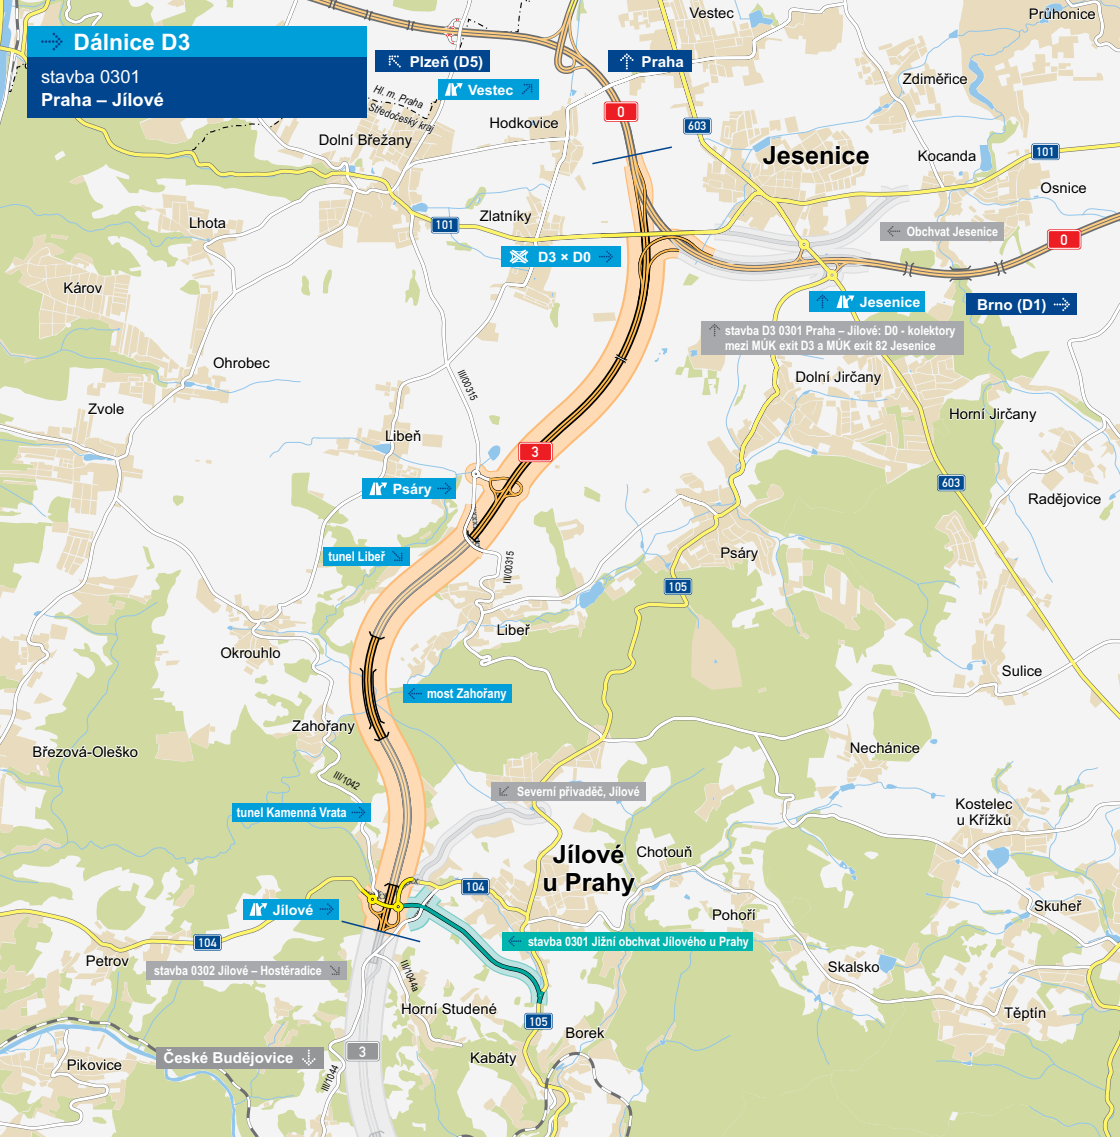

- řešená stavba
- související stavby
- jiné stavby



Geografická data poskytl VGHMÚF Dobruška, © MO ČR, 2013
ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Praha – Jilové

Dálnice D3

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V červenci 2015 byla zpracována aktualizace záměru projektu, který byl v říjnu 2015 schválen. V prosinci 2016 byla dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí a probíhá inženýrská činnost související s vydáním rozhodnutí o umístění stavby. Dne 31. 10. 2018 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Předpoklad získání nepravomocného ÚR je do 06/2022. V další fázi přípravy byly realizovány doplňující hydrogeologické průzkumy pro předběžný GTP (od 01/2019 do 11/2019) a také probíhá příprava realizace podrobných geotechnických průzkumů pro DSP. Probíhá řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK. KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí o výjimkách 18. 5. 2020. K vydanému rozhodnutí bylo doručeno 11 odvolání. Dne 5. 11. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí KÚ z 18. 5. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 26. 11. 2019 bylo předloženo Oznámení změny záměru „D3 0301–0303 Praha–Václavice, změny v úseku MÚK Jilové – MÚK Hostěradice“ na MŽP. Dne 5. 12. 2019 zahájeno zjišťovací řízení (zveřejněno na portálu CENIA). Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 24. 6. 2020. K vydanému závěru zjišťovacího řízení přišly tři rozklady.

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 9514 m
kategorie: D 27,5/120
počet stavebních objektů: 255

Tunely:

Libeň; Kamenná Vrata
celková délka: 3207 m

Mostní objekty:

na dálnici: 5
nadměry: 2
na větších křižovatkách: 4
mosty na účelové komunikaci: 2
celková délka mostů: 1216 m

Mimoúrovňové křižovatky:

MÚK Jilové, MÚK Psáry, MÚK 3xD0
celková délka větví: 4954 m

Protihlukové stěny:

počet: 5 (celková délka: 2753 m)

Zemní valy:

počet: 23

Úpravy ostatních komunikací:

silnice II. tříd: 1 (délka: 1002 m)
silnice III. tříd: 2 (délka: 812 m)
místní komunikace: 1 (délka: 180 m)
účelové komun.: 9 (délka: 4301 m)
přístupové komun.: 9 (délka: 11 400 m)
polní cesty: 3 (délka: 522 m)

Přeložky a úpravy inž. sítí:

vodohospodářské objekty: 28
objekty elektro: 11

přeložky plynovodu: 1

Celkový objem zemních prací:

výkopy: 3 060 900 m³
násep: 3 755 500 m³

Název stavby:

Dálnice D3 0301 Praha – Jilové

Místo stavby:

Středočeský kraj
Katastrální území:
Hodkovice u Zlatníků, Jesenice u Prahy, Zlatníky u Prahy, Dolní Jirčany, Psáry, Libeň u Libeře, Libeň,

Okrouhlo, Jilové u Prahy, Petrov u Prahy

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:


Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracovatel DÚR:

PRAGOPROJEKT/AMBERG/MOTT
MACDONALD D3 0301–0303
(vedoucí účastník sdružení Prago-projekt)

Předpokládané náklady stavby:

8 462 000 000 Kč (bez DPH)

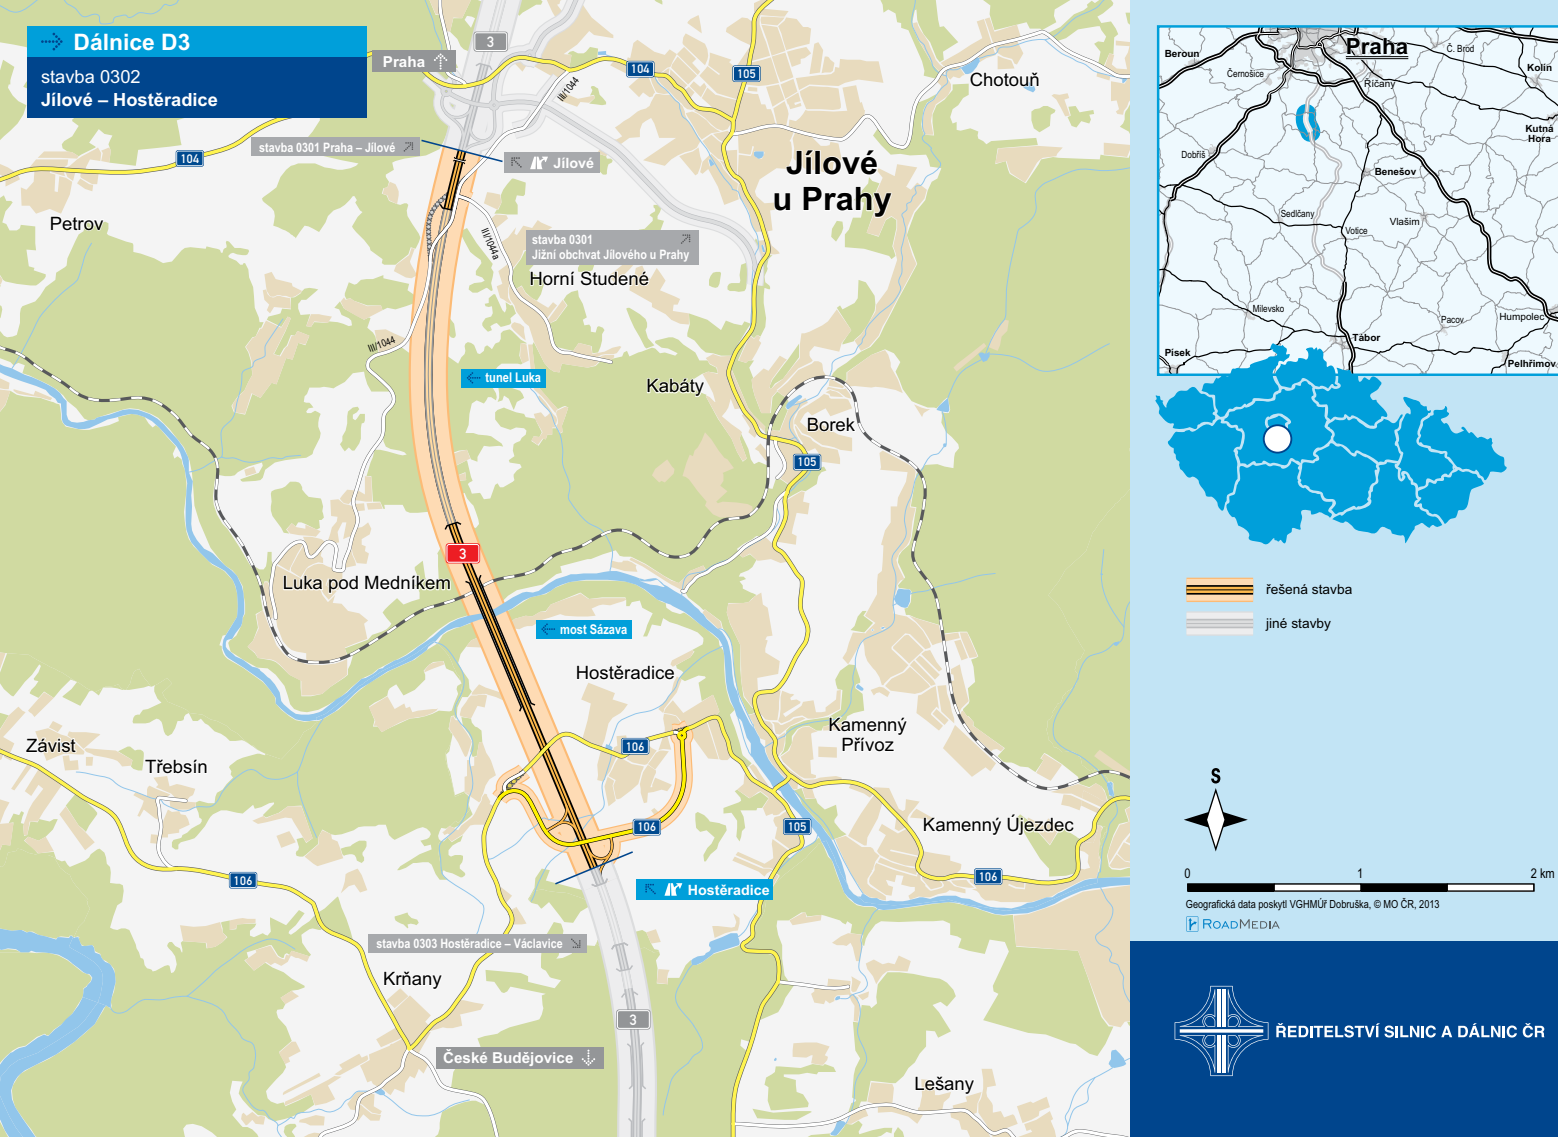

Jílové – Hostěradice

Dálnice **D3**

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V červenci 2015 byla zpracována aktualizace záměru projektu, který byl v říjnu 2015 schválen. V prosinci 2016 byla dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí a probíhá inženýrská činnost související s vydáním rozhodnutí o umístění stavby. Dne 31. 10. 2018 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Předpoklad získání nepravocmoného ÚR je do 06/2022.

V další fázi přípravy jsou realizovány doplňující hydrogeologické průzkumy pro předběžný GTP (od 01/2019 do 11/2019) a také probíhá příprava realizace podrobných geotechnických průzkumů pro DSP. Probíhá řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK. KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí o výjimkách 18. 5. 2020. K vydanému rozhodnutí bylo doručeno 11 odvolání. Dne 5. 11. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí KÚ z 18. 5. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 26. 11. 2019 bylo předloženo Oznámení změny záměru „D3 0301–0303 Praha–Václavice, změny v úseku MÚK Jílové – MÚK Hostěradice“ na MŽP. Dne 5. 12. 2019 bylo zahájeno zjišťovací řízení (na portálu CENIA). K vydání závěru zjišťovacího řízení došlo 24. 6. 2020. K vydanému závěru zjišťovacího řízení přišly tři rozklady.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2012	10/2015	2022	2024	2024	2024	2028

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 4486 m
kategorie: D 27,5/120
počet všech stavebních objektů: 139

Tunely:

Luka (délka: 1843 m)

Mostní objekty:

na dálnici: 3
nadjezdy: 2
na přeložce II/106: 1
lávka pro pěší: 1
celková délka mostů: 1261 m

Mimoúrovňové křižovatky:

MÚK Hostěradice
celková délka větví: 927 m

Protihlukové stěny:

počet: 4 (celková délka: 2310 m)

Zemní valy:

počet: 3

Úpravy ostatních komunikací:

silnice II. tříd: 1 (délka: 1696 m)
silnice III. tříd: 2 (délka: 700 m)
místní komunikace: 2 (délka: 441 m)
úcelové komun.: 9 (délka: 2340 m)
polní cesty: 2 (délka: 294 m)
přístupové komun.: 2 (délka: 4600 m)

Přeložky a úpravy inž. sítí:

vodohospodářské objekty: 16

objekty elektro: 15

přeložky plynovodu: 1

Celkový objem zemních prací:

výkopy: 1 268 100 m³

násypy: 453 200 m³

Název stavby:

Dálnice D3 0302 Jílové–Hostěradice

Místo stavby:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Jílové u Prahy, Petrov u Prahy, Luka pod Medníkem, Hostěradice

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracovatel DÚR:


PRAGOPROJEKT/AMBERG/MOTT

MACDONALD D3 0301–0303

(vedoucí účastník sdružení Prago-projekt)

Předpokládané náklady stavby:

5 589 000 000 Kč (bez DPH)

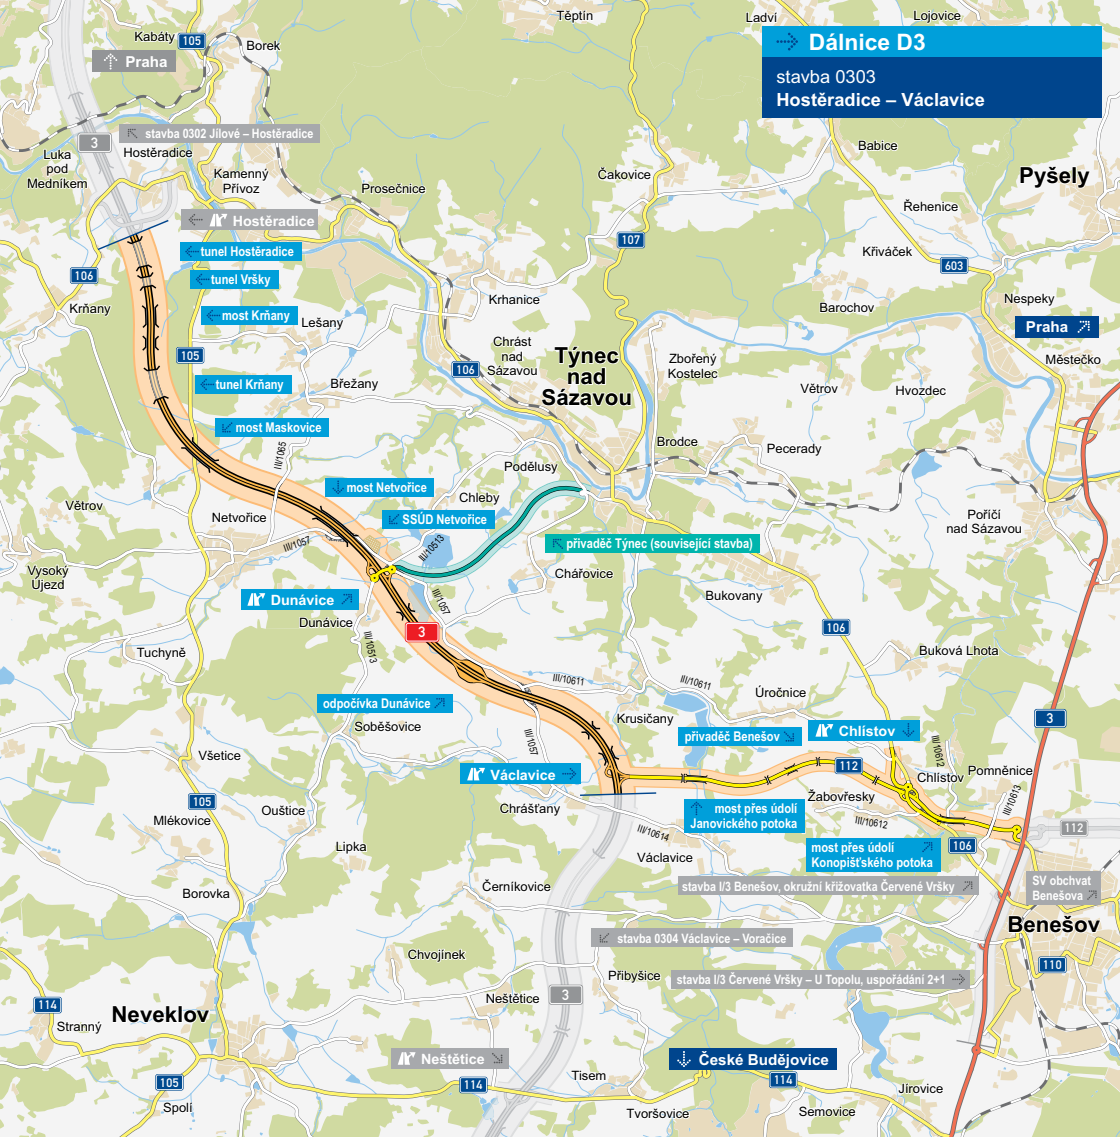

- řešená stavba
- související stavby
- jiné stavby



Geografická data poskytl VGHMÚF Dobruška, © MO ČR, 2013
ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Hostěradice – Václavice

Dálnice **D3**

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V červenci 2015 byla zpracována aktualizace záměru projektu, který byl v říjnu 2015 schválen. V prosinci 2016 byla dokončena DÚR a probíhá inženýrská činnost související s vydáním rozhodnutí o umístění stavby. Dne 31. 10. 2018 byla podána žádost o vydání ÚR. Předpoklad získání nepravocmoného ÚR je do 06/2022. V další fázi přípravy byly realizovány doplňující hydrogeologické průzkumy pro předběžný GTP (od 01/2019 do 11/2019) a také probíhá příprava realizace podrobných geotechnických průzkumů pro DSP.

Probíhá řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK. KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí o výjimkách 18. 5. 2020. K vydanému rozhodnutí bylo doručeno 11 odvolání. Dne 5. 11. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí KÚ z 18. 5. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 26. 11. 2019 bylo předloženo Oznámení změny záměru „D3 0301–0303 Praha–Václavice, změny v úseku MÚK Jilové – MÚK Hostěradice“ na MŽP. Dne 5. 12. 2020 bylo zahájeno zjišťovací řízení (zveřejněno na portálu CENIA). Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 24. 6. 2020. K vydanému závěru zjišťovacího řízení přišly tři rozklady.

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 11 292 m
kategorie: D 27,5/120
počet všech stavebních objektů: 378

Tunely:

Hostěradice; Vršky; Krňany
celková délka tunelů: 946 m

Mostní objekty:

na dálnici: 11
nad dálnici: 2
na přivaděči: 5
nadjezdy na přivaděči: 4
na přeložkách: 2
celková délka mostů: 2739 m

Mimoúrovňové křižovatky:

MÚK Václavice, MÚK Dunávice
na přivaděči: MÚK Chlístov
celková délka větvi: 3115 m

Protihlukové stěny:

počet: 13 (celková délka: 5584 m)

Zemní valy:

počet: 16

Úpravy ostatních komunikací:

přivaděč Benešov: S 9,5/80, 5800 m
silnice II. tříd: 1 (1452 m)
silnice III. tříd: 7 (2686 m)
místní komunikace: 5 (1661 m)
účelové komunikace: 13 (2236 m)
přístupové komunikace: 11 (17 200 m)
lesní a lesní cesty: 16 (3725 m)

Odpočívky:

Dunávice (oboustranná)

Přeložky a úpravy inž. sítí:

vodohospodářské objekty: 64

objekty elektro: 41

přeložky plynovodu: 4

Celkový objem zemních prací:

výkopy: 1 919 400 m³

násypy: 2 040 900 m³

Název stavby:

Dálnice D3 0303 Hostěradice–Václavice

Místo stavby:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Hostěradice, Lešany nad Sázavou,

Břežany u Lešan, Maskovice, Netvořice, Dunávice, Chářovice, Krusičany, Václavice u Benešova, Chrástany u Benešova

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:


Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracovatel DÚR:

PRAGOPROJEKT/AMBERG/MOTT
MACDONALD D3 0301–0303
(vedoucí účastník sdružení Prago-projekt)

Předpokládané náklady stavby:

6 782 000 000 Kč (bez DPH)

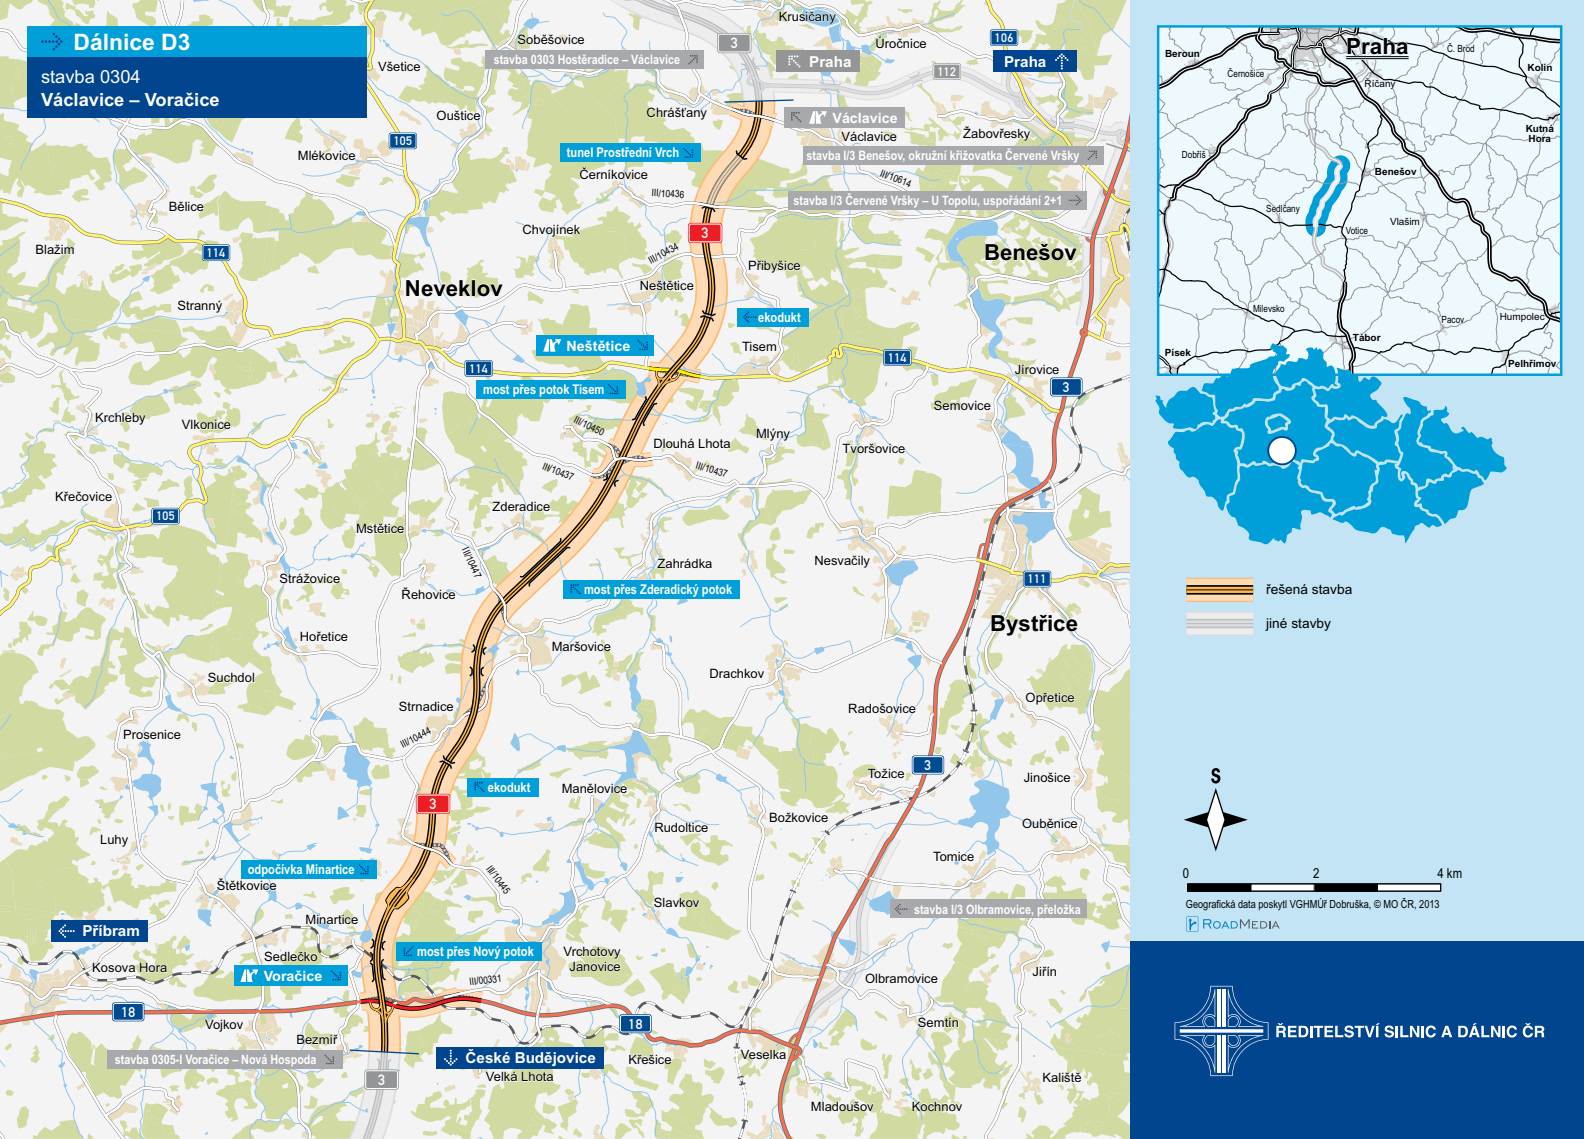

Václavice – Voračice

Dálnice **D3**

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V červenci 2015 byla zpracována aktualizace záměru projektu, který byl v říjnu 2015 schválen. V lednu 2017 bude dokončena DÚR a byla inženýrská činnost související s vydáním rozhodnutí o umístění stavby. Dne 31. 10. 2018 byla podána žádost o vydání ÚR.

V další fázi přípravy byly realizovány doplňující hydrogeologické průzkumy pro předběžný GTP (od 01/2019 do 11/2019) a také probíhá příprava realizace podrobných geotechnických průzkumů pro DSP. Probíhá řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK. KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí o výjimkách 13. 3. 2020. K vydanému Rozhodnutí bylo doručeno devět odvolání. Odvolací řízení bylo ukončeno. Dne 1. 9. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1997 Sb. ze dne 13. 3. 2020 a vrátilo věc k novému projednání.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2012	10/2015	2022	2024	2024	2024	2028

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 16 700 m
kategorie: D 27,5/120
počet všech stavebních objektů: 273

Tunely:

Prostřední vrch (960 m)

Mostní objekty:

na dálnici: 12
nad dálnicí: 5
na silnici I/18: 2
ekodukty: 2
celková délka mostů: 2351 m

Mimoúrovňňové křižovatky:

MÚK Voračice, MÚK Neštětice
celková délka větví: 2300 m

Odpočívky:

Minartice (oboustranná)
Protihlukové stěny
počet: 6 (celková délka: 2864 m)

Zemní valy:

počet: 6

Úpravy ostatních komunikací:

silnice I. tříd: 1 (délka: 2033 m)
silnice II. tříd: 1 (délka: 783 m)
silnice III. tříd: 10 (délka: 5211 m)
účelové komun.: 6 (délka: 1318 m)
polní cesty: 22 (délka: 17 746 m)
lesní cesty: 1 (délka: 170 m)

Přeložky a úpravy inž. sítí:

vodohospodářské objekty: 63
objekty elektro: 24

Celkový objem zemních prací:

výkopy: 4 500 400 m³
násypy: 2 000 000 m³

Název stavby:

Dálnice D3 0304 Václavice–Voračice

Místo stavby:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Chráštany u Benešova, Václavice u Benešova, Příbyšice, Tisem, Neštětice, Zahrádka u Benešova, Zderadice, Maršovice u Benešova, Strnadice, Šebáňovice, Vrchotovy Janovice, Minartice, Bezemíř

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:



Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracovatel DÚR:

Sdružení SUDOP Group, vedoucí účastník sdružení SUDOP a.s.

Předpokládané náklady stavby:

9 422 000 000 Kč (bez DPH)

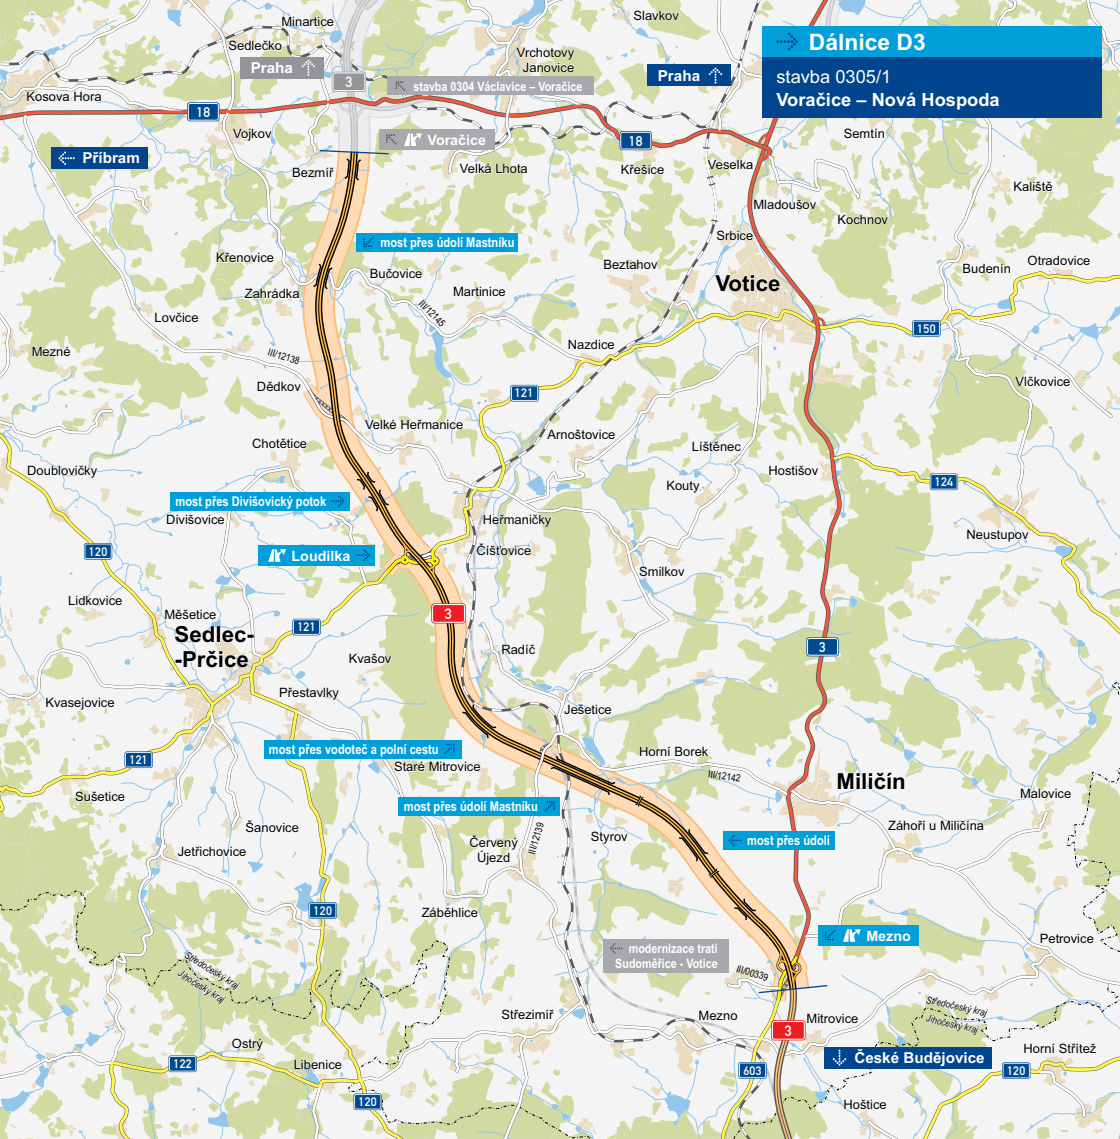

řešená stavba
jiné stavby



Geografická data poskytl VGHMÚF Dobruška, © MO ČR, 2013
ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Voračice – Nová Hospoda

Dálnice **D3**

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V červenci 2015 byla zpracována aktualizace záměru projektu, který byl v říjnu 2015 schválen. V lednu 2017 bude dokončena DÚR a byla zahájena inženýrská činnost související s vydáním rozhodnutí o umístění stavby. Dne 31. 10. 2018 byla podána žádost o vydání ÚR.

V další fázi přípravy byly realizovány doplňující hydrogeologické průzkumy pro předběžný GTP (od 01/2019 do 11/2019) a také probíhá příprava realizace podrobných geotechnických průzkumů pro DSP.

Probíhá řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK. KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí dne 13. 3. 2020. K vydanému Rozhodnutí byla doručena tři odvolání. V odvolacím řízení dne 1. 9. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1997 Sb. ze dne 13. 3. 2020 a vrátilo věc k novému projednání.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2012	10/2015	2022	2024	2024	2024	2028

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 16 454 m
kategorie: D 27,5/120
počet všech stavebních objektů: 226

Mostní objekty:

na dálnici: 20
nad dálnicí: 3
celková délka mostů: 3543 m

Mimoúrovňové křižovatky:

MÚK Mezno, MÚK Loudilka
celková délka větví: 2508 m

Protihlukové stěny:

počet: 9 (celková délka: 3594 m)

Opěrné zdi:

počet: 1 (délka: 24 m)

Zemní valy:

počet: 8 (celková délka: 3044 m)

Úpravy ostatních komunikací:

silnice I. tříd: 1 (délka: 1268 m)
silnice II. tříd: 1 (délka: 821 m)
silnice III. tříd: 2 (délka: 1239 m)
místní komunikace: 2 (délka: 1097 m)
účelové komunikace: 2 (délka: 541 m)
polní cesty: 21 (délka: 10 807 m)
přijezd k RN: 10 (délka: 1491 m)

Přeložky a úpravy inž. sítí:

vodohospodářské objekty: 57
objekty elektro: 22
přeložky plynovodu: 3

Název stavby:

Dálnice D3 0305/1 Voračice – Nová Hospoda

Místo stavby:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Bezmří, Martinice u Votic, Velké Heřmanice, Divišovice, Heřmaničky, Prčice, Ješetice, Červený Újezd u Miličína, Horní Borek, Miličín, Lažany u Mezna, Mitrovice

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:


Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracovatel DÚR:

Sdružení SUDOP Group, vedoucí účastník sdružení SUDOP a.s.

Předpokládané náklady stavby:

7 646 000 000 Kč (bez DPH)

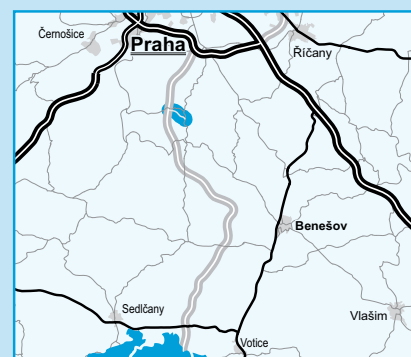

řešená stavba
jiné stavby



Geografická data poskytl VGHMÚF Dobruška, © MO ČR, 2015
ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Jižní obchvat Jílového u Prahy

Dálnice **D3**

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Na stavbu je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Probíhá inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí. Předpoklad podání žádosti o vydání územního rozhodnutí je v 03/2021. U výjimek ze zvláště chráněných druhů organismů (podle §56 zákona č. 114/1992 Sb.) bylo dne 22. 1. 2020 vydáno nepravomocné Rozhodnutí. Proti vydanému Rozhodnutí byla podána dvě odvolání. Dne 4. 8. 2020 bylo MŽP potvrzeno vydané Rozhodnutí a nabylo právní moci. Dne 26. 10. 2020 ale bylo doručeno podání žaloby na vydané Rozhodnutí spolkem Krajina 2000.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
–	–	–	–	–	2024	2028

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 1974 m
kategorie: S 7,5/50
počet všech stavebních objektů: 23

Mostní objekty:

počet: 2
celková délka mostů: 69 m

Úrovnňové křižovatky:

okružní: 1
průsečné: 1

Úpravy ostatních komunikací:

úprava ulice Nádražní: 1 (délka: 40 m)
provizorní komunikace: 1
přístupové cesty: 3 (délka: 1000 m)

Přeložky a úpravy inž. sítí:

vodohospodářské objekty: 2
objekty elektro: 8

Demolice:

počet objektů: 2

Název stavby:

D3 0301 Jižní obchvat Jílového u Prahy

Místo stavby:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Jílové u Prahy

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracovatel DÚR:



Mott McDonald CZ, spol. s r.o.

Předpokládaná cena stavby:

226 000 000 Kč (bez DPH)

Dálnice D3

stavba 0303
Přivaděč Týnec n. S.

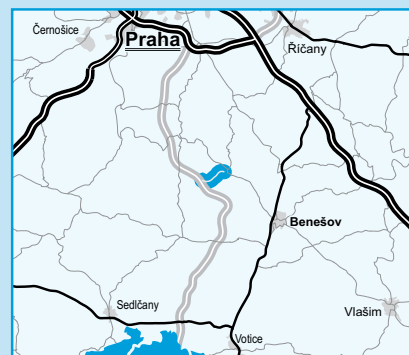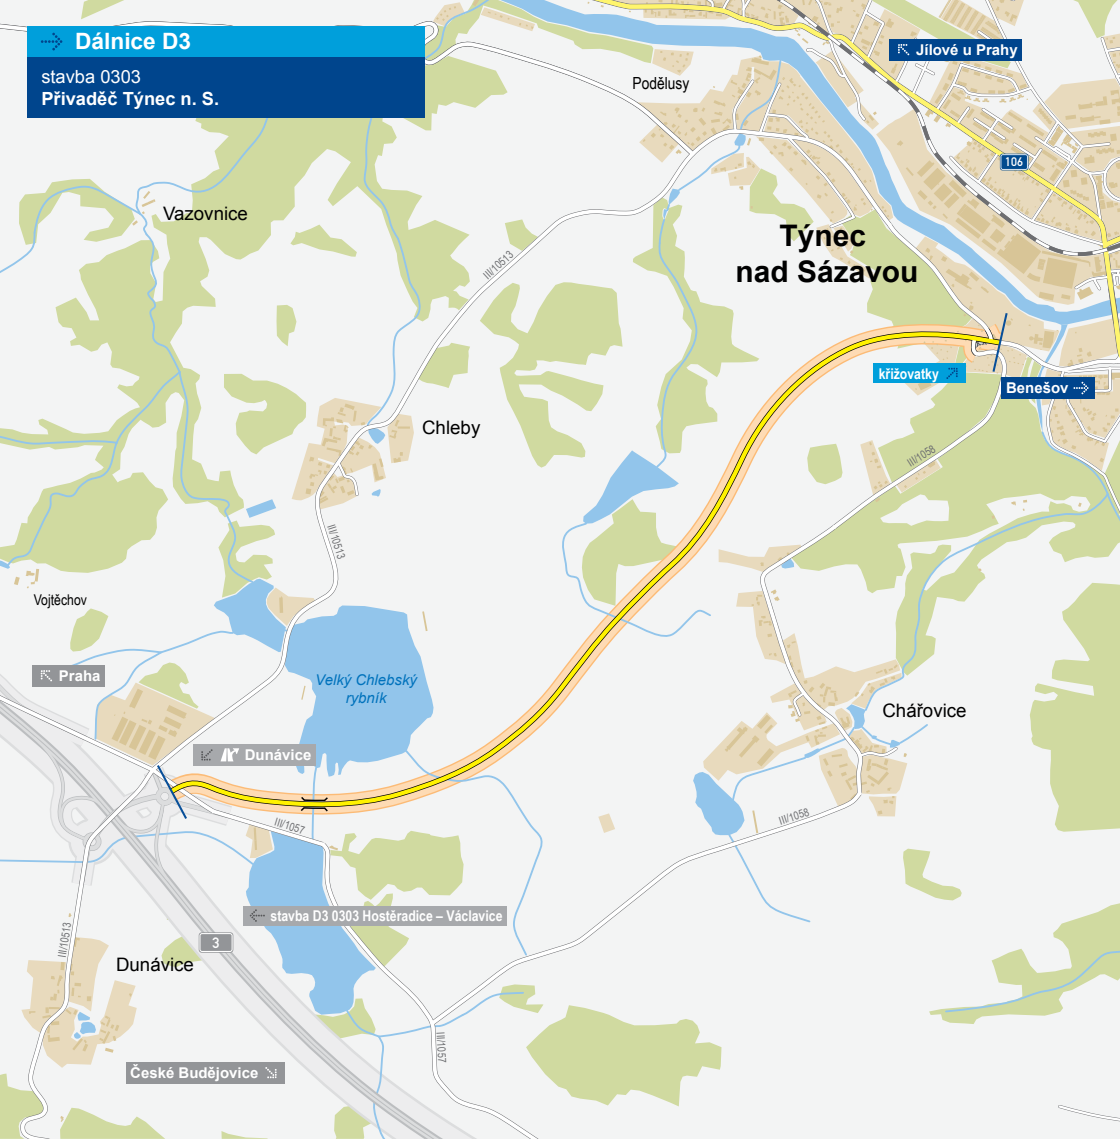

řešená stavba
jiné stavby

0 0,5 1 km

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2015

ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Přivaděč Týnec nad Sázavou

Dálnice **D3**

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Na stavbu je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Dne 31. 10. 2018 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Předpoklad získání nepravomocného ÚR je do 06/2022.

Probíhá řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK. KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí o výjimkách dne 2. 4. 2020. K vydanému Rozhodnutí doručena tři odvolání. V odvolacím řízení dne 28. 8. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1997 Sb. ze dne 2. 4. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 15. 10. 2020 oznámil KÚ Plzeňského kraje pokračování řízení a vyzval ŘSD ČR k doplnění podkladů.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
–	–	–	–	–	2024	2028

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 3240 m
kategorie: S 7,5/50

Mostní objekty:

počet: 1
Úrovňové křižovatky:

stykové: 2

Zemní valy:

počet: 3 (celková délka: cca 480 m)

Demolice:

počet objektů: 10

Celkový objem zemních prací:

výkopy: 110 500 m³
násypy: 64 900 m³

Název stavby:

D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou

Místo stavby:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Dunávice, Chleby u Týnce n. Sázavou, Chářovice, Podělusy, Týnec n. Sázavou

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracovatel DÚR:

Pragoprojekt a.s.

Předpokládaná cena stavby:

203 000 000 Kč (bez DPH)



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC A DÁLNIC ČR**
