

přehled staveb **ŘSD**



Dálnice D3


Stav k 06/2021

Středočeský úsek (Praha – Nová Hospoda)

Klíčová data

Úsek	DÁLNIČE D3 – název stavby	Délka (km)	Zahájení	Zprovoznění	Cena (Kč)
0301	Praha–Jílové	9,5	2025	2029	8 462 000 000*
0302	Jílové–Hostěradice	4,5	2025	2029	5 589 000 000*
0303	Hostěradice–Václavice	11,3	2025	2029	6 782 000 000*
0304	Václavice–Voračice	16,7	2025	2029	9 422 000 000*
0305/1	Voračice–Nová Hospoda	16,5	2025	2029	7 646 000 000*
Celkem km / Kč		58,5			37 901 000 000

* Předpokládaná cena

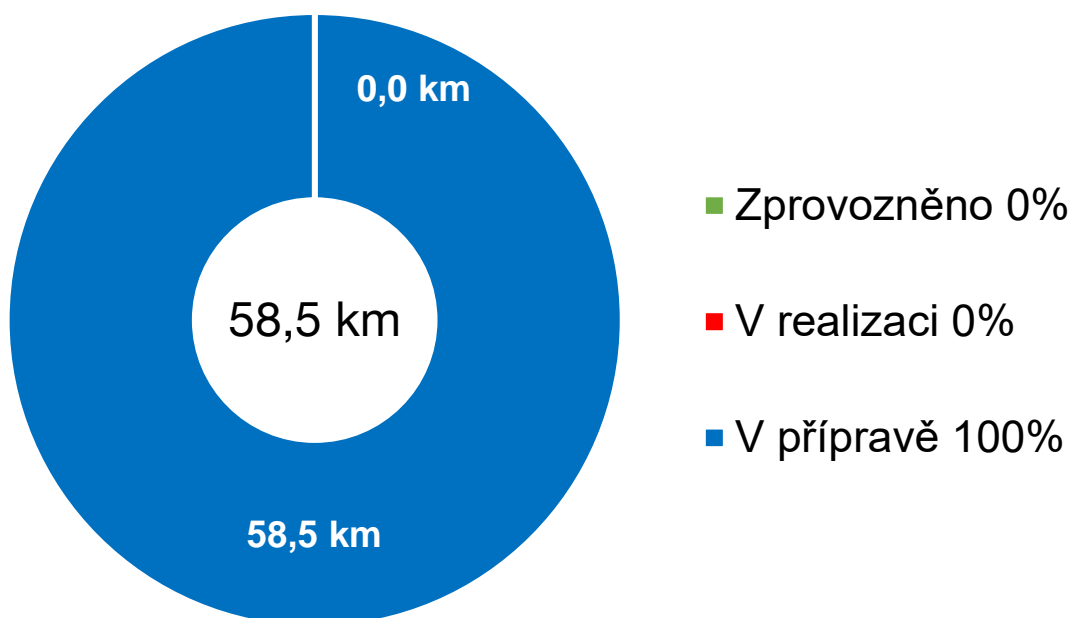

SILNICE – dálniční přivaděče*	Délka (km)	Zahájení	Zprovoznění	Cena (Kč)
Přivaděč Benešov	5,8	2025	2029	1 138 000 000*
Jižní přivaděč Jílové u Prahy	1,9	2025	2029	226 000 000*
Přivaděč Týnec n.S.	3,2	2025	2029	203 000 000*
Celkem km / Kč	10,9			1 567 000 000

* Přivaděče budou uvedeny do provozu až společně s dálnicí.

5

Praha

Dálnice D3 Středočeský úsek

Černošice

Říčany



předpoklad zahájení v roce 2025 – 58,5 km

Celková délka: 58,5 km
stav k 06/2021

0

D3 x D0

Psáry

0301 Praha – Jílové (9,5 km)
(předpokl. realizace 2025 – 2029)

1

Jílové

0301 Jižní obchvat Jílového u Prahy (2,0 km)
(předpokl. realizace 2025 – 2029)

0302 Jílové – Hostěradice (4,5 km)
(předpokl. realizace 2025 – 2029)

Hostěradice

0303 Přivaděč Týnec n. S. (3,2 km)
(předpokl. realizace 2025 – 2029)

Dunávice

0303 Hostěradice – Václavice (11,3 km)
(předpokl. realizace 2025 – 2029)

Václavice

Benešov

Neštětice

0304 Václavice – Voračice (16,7 km)
(předpokl. realizace 2025 – 2029)

18

Sedlčany

Voračice

Votice

0305/I Voračice – Nová Hospoda (16,5 km)
(předpokl. realizace 2025 – 2029)

Loudilka

3

19

62

3

70 Chotoviny

Legenda

- dálnice
- silnice I. třídy, 4pruhové
- silnice pro motorová vozidla
- silnice I. třídy
- silnice II. třídy
- státní hranice

3 číslo dálnice

34 číslo silnice

0 5 10 km




Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2015

ROADMEDIA



D3 0301 Praha–Jilové

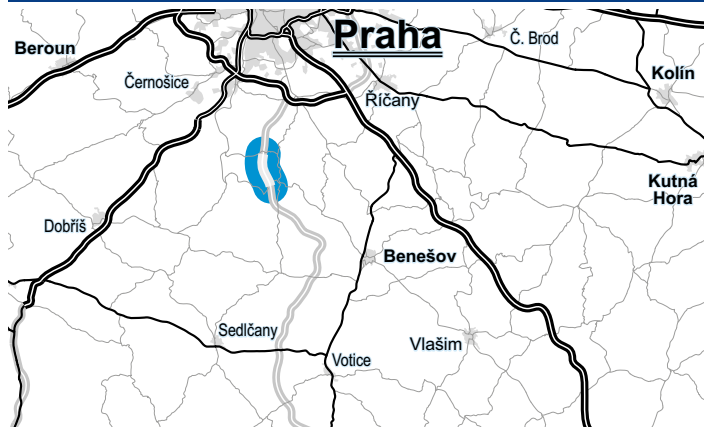

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2012	10/2015	2022	2024	2024	2025	2029

Stav	V přípravě
Délka (m)	9514
Kategorie	D 27,5/120
Tunely	Líbeř; Kamenná Vrata (celková délka: 3207 m)
Mosty (dálniční)	5
MÚK	MÚK Jilové, MÚK Psáry, MÚK D3xD0
Zhotovitel DÚR	Pragoprojekt, Amberg, Mott Macdonald
Cena (bez DPH)	8 462 000 000 Kč

Stav MPV

Dosud nebylo zahájeno.

Aktuální problém v přípravě

- **Územní řízení je přerušeno** – chybí pravomocné Rozhodnutí o výjimkách ze zvláště chráněných druhů organismů podle §56 zákona č. 114/1992 Sb., závazná stanoviska ke kácení mimolesní zeleně.
- Nutnost posouzení vlivu změn v dokumentaci DUR v km 0,9 – 0,14 a změn provedených u Odpočívky Dunávice na životní prostředí.

Další informace

- Usnesením MŽP ze dne 8. 2. 2019 byl k pokračování v řízení a k vydání Rozhodnutí o výjimkách na stavby D3 0301–0303 pověřen Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě podaných námitek účastníků řízení.
- Žádost o vydání výjimek podána 3. 7. 2018, na základě velkého množství námitek v řízení několikrát prodlužována lhůta na seznámení účastníků s podklady v řízení.
- Dne 7. 5. 2019 vydáno Usnesení o přerušení řízení Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem životního prostředí do doby doplnění podkladů.

Aktuální stav řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK:


- D3 0301–0303 Praha–Václavice – oznámení o pokračování řízení a výzva vyjádření se k podkladům – 18. 10. 2019, lhůta pro podání námitek uplynula 20. 11. 2019 => KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí 18. 5. 2020 – k vydanému rozhodnutí bylo doručeno 11 odvolání (Krajina 2000, Město Jesenice, Děti Země, ČSOP Benešov, Obec Lešany, Obec Krňany, Městys Netvořice, Obec Okrouhlo, Sružení Miláčov, Věra Červová, Josef Žizala).
- Odvolací řízení ukončeno – dne 5. 11. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1997 Sb. ze dne 18. 5. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 18.12.2020 oznámil KÚ Plzeňského kraje pokračování řízení a vyzval ŘSD ČR k doplnění podkladů (stanoviska vlastníků dotčených realizací kompenzačních opatření, konkretizaci časové působnosti požadované výjimky, řádovou kvantifikaci počtu jedinců druhů jednotlivých zvláště chráněných druhů živočichů, zdůvodnění veřejného zájmu Václavické spojky, bližší určení plošné působnosti výjimky).
- Požadované podklady KÚ PK byly ze strany ŘSD ČR doplněny 31. 3. 2021, KÚ PK zahájil správní kroky k vydání nového Rozhodnutí.

Posuzování změn záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí – akt. stav:

- 26. 11. 2019 bylo předloženo Oznámení změny záměru „D3 0301–0303 Praha–Václavice, změny v úseku MÚK Jilové – MÚK Hostěradice“ na MŽP. Dne 5. 12. 2020 zahájeno zjišťovací řízení (zveřejněno na portálu CENIA). Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 24. 6. 2020 - provedené změny záměru nemohou mít významný vliv na životní prostředí, a proto nebudou dále posuzovány v procesu EIA. K vydanému závěru zjišťovacímu řízení přišly 3 rozklady, okrašlovací spolek v Jilovém u Prahy, Alternativa. Po vydání rozkladu MŽP se rovněž předpokládá podání správní žaloby proti obsahu rozhodnutí. Dne 21. 1. 2021 vydáno Rozhodnutí o rozkladu ministra životního prostředí – podané rozklady byly zamítnuty. Nyní se předpokládá podání správní žaloby proti obsahu rozhodnutí ze strany odpůrců stavby.
- Dne 26. 11. 2019 bylo předloženo Oznámení změny záměru „D3 – odpočívka Dunávice“ na KÚSK, odbor životního prostředí a zemědělství. Dne 5. 12. 2020 bylo zahájeno zjišťovací řízení (zveřejněno na portálu CENIA). Závěr zjišťovacího řízení vydán dne 12.3.2020=>změny záměru musí být posouzeny v procesu EIA.
- Odpočívka Dunávice bude vyčleněna do samostatné přípravy, žádost o vydání územního rozhodnutí bude o odpočívku Dunávice zúžena.

Opatření k urychlení přípravy/výstavby

Opatření vyžadovaná od ministra/premiéra

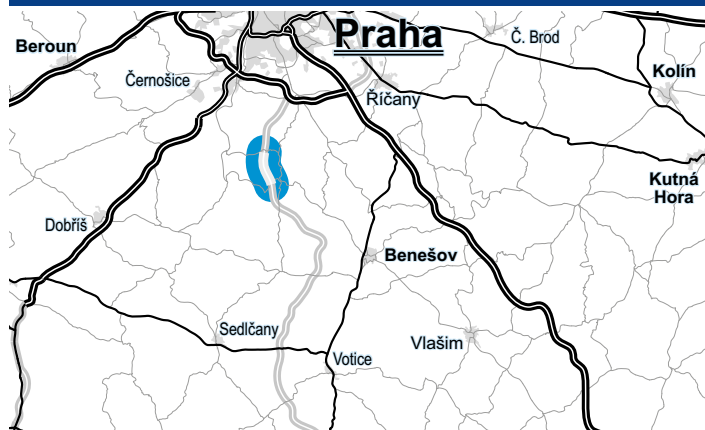

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2012	10/2015	2022	2024	2024	2025	2029

Stav	V přípravě
Délka (m)	4486
Kategorie	D 27,5/120
Tunely	Luka (1843 m)
Mosty (dálniční)	3
MÚK	MÚK Hostěradice
Zhotovitel DÚR	Pragoprojekt, Amberg, Mott Macdonald
Cena (bez DPH)	5 589 000 000 Kč

Stav MPV

Dosud nebylo zahájeno.

Aktuální problém v přípravě

- **Územní řízení je přerušeno** – chybí pravomocné Rozhodnutí o výjimkách ze zvláště chráněných druhů organismů podle §56 zákona č. 114/1992 Sb., závazná stanoviska ke kácení mimolesní zeleně.
- Nutnost posouzení vlivu změn v dokumentaci DUR v km 0,9 – 0,14 a změn provedených u Odpočívky Dunávica na životní prostředí.

Další informace

- Usnesením MŽP ze dne 8. 2. 2019 byl k pokračování v řízení a k vydání Rozhodnutí o výjimkách na stavby D3 0301–0303 pověřen Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí z důvodu systémové podjatosti Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství na základě podaných námitek účastníků řízení.
- Žádost o vydání výjimek podána 3. 7. 2018, na základě velkého množství námitek v řízení několikrát prodlužována lhůta na seznámení účastníků s podklady v řízení.
- Dne 7. 5. 2019 vydáno Usnesení o přerušování řízení Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem životního prostředí do doby doplnění podkladů.

Aktuální stav řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK:

- D3 0301–0303 Praha–Václavice – oznámení o pokračování řízení a výzva vyjádření se k podkladům – 18. 10. 2019, lhůta pro podání námitek uplynula 20. 11. 2019 => KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí 18. 5. 2020 – k vydanému rozhodnutí bylo doručeno 11 odvolání (Krajina 2000, Město Jesenice, Děti Země, ČSOP Benešov, Obec Lešany, Obec Krňany, Městys Netvořice, Obec Okrouhlo, Sdružení Miláčov, Věra Červová, Josef Žižala). Odvolací řízení ukončeno – dne 5. 11. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1997 Sb. ze dne 18. 5. 2020 a vrátilo věc k novému projednání.
- Požadované podklady KÚ PK byly ze strany ŘSD ČR doplněny 31. 3. 2021, KÚ PK zahájil správní kroky k vydání nového Rozhodnutí.


Posuzování změn záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. , O posuzování vlivů na životní prostředí – akt. stav:

- 26. 11. 2019 bylo předloženo Oznámení změny záměru „D3 0301–0303 Praha–Václavice, změny v úseku MÚK Jilové – MÚK Hostěradice“ na MŽP. Dne 5. 12. 2020 zahájeno zjišťovací řízení (zveřejněno na portálu CENIA). Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 24. 6. 2020 - provedené změny záměru nemohou mít významný vliv na životní prostředí, a proto nebudou dále posuzovány v procesu EIA. K vydanému závěru zjišťovacího řízení přišly 3 rozklady, okrašlovací spolek v Jilovém u Prahy, Alternativa. Dne 21. 1. 2021 vydáno Rozhodnutí o rozkladu ministra životního prostředí – podané rozklady byly zamítnuty. Nyní se předpokládá podání správní žaloby proti obsahu rozhodnutí ze strany odpůřců stavby.
- Dne 26. 11. 2019 bylo předloženo Oznámení změny záměru „D3 – odpočívka Dunávica“ na KÚSK, odbor životního prostředí a zemědělství. Dne 5. 12. 2020 bylo zahájeno zjišťovací řízení (zveřejněno na portálu CENIA). Závěr zjišťovacího řízení vydán dne 12.3.2020=>změny záměru musí být posouzeny v procesu EIA.
- Odpočívka Dunávica bude vyčleněna do samostatné přípravy, žádost o vydání územního rozhodnutí bude o odpočívku Dunávica zúžena.

Opatření k urychlení přípravy/výstavby**Opatření vyžadovaná od ministra/premiéra**



0303 Hostěradice–Václavice

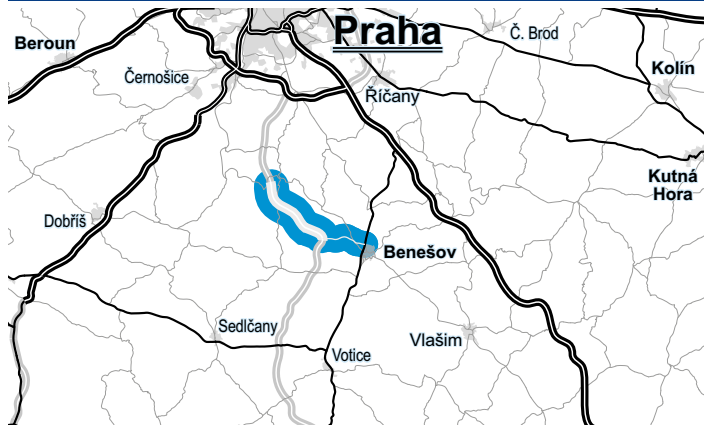

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2012	10/2015	2022	2024	2024	2025	2029

Stav	V přípravě
Délka (m)	11 292
Kategorie	D 27,5/120
Tunely	Hostěradice; Vršky; Krňany (celkem 946 m)
Mosty (dálniční)	11
MÚK	MÚK Václavice, MÚK Dunávice
Zhotovitel DÚR	Pragoprojekt, Amberg, Mott Macdonald
Cena (bez DPH)	7 965 000 000 Kč

Stav MPV

Dosud nebylo zahájeno.

Aktuální problém v přípravě

Územní řízení je přerušeno – chybí pravomocné Rozhodnutí o výjimkách ze zvláště chráněných druhů organismů podle §56 zákona č. 114/1992 Sb., závazná stanoviska ke kácení mimolesní zeleně. Nutnost posouzení vlivu změn v dokumentaci DUR v km 0,9 – 0,14 a změn provedených u Odpočívky Dunávice na životní prostředí.

Další informace

- Usnesením MŽP ze dne 8. 2. 2019 byl k pokračování v řízení a k vydání Rozhodnutí o výjimkách na stavby D3 0301–0303 pověřen Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí z důvodu systémové podjatosti Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství na základě podaných námitek účastníků řízení.
- Žádost o vydání výjimek podána 3. 7. 2018, na základě velkého množství námitek v řízení několikrát prodlužována lhůta na seznámení účastníků s podklady v řízení.
- Dne 7. 5. 2019 vydáno Usnesení o přerušení řízení Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem životního prostředí do doby doplnění podkladů. Dne 9. 11. 2020 oznámil KÚ Plzeňského kraje pokračování řízení a vyzval ŘSD ČR k doplnění podkladů (stanoviska vlastníků dotčených realizací kompenzačních opatření, konkretizaci časové působnosti požadované výjimky, řádovou kvantifikaci počtu jedinců druhů jednotlivých zvláště chráněných druhů živočichů).

Aktuální stav řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK:


- D3 0301–0303 Praha–Václavice – oznámení o pokračování řízení a výzva vyjádření se k podkladům – 18. 10. 2019, lhůta pro podání námitek uplynula 20. 11. 2019 => KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí 18. 5. 2020 – k vydanému rozhodnutí bylo doručeno 11 odvolání (Krajina 2000, Město Jesenice, Děti Země, ČSOP Benešov, Obec Lešany, Obec Krňany, Městys Netvořice, Obec Okrouhlo, Sdružení Miláčov, Věra Červová, Josef Žížala). Odvolací řízení ukončeno – dne 5. 11. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1997 Sb. ze dne 18. 5. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 18. 12. 2020 oznámil KÚ Plzeňského kraje pokračování řízení a vyzval ŘSD ČR k doplnění podkladů (stanoviska vlastníků dotčených realizací kompenzačních opatření, konkretizaci časové působnosti požadované výjimky, řádovou kvantifikaci počtu jedinců druhů jednotlivých zvláště chráněných druhů živočichů, zdůvodnění veřejného zájmu Václavické spojky, bližší určení plošné působnosti výjimky).
- Požadované podklady KÚ PK byly ze strany ŘSD ČR doplněny 31. 3. 2021, KÚ PK zahájil správní kroky k vydání nového Rozhodnutí.

Posuzování změn záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí – akt. stav:

- 26. 11. 2019 bylo předloženo Oznámení změny záměru „D3 0301–0303 Praha–Václavice, změny v úseku MÚK Jilové – MÚK Hostěradice“ na MŽP. Dne 5. 12. 2020 zahájeno zjišťovací řízení (zveřejněno na portálu CENIA). Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 24. 6. 2020 - provedené změny záměru nemohou mít významný vliv na životní prostředí, a proto nebudou dále posuzovány v procesu EIA. K vydanému závěru zjišťovacího řízení přišly 3 rozklady, okrašlovací spolek v Jilovém u Prahy, Alternativa. Dne 21. 1. 2021 vydáno Rozhodnutí o rozkladu ministra životního prostředí – podané rozklady byly zamítnuty. Nyní se předpokládá podání správní žaloby proti obsahu rozhodnutí ze strany odpůrců stavby.
- Dne 26. 11. 2019 bylo předloženo Oznámení změny záměru „D3 – odpočívka Dunávice“ na KÚSK, odbor životního prostředí a zemědělství. Dne 5. 12. 2020 bylo zahájeno zjišťovací řízení (zveřejněno na portálu CENIA). Závěr zjišťovacího řízení vydán dne 12.3.2020=>změny záměru musí být posouzeny v procesu EIA.
- Odpočívka Dunávice bude vyčleněna do samostatné přípravy, žádost o vydání územního rozhodnutí bude o odpočívku Dunávice zúžena.

Opatření k urychlení přípravy/výstavby

Opatření vyžadovaná od ministra/premiéra

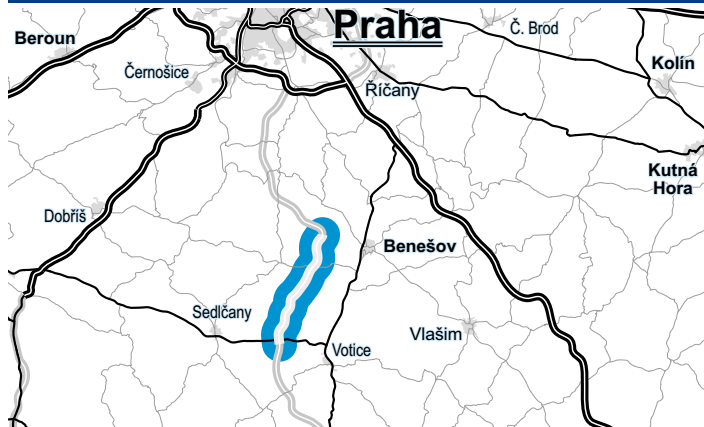


EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2012	10/2015	2022	2024	2024	2025	2029

Stav	V přípravě
Délka (m)	16 700
Kategorie	D 27,5/120
Tunely	Prostřední vrch (960 m)
Mosty (dálniční)	12
MÚK	MÚK Voračice, MÚK Neštětice
Zhotovitel TS	SUDOP PRAHA a.s.
Cena (bez DPH)	9 422 000 000 Kč

Stav MPV	Dosud nebylo zahájeno.
Aktuální problém v přípravě	Probíhá zajišťování chybějících stanovisek a Rozhodnutí – chybí pravomocné Rozhodnutí o výjimkách ze zvláště chráněných druhů organismů podle §56 zákona č. 114/1992 Sb., závazná stanoviska ke kácení mimolesní zeleně.
Další informace	<ul style="list-style-type: none"> Žádosti o vydání výjimek podány 1. 12. 2017 a 3. 1. 2018, na základě velkého množství námitek v řízení několikrát prodlužována lhůta na seznámení účastníků s podklady v řízení. Usnesením MŽP ze dne 8. 2. 2019 byl k pokračování v řízení a k vydání Rozhodnutí o výjimkách na stavbu 0304 pověřen Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí z důvodu systémové podjatosti Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství na základě podaných námitek účastníků řízení. Dne 13. 5. 2019 vydáno Usnesení o přerušení řízení Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem životního prostředí do doby doplnění podkladů. <p>Aktuální stav řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK:</p> <ul style="list-style-type: none"> D3 0304 Václavice–Voračice – oznámení o pokračování řízení a výzva vyjádření se k podkladům – 1. 11. 2019. Lhůta pro podání námitek uplynula 20. 11. 2019 => KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí 25. 3. 2020. K vydanému rozhodnutí bylo doručeno 9 odvolání (Krajina 2000, Děti Země, Sdružení Miláčov, ČSOP Benešov, Obec Tisem, Městys Maršovice, Ing. Petr Hanzlík, Josef Žížala, Zdeněk Štěpánek). Odvolací řízení ukončeno – dne 10. 9. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1997 Sb. ze dne 20. 3. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 9. 11. 2020 oznámil KÚ Plzeňského kraje pokračování řízení a vyzval ŘSD ČR k doplnění podkladů (stanoviska vlastníků dotčených realizací kompenzačních opatření, konkretizaci časové působnosti požadované výjimky, řádovou kvantifikaci počtu jedinců druhů jednotlivých zvláště chráněných druhů živočichů). Požadované podklady KÚ PK byly ze strany ŘSD ČR doplněny 31. 5. 2021, KÚ PK zahájil správní kroky k vydání nového Rozhodnutí.
Opatření k urychlení přípravy/výstavby	
Opatření vyžadovaná od ministra/premiéra	



0305/1 Voračice–Nová Hospoda

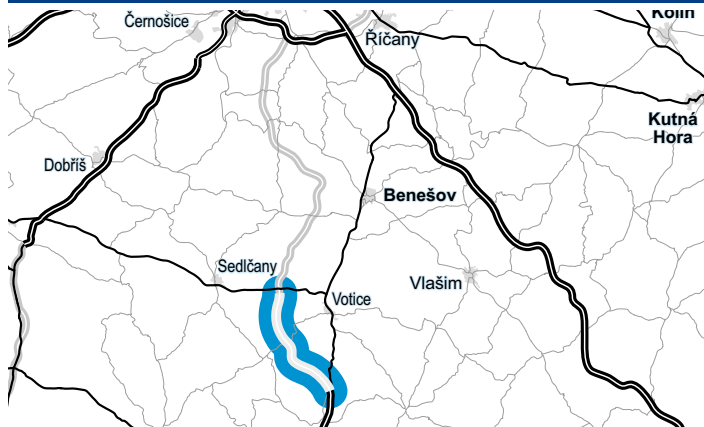

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2012	10/2015	2022	2024	2024	2025	2029

Stav	V přípravě
Délka (m)	16 454
Kategorie	D 27,5/120
Mosty (dálniční)	20
MÚK	MÚK Mezno, MÚK Loudilka
Zhotovitel DÚR	VPÚ DECO PRAHA a.s.
Cena (bez DPH)	7 646 000 000 Kč

Stav MPV

Dosud nebylo zahájeno.

Aktuální problém v přípravě

Probíhá zajišťování chybějících stanovisek a Rozhodnutí – chybí pravomocné Rozhodnutí o výjimkách ze zvláště chráněných druhů organismů podle §56 zákona č. 114/1992 Sb, závazná stanoviska ke kácení mimolesní zeleně.

Další informace


- Žádosti o vydání výjimek podány 1. 12. 2017 a 3. 1. 2018, na základě velkého množství námitek v řízení několikrát prodlužována lhůta na seznámení účastníků s podklady v řízení.
- Usnesením MŽP ze dne 8. 2. 2019 byl k pokračování v řízení a k vydání Rozhodnutí o výjimkách na stavbu 0305 pověřen Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí z důvodu systémové podjatosti Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství na základě podaných námitek účastníků řízení.
- Dne 13. 5. 2019 vydáno Usnesení o přerušení řízení Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem životního prostředí na stavbu „D3 0305/1 Voračice – Nová Hospoda“ do doby doplnění podkladů.
- D3 0305/1 Voračice – Nová Hospoda - oznámení o pokračování řízení a výzva vyjádření se k podkladům – 7. 11. 2019. Lhůta pro podání námitek uplynula 22. 11. 2019 => KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí 13. 3. 2020. K vydanému Rozhodnutí byla doručena 3 odvolání ((Krajina 2000, Děti Země, Sdružení Miláčov), odvolací řízení ukončeno – dne 1. 9. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1992 Sb. ze dne 13. 3. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 23. 10. 2020 oznámil KÚ Plzeňského kraje pokračování řízení a vyzval ŘSD ČR k doplnění podkladů (stanoviska vlastníků dotčených realizací kompenzačních opatření, konkretizaci časové působnosti požadované výjimky, řádovou kvantifikaci počtu jedinců druhů jednotlivých zvláště chráněných druhů živočichů).
- Požadované podklady KÚ PK byly ze strany ŘSD ČR doplněny 31. 5. 2021, KÚ PK zahájil správné kroky k vydání nového Rozhodnutí.

Opatření k urychlení přípravy/výstavby

Opatření vyžadovaná od ministra/premiéra

Dálnice D3

stavba 0301
Praha – Jílové

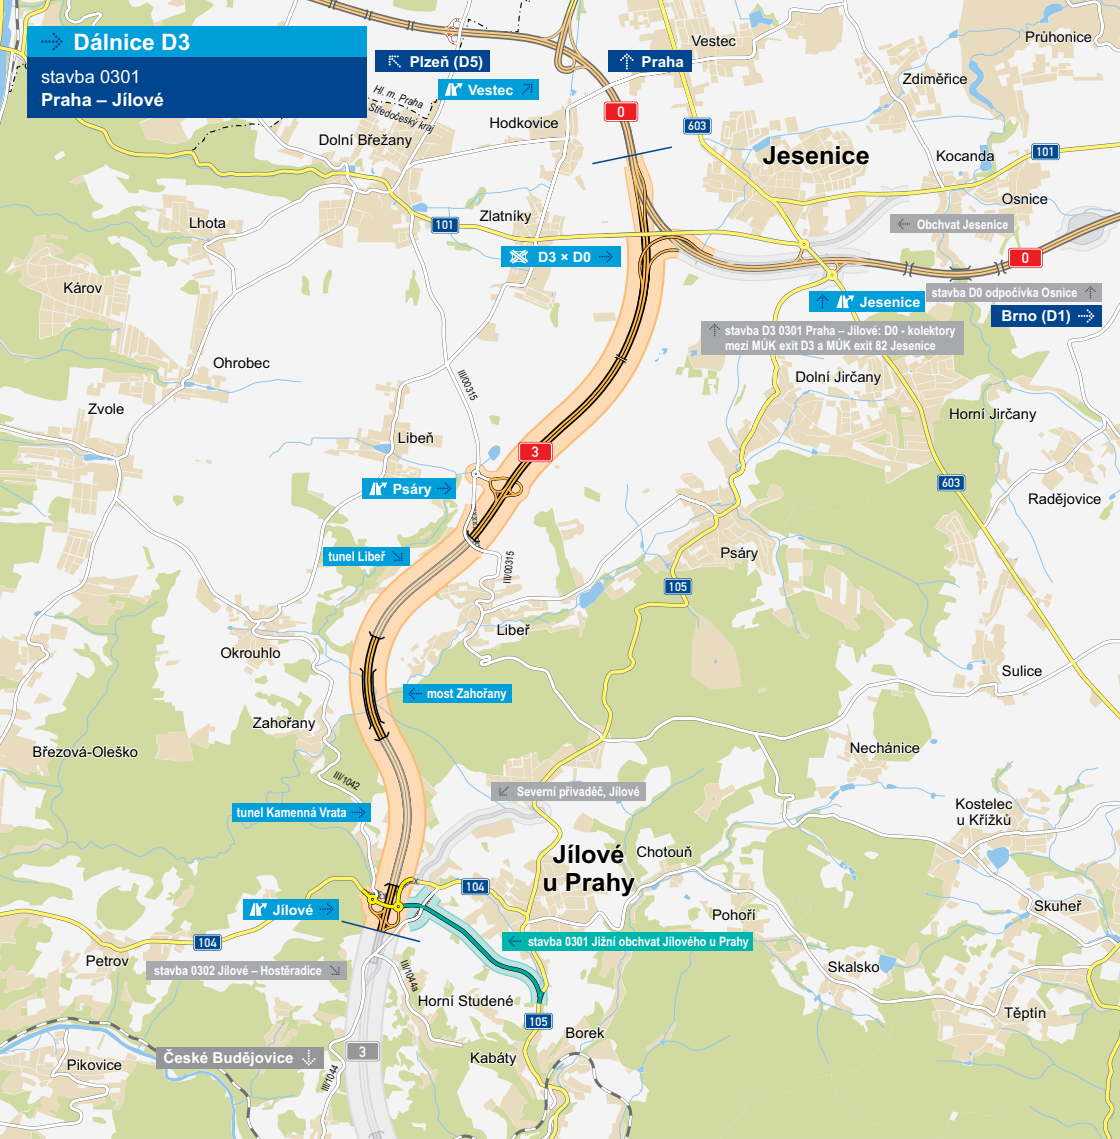

- řešená stavba
- související stavby
- jiné stavby



0 1 2 km

Geografická data poskytl VGHMÚF Dobruška, © MO ČR, 2013

ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Praha – Jílové

Dálnice D3

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V červenci 2015 byla zpracována aktualizace záměru projektu, který byl v říjnu 2015 schválen. V prosinci 2016 byla dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí a probíhá inženýrská činnost související s vydáním rozhodnutí o umístění stavby. Dne 31. 10. 2018 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Předpoklad získání nepravomocného ÚR je do 06/2022.

V další fázi přípravy byly realizovány doplňující hydrogeologické průzkumy pro předběžný GTP (od 01/2019 do 11/2019) a také probíhá příprava realizace podrobných geotechnických průzkumů pro DSP. Probíhá řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK. KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí o výjimkách 18. 5. 2020.

K vydanému rozhodnutí bylo doručeno 11 odvolání. Dne 5. 11. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí KÚ z 18. 5. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 26. 11. 2019 bylo předloženo Oznámení změny záměru „D3 0301–0303 Praha–Václavice, změny v úseku MÚK Jílové – MÚK Hostěradice“ na MŽP. Dne 5. 12. 2019 zahájeno zjišťovací řízení (zveřejněno na portálu CENIA). Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 24. 6. 2020. K vydanému závěru zjišťovacího řízení přišly tři rozklady. Dne 21. 1. 2021 bylo vydáno Rozhodnutí o rozkladu MŽP – podané rozklady byly zamítnuty.

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 9514 m
kategorie: D 27,5/120
počet stavebních objektů: 255

Tunely:

Libeň; Kamenná Vrata
celková délka: 3207 m

Mostní objekty:

na dálnici: 5
nadjezdy: 2
na větvích křižovatek: 4
mosty na účelové komunikaci: 2
celková délka mostů: 1216 m

Mimoúrovňové křižovatky:

MÚK Jílové, MÚK Psáry, MÚK 3xD0
celková délka větví: 4954 m

Protihlukové stěny:

počet: 5 (celková délka: 2753 m)

Zemní valy:

počet: 23

Úpravy ostatních komunikací:

silnice II. tříd: 1 (délka: 1002 m)
silnice III. tříd: 2 (délka: 812 m)
místní komunikace: 1 (délka: 180 m)
účelové komun.: 9 (délka: 4301 m)
přístupové komun.: 9 (délka: 11 400 m)
polní cesty: 3 (délka: 522 m)

Přeložky a úpravy inž. sítí:

vodohospodářské objekty: 28

objekty elektro: 11

přeložky plynovodu: 1

Celkový objem zemních prací:

výkopy: 3 060 900 m³

násypy: 3 755 500 m³

Název stavby:

Dálnice D3 0301 Praha – Jílové

Místo stavby:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Hodkovice u Zlatníků, Jesenice u Prahy, Zlatníky u Prahy, Dolní

Jirčany, Psáry, Libeň u Libeře, Libeň, Okrouhlo, Jílové u Pr., Petrov u Prahy

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracovatel DÚR:


Pragoprojekt/Amberg/Mott MacDonald D3 0301–0303 (vedoucí účastník sdružení Pragoprojekt)

Předpokládané náklady stavby:

8 462 000 000 Kč (bez DPH)

Dálnice D3

stavba 0302
Jílové – Hostěradice

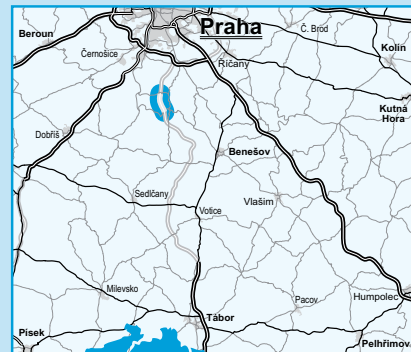

řešená stavba
jiné stavby



0 1 2 km

Geografická data poskytl VGHMÚF Dobruška, © MO ČR, 2013

ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Jílové – Hostěradice

Dálnice **D3**

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V červenci 2015 byla zpracována aktualizace záměru projektu, který byl v říjnu 2015 schválen. V prosinci 2016 byla dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí a probíhá inženýrská činnost související s vydáním rozhodnutí o umístění stavby. Dne 31. 10. 2018 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Předpoklad získání nepravocmoného ÚR je do 06/2022.

V další fázi přípravy jsou realizovány doplňující hydrogeologické průzkumy pro předběžný GTP (od 01/2019 do 11/2019) a také probíhá příprava realizace podrobných geotechnických průzkumů pro DSP. Probíhá řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK. KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí o výjimkách 18. 5. 2020.

K vydanému rozhodnutí bylo doručeno 11 odvolání. Dne 5. 11. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí KÚ z 18. 5. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 18. 12. 2020 oznámil KÚ Plzeňského kraje pokračování řízení a vyzval ŘSD ČR k doplnění podkladů. Požadované podklady KÚ PK byly ze strany ŘSD ČR doplněny 31. 3. 2021, KÚ PK zahájil správní kroky k vydání nového Rozhodnutí. Dne 26. 11. 2019 bylo předloženo Oznámení změny záměru „D3 0301–0303 Praha–Václavice, změny v úseku MÚK Jílové – MÚK Hostěradice“ na MŽP. Dne 5. 12. 2019 bylo zahájeno zjišťovací řízení (na portálu CENIA). K vydání závěru zjišťovacího řízení došlo 24. 6. 2020.

K vydanému závěru zjišťovacího řízení přišly tři rozklady. Dne 21. 1. 2021 bylo vydáno Rozhodnutí o rozkladu MŽP – podané rozklady byly zamítnuty.

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 4486 m

kategorie: D 27,5/120

počet všech stavebních objektů: 139

Tunely:

Luka (délka: 1843 m)

Mostní objekty:

na dálnici: 3, nadjezdy: 2

na přeložce II/106: 1

lávka pro pěši: 1

celková délka mostů: 1261 m

Mimoúrovňové křižovatky:

MÚK Hostěradice (délka větvi: 927 m)

Protihlukové stěny:

počet: 4 (celková délka: 2310 m)

Zemní valy:

počet: 3

Úpravy ostatních komunikací:

silnice II. tříd: 1 (délka: 1696 m)

silnice III. tříd: 2 (délka: 700 m)

místní komunikace: 2 (délka: 441 m)

účelové komun.: 9 (délka: 2340 m)

polní cesty: 2 (délka: 294 m)

přístupové komun.: 2 (délka: 4600 m)

Přeložky a úpravy inž. sítí:

vodohospodářské objekty: 16

objekty elektro: 15

přeložky plynovodu: 1

Celkový objem zemních prací:

výkopy: 1 268 100 m³

násypy: 453 200 m³

Název stavby:

Dálnice D3 0302 Jílové–Hostěradice

Místo stavby:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Jílové u Prahy, Petrov u Prahy, Luka

pod Medníkem, Hostěradice

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR



Zpracovatel DÚR:

Pragoprojekt/Amberg/Mott MacDonald D3 0301–0303 (vedoucí

účastník sdružení Pragoprojekt)

Předpokládané náklady stavby:

5 589 000 000 Kč (bez DPH)

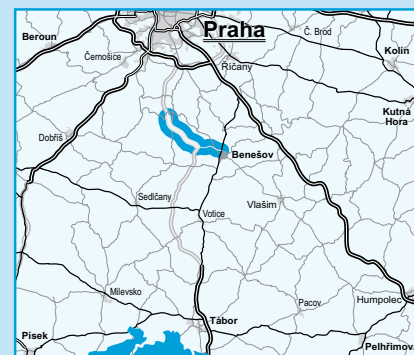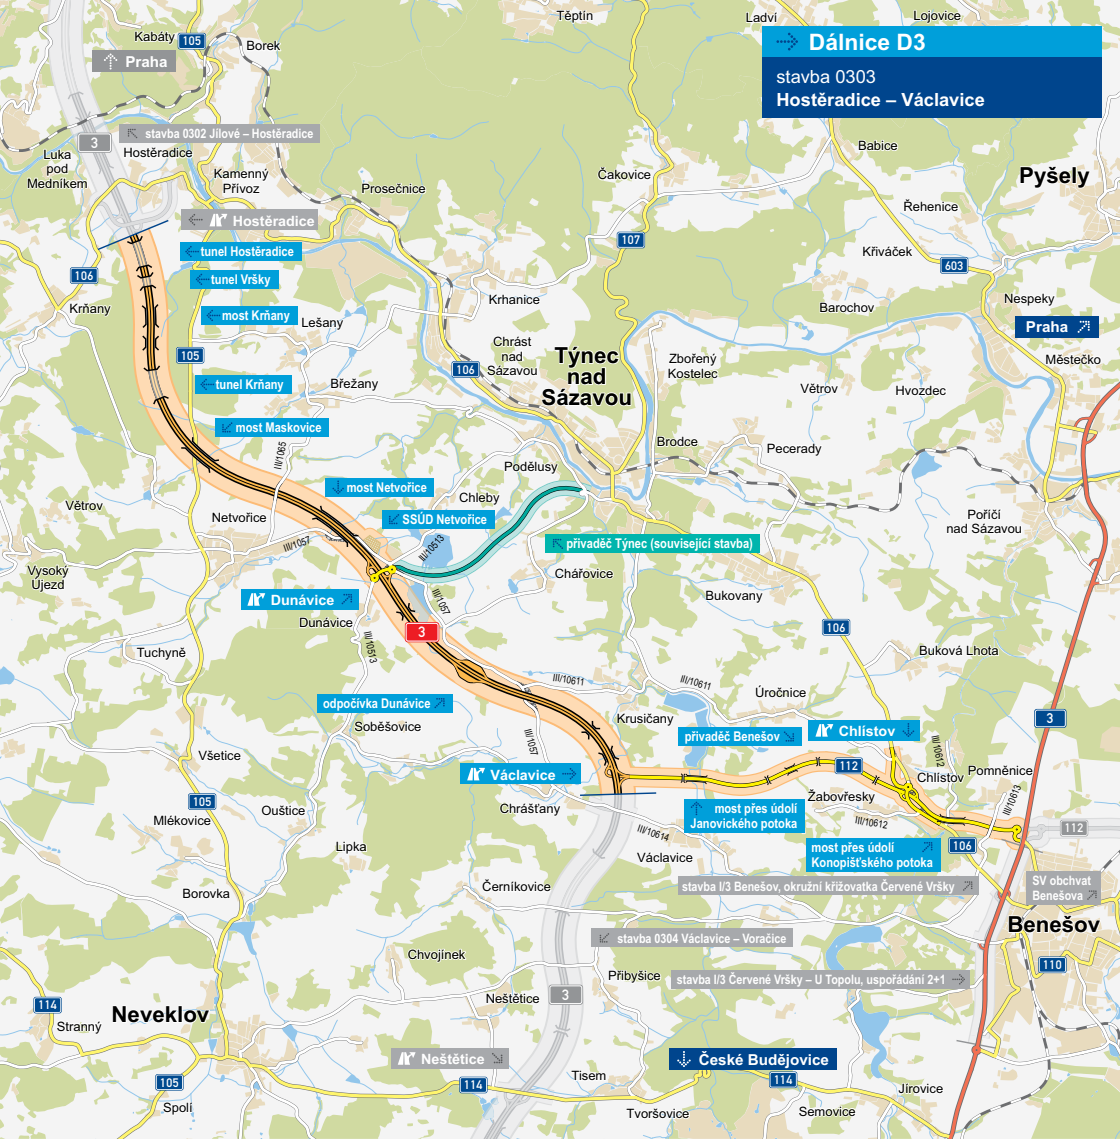

- řešená stavba
- související stavby
- jiné stavby



0 2 4 km

Geografická data poskytl VGHMÚF Dobruška, © MO ČR, 2013

ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Hostěradice – Václavice

Dálnice D3

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V červenci 2015 byla zpracována aktualizace záměru projektu, který byl v říjnu 2015 schválen. V prosinci 2016 byla dokončena DÚR a probíhá inženýrská činnost související s vydáním rozhodnutí o umístění stavby. Dne 31. 10. 2018 byla podána žádost o vydání ÚR. Předpoklad získání nepravomocného ÚR je do 06/2022. V další fázi přípravy byly realizovány doplňující hydrogeologické průzkumy pro předběžný GTP (od 01/2019 do 11/2019) a také probíhá příprava realizace podrobných geotechnických průzkumů pro DSP.

Probíhá řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK. KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí o výjimkách 18. 5. 2020. K vydanému rozhodnutí bylo doručeno 11 odvolání. Dne 5. 11. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí KÚ z 18. 5. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 18. 12. 2020 oznámil KÚ PK pokračování řízení a vyzval ŘSD ČR k doplnění podkladů (splněno 31. 3. 2021). Dne 26. 11. 2019 bylo předloženo Oznámení změny záměru „D3 0301–0303 Praha–Václavice, změny v úseku MÚK Jilové – MÚK Hostěradice“ na MŽP. Dne 5. 12. 2020 bylo zahájeno zjišťovací řízení (zveřejněno na portálu CENIA). Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 24. 6. 2020. K vydanému závěru zjišťovacího řízení přišly tři rozklady. Dne 21. 1. 2021 bylo vydáno Rozhodnutí o rozkladu MŽP – podané rozklady byly zamítnuty.

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 11 292 m
kategorie: D 27,5/120
počet všech stavebních objektů: 378

Tunely:

Hostěradice; Vršky; Krňany
celková délka tunelů: 946 m

Mostní objekty:

na dálnici: 11
nad dálnicí: 2
na přivaděči: 5
nadjezdy na přivaděči: 4
na přeložkách: 2
celková délka mostů: 2739 m

Mimourovňové křižovatky:

MÚK Václavice, MÚK Dunávice
na přivaděči: MÚK Chlístov
celková délka větví: 3115 m

Protihlukové stěny:

počet: 13 (celková délka: 5584 m)

Zemní valy:

počet: 16

Úpravy ostatních komunikací:

přivaděč Benešov: S 9,5/80, 5800 m
silnice II. tříd: 1 (1452 m)
silnice III. tříd: 7 (2686 m)
místní komunikace: 5 (1661 m)
účelové komunikace: 13 (2236 m)
přístupové komunikace: 11 (17 200 m)
lesní a lesní cesty: 16 (3725 m)

Odbočky:

Dunávice (oboustranná)

Přeložky a úpravy inž. sítí:

vodohospodářské objekty: 64
objekty elektro: 41
přeložky plynovodu: 4

Celkový objem zemních prací:

výkopy: 1 919 400 m³
násypy: 2 040 900 m³

Název stavby:

Dálnice D3 0303 Hostěradice–Václavice

Místo stavby:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Hostěradice, Lešany nad Sázavou,

Břežany u Lešan, Maskovice, Netvořice, Dunávice, Chářovice, Krusičany, Václavice u Benešova, Chrástany u Benešova

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracovatel DÚR:



Pragoprojekt/Amberg/Mott Mac Donald D3 0301–0303 (vedoucí účastník sdružení Pragoprojekt)

Předpokládané náklady stavby:

6 782 000 000 Kč (bez DPH)

Dálnice D3

stavba 0304
Václavice – Voračice

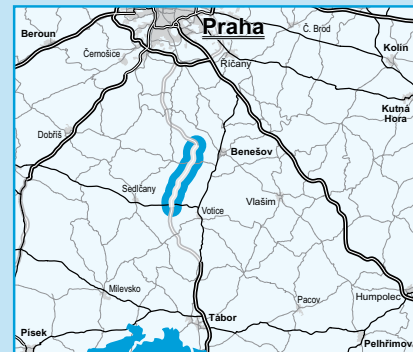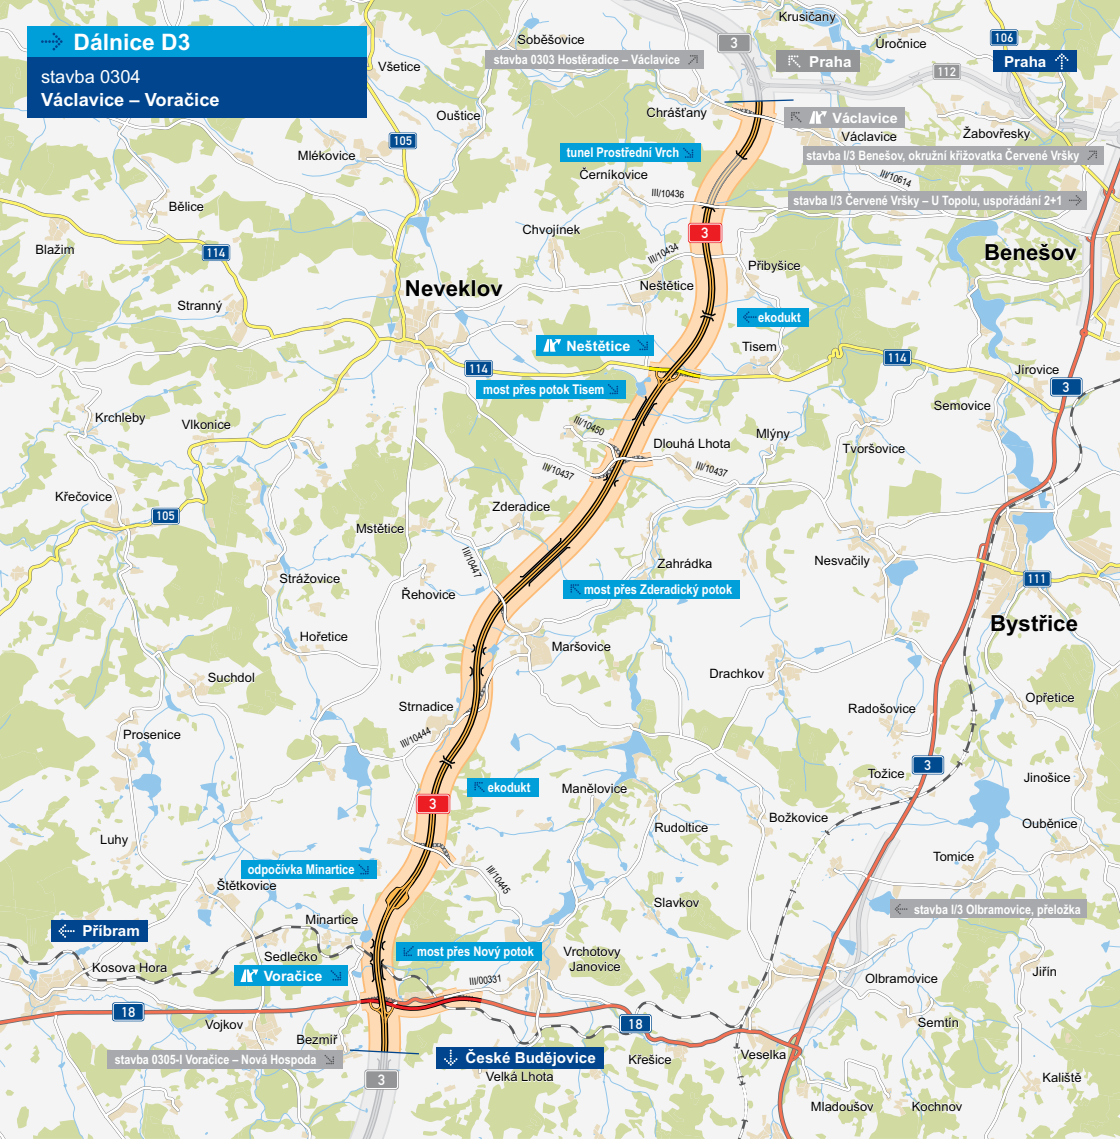

řešená stavba
jiné stavby



0 2 4 km

Geografická data poskytl VGHMÚF Dobruška, © MO ČR, 2013

ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Václavice – Voračice

Dálnice **D3**

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V 07/2015 byla zpracována aktualizace záměru projektu, který byl v 10/2015 schválen. V 01/2017 byla dokončena DÚR a byla inženýrská činnost související s vydáním rozhodnutí o umístění stavby. Dne 31. 10. 2018 byla podána žádost o vydání ÚR. Výzva k doplnění podkladů vydána 25. 11. 2019, termín pro doplnění podkladů k územnímu řízení stanoven do 30. 6. 2021. V další fázi přípravy byly realizovány doplňující hydrogeologické průzkumy pro předběžný GTP (od 01/2019 do 11/2019) a také probíhá příprava realizace podrobných geotechnických průzkumů pro DSP. Probíhá řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK. KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí o výjimkách 13. 3. 2020. K vydanému Rozhodnutí bylo doručeno devět odvolání. Odvolací řízení bylo ukončeno. Dne 1. 9. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1997 Sb. ze dne 20. 3. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 9. 11. 2020 oznámil KÚ PK pokračování řízení a vyzval ŘSD k doplnění podkladů. Požadované podklady KÚ PK byly ze strany ŘSD doplněny 31. 5. 2021, KÚ PK zahájil správní kroky k vydání nového Rozhodnutí.

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 16 700 m
kategorie: D 27,5/120
počet všech stavebních objektů: 273

Tunely:

Prostřední vrch (960 m)

Mostní objekty:

na dálnici: 12
nad dálnici: 5
na silnici I/18: 2
ekodukty: 2
celková délka mostů: 2351 m

Mimoúrovňové křižovatky:

MÚK Voračice, MÚK Neštětice
celková délka větví: 2300 m

Odpočívky:

Minartice (oboustranná)
Protihlukové stěny
počet: 6 (celková délka: 2864 m)

Zemní valy:

počet: 6

Úpravy ostatních komunikací:

silnice I. tříd: 1 (délka: 2033 m)
silnice II. tříd: 1 (délka: 783 m)
silnice III. tříd: 10 (délka: 5211 m)
účelové komun.: 6 (délka: 1318 m)
polní cesty: 22 (délka: 17 746 m)
lesní cesty: 1 (délka: 170 m)
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 63
objekty elektro: 24

Celkový objem zemních prací:

výkopy: 4 500 400 m³
náspy: 2 000 000 m³

Název stavby:

Dálnice D3 0304 Václavice–Voračice

Místo stavby:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Chrášťany u Benešova, Václavice u Benešova, Příbyšice, Tisem, Neštětice, Zahrádka u Benešova, Zderadice, Maršovice u Benešova, Strnadice, Šebáňovice, Vrchotovy Janovice, Minartice, Bezmír

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:





Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracovatel DÚR:

Sdružení SUDOP Group, vedoucí účastník sdružení SUDOP a.s.

Předpokládané náklady stavby:

9 422 000 000 Kč (bez DPH)

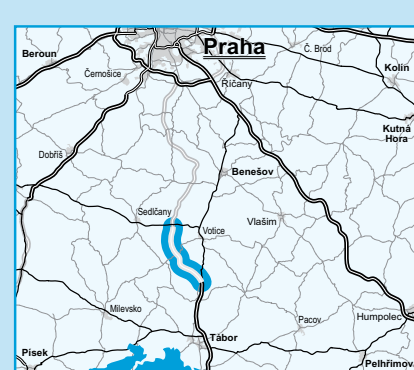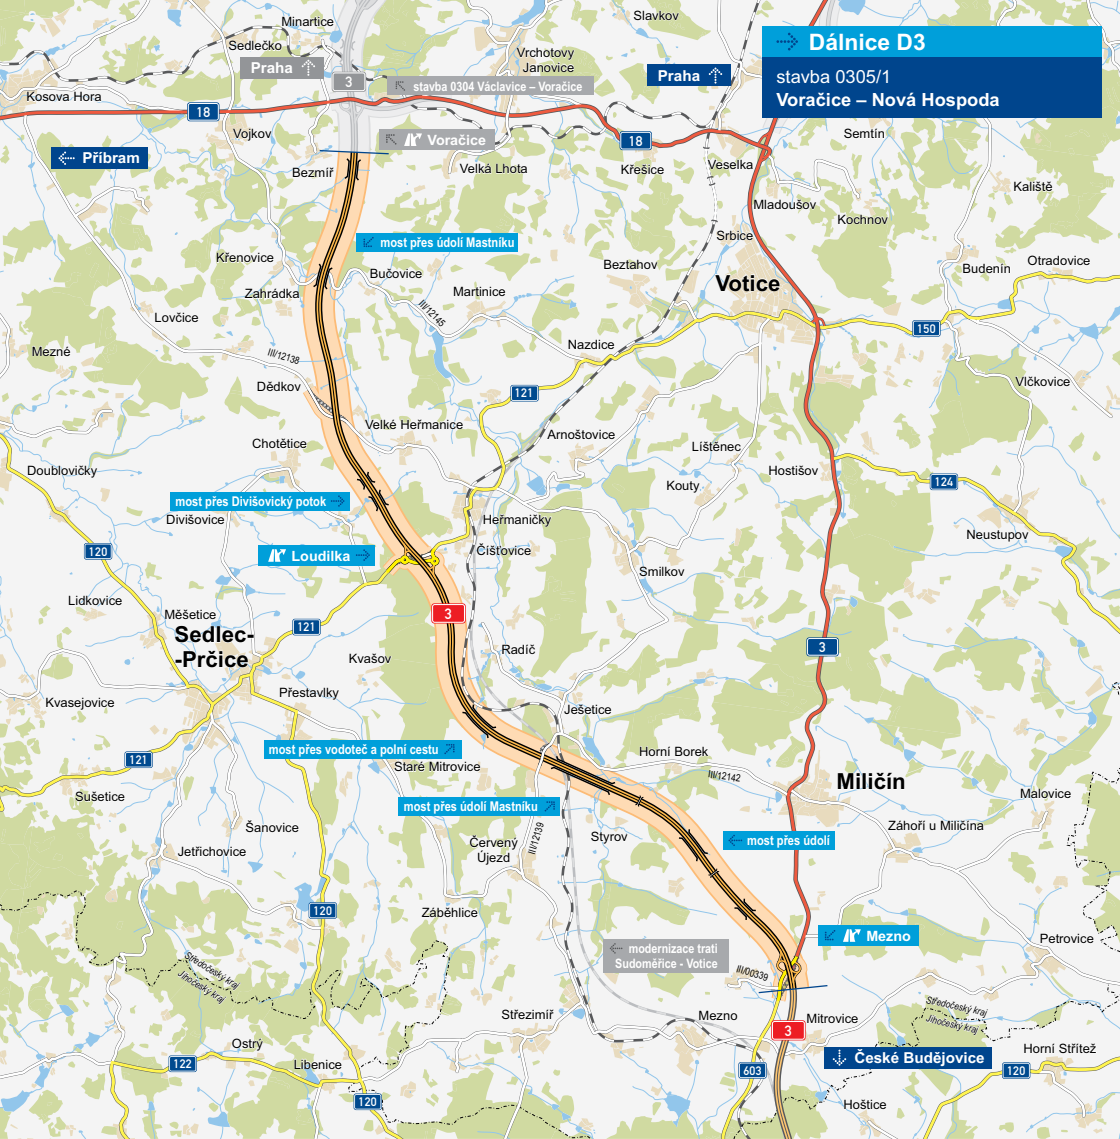

Voračice – Nová Hospoda

Dálnice D3

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V červenci 2015 byla zpracována aktualizace záměru projektu, který byl v říjnu 2015 schválen. V lednu 2017 bude dokončena DÚR a byla zahájena inženýrská činnost související s vydáním rozhodnutí o umístění stavby. Dne 31. 10. 2018 byla podána žádost o vydání ÚR. Územní řízení je přerušeno do doby doplnění podkladů (termín pro doplnění stanoven do 30. 6. 2021). V další fázi přípravy byly realizovány doplňující hydrogeologické průzkumy pro předběžný GTP (od 01/2019 do 11/2019) a také probíhá příprava realizace podrobných geotechnických průzkumů pro DSP. Probíhá řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK. KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí dne 13. 3. 2020. K vydanému Rozhodnutí byla doručena tři odvolání. V odvolacím řízení dne 1. 9. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1997 Sb. ze dne 13. 3. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 23. 10. 2020 oznámil KÚ Plzeňského kraje pokračování řízení a vyzval ŘSD ČR k doplnění podkladů. Požadované podklady KÚ PK byly ze strany ŘSD ČR doplněny 31. 5. 2021, KÚ PK zahájil správní kroky k vydání nového Rozhodnutí.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2012	10/2015	2022	2024	2024	2025	2029

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 16 454 m
kategorie: D 27,5/120
počet všech stavebních objektů: 226

Mostní objekty:

na dálnici: 20, nad dálnici: 3
celková délka mostů: 3543 m

Mimourovňové křižovatky:

MÚK Mezno, MÚK Loudilka
celková délka větví: 2508 m

Protihlukové stěny:

počet: 9 (celková délka: 3594 m)

Opěrné zdi:

počet: 1 (délka: 24 m)

Zemní valy:

počet: 8 (celková délka: 3044 m)
Úpravy ostatních komunikací:
silnice I. tříd: 1 (délka: 1268 m)
silnice II. tříd: 1 (délka: 821 m)
silnice III. tříd: 2 (délka: 1239 m)
místní komunikace: 2 (délka: 1097 m)
účelové komunikace: 2 (délka: 541 m)
polní cesty: 21 (délka: 10 807 m)
přjezd k RN: 10 (délka: 1491 m)

Přeložky a úpravy inž. sítí:

vodohospodářské objekty: 57
objekty elektro: 22
přeložky plynovodu: 3

Název stavby:

Dálnice D3 0305/1 Voračice – Nová Hospoda

Místo stavby:

Středočeský kraj
Katastrální území:
Bezmíř, Martinice u Votic, Velké Heřmanice, Divišovice, Heřmaničky, Prčice, Ješetice, Červený Újezd u Miličína, Horní Borek, Miličín, Lažany u Mezna, Mitrovice

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracovatel DÚR:


Sdružení SUDOP Group, vedoucí účastník sdružení SUDOP a.s.

Předpokládané náklady stavby:

7 646 000 000 Kč (bez DPH)

Dálnice D3

stavba 0301
Jižní obchvat Jílového u Prahy

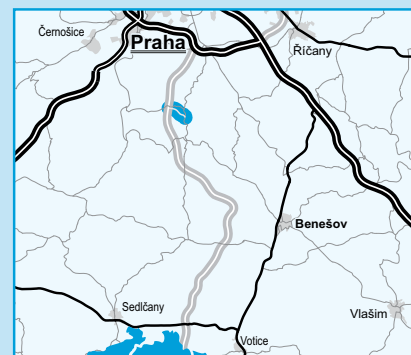

řešená stavba
jiné stavby



0 250 500 m

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2015

ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Jižní obchvat Jílového u Prahy

Dálnice **D3**

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Na stavbu je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Probíhá inženýrská činnost pro získání ÚR. K podání žádosti o vydání ÚR došlo 31. 3. 2021. U výjimek ze zvláště chráněných druhů organismů (podle §56 zákona č. 114/1992 Sb.) bylo dne 22. 1. 2020 vydáno nepravomocné Rozhodnutí. Proti vydanému Rozhodnutí byla podána dvě odvolání. Dne 4. 8. 2020 bylo MŽP potvrzeno vydané Rozhodnutí a nabylo právní moci. Dne 26. 10. 2020 ale bylo doručeno podání žaloby na vydané Rozhodnutí spolkem Krajina 2000.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
-	-	-	-	-	2025	2029

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 1974 m
kategorie: S 7,5/50
počet všech stavebních objektů: 23

Mostní objekty:

počet: 2
celková délka mostů: 69 m

Úrovnňové křižovatky:

okružní: 1
průsečné: 1

Úpravy ostatních komunikací:

úprava ulice Nádražní: 1 (délka: 40 m)
provizorní komunikace: 1
přístupové cesty: 3 (délka: 1000 m)

Přeložky a úpravy inž. sítí:

vodohospodářské objekty: 2
objekty elektro: 8

Demolice:

počet objektů: 2

Název stavby:

D3 0301 Jižní obchvat Jílového u Prahy

Místo stavby:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Jílové u Prahy

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracovatel DÚR:


Mott McDonald CZ, spol. s r.o.

Předpokládaná cena stavby:

226 000 000 Kč (bez DPH)

Dálnice D3

stavba 0303
Přivaděč Týnec n. S.

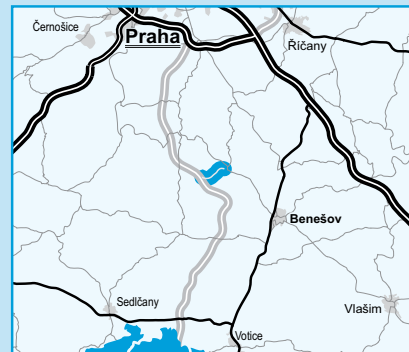

řešená stavba
jiné stavby

0 0,5 1 km

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2015

ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Přivaděč Týnec nad Sázavou

Dálnice **D3**

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Na stavbu je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Dne 31. 10. 2018 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Předpoklad získání nepravomocného ÚR je do 06/2022.

Probíhá řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK. KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí o výjimkách dne 2. 4. 2020. K vydanému Rozhodnutí doručena tři odvolání. V odvolacím řízení dne 28. 8. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1997 Sb. ze dne 2. 4. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 15. 10. 2020 oznámil KÚ Plzeňského kraje pokračování řízení a vyzval ŘSD ČR k doplnění podkladů (stanoviska vlastníků dotčených realizací kompenzačních opatření, odůvodnění veřejného zájmu, řádovou kvantifikaci počtu jedinců druhů jednotlivých zvláště chráněných druhů živočichů).

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
-	-	-	-	-	2025	2029

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 3240 m
kategorie: S 7,5/50

Mostní objekty:

počet: 1

Úrovnňové křižovatky:

stykové: 2

Zemní valy:

počet: 3 (celková délka: cca 480 m)

Demolice:

počet objektů: 10

Celkový objem zemních prací:

výkopy: 110 500 m³

násypy: 64 900 m³

Název stavby:

D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou

Místo stavby:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Dunávice, Chleby u Týnce n. Sázavou, Chářovice, Podělusy, Týnec n. Sázavou

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracovatel DÚR:

Pragoprojekt a.s.

Předpokládaná cena stavby:

203 000 000 Kč (bez DPH)



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC A DÁLNIC ČR**
