

# přehled staveb **ŘSD**



## **Dálnice D3**


Stav k 01/2022

**Středočeský úsek (Praha – Nová Hospoda)**

# Klíčová data

Úsek	DÁLNIČE D3 – název stavby	Délka (km)	Zahájení	Zprovoznění	Cena (Kč)
0301	Praha–Jílové	9,5	2026	2029	8 462 000 000*
0302	Jílové–Hostěradice	4,5	2026	2029	5 589 000 000*
0303	Hostěradice–Václavice	11,3	2026	2029	6 782 000 000*
0304	Václavice–Voračice	16,7	2026	2029	9 422 000 000*
0305/1	Voračice–Nová Hospoda	16,5	2026	2029	7 646 000 000*
Celkem km / Kč		58,5			37 901 000 000

\* Předpokládaná cena

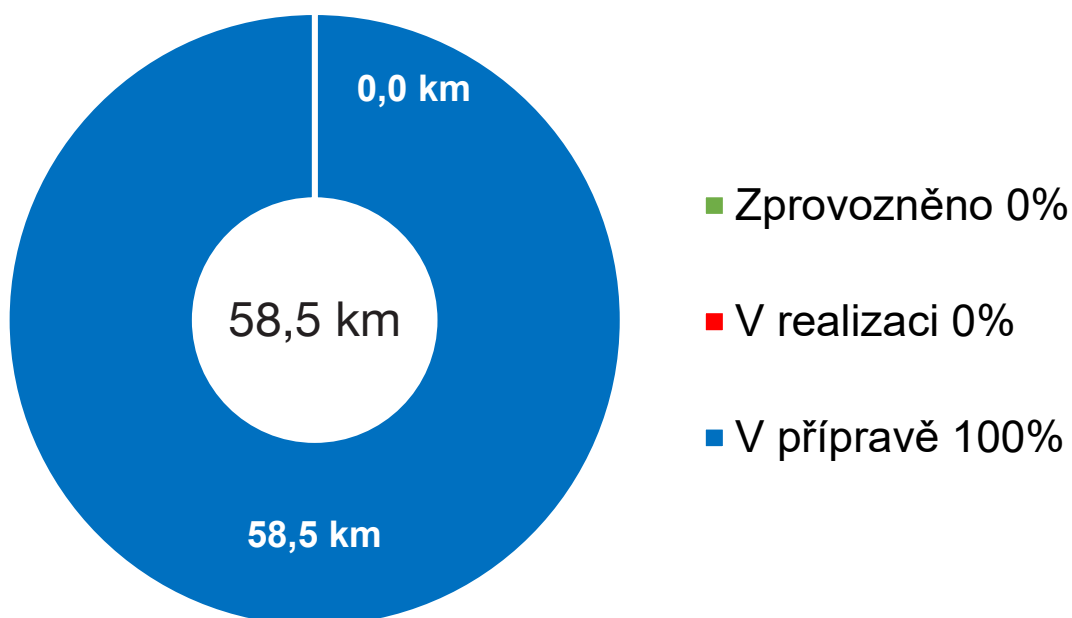

SILNICE – dálniční přivaděče*	Délka (km)	Zahájení	Zprovoznění	Cena (Kč)
Přivaděč Benešov	5,8	2026	2029	1 138 000 000*
Jižní přivaděč Jílové u Prahy	1,9	2026	2029	226 000 000*
Přivaděč Týnec n.S.	3,2	2026	2029	203 000 000*
Celkem km / Kč	10,9			1 567 000 000

\* Přivaděče budou uvedeny do provozu až společně s dálnicí.

# Dálnice D3 Středočeský úsek

 předpoklad zahájení v roce 2026 – 58,5 km

Celková délka: 58,5 km  
stav k 01/2022

0302 Jílové – Hostěradice (4,5 km)  
(předpokl. realizace 2026 – 2029)

0301 Praha – Jílové (9,5 km)  
(předpokl. realizace 2026 – 2029)

0301 Jižní obchvat Jílového u Prahy (2,0 km)  
(předpokl. realizace 2026 – 2029)

0303 Přivaděč Týnec n. S. (3,2 km)  
(předpokl. realizace 2026 – 2029)

0303 Hostěradice – Václavice (11,3 km)  
(předpokl. realizace 2026 – 2029)

0304 Václavice – Voračice (16,7 km)  
(předpokl. realizace 2026 – 2029)

0305/I Voračice – Nová Hospoda (16,5 km)  
(předpokl. realizace 2026 – 2029)

## Legenda

-  dálnice
-  silnice I. třídy, 4pruhové
-  silnice pro motorová vozidla
-  silnice I. třídy
-  silnice II. třídy
-  číslo dálnice
-  číslo silnice
-  státní hranice

0 5 10 km

Geografická data poskytl VGHMÚF Dobruška, © MO ČR, 2015

ROADMEDIA



## D3 0301 Praha–Jílové



EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2012	10/2015	2023	2025	2025	2026	2029

<b>Stav</b>	V přípravě
<b>Délka (m)</b>	9514
<b>Kategorie</b>	D 27,5/120
<b>Tunely</b>	Líbeř; Kamenná Vrata (celková délka: 3207 m)
<b>Mosty (dálniční)</b>	5
<b>MÚK</b>	MÚK Jílové, MÚK Psáry, MÚK D3xD0
<b>Zhotovitel DÚR</b>	Pragoprojekt, Amberg, Mott Macdonald
<b>Cena (bez DPH)</b>	8 462 000 000 Kč

### Stav MPV

Dosud nebylo zahájeno.

### Aktuální problém v přípravě

- **Územní řízení je přerušeno** - chybí pravomocné Rozhodnutí o výjimkách ze zvláště chráněných druhů organismů podle §56 zák. č. 114/1992 Sb.

### Další informace


- Usnesením MŽP ze dne 8. 2. 2019 byl k pokračování v řízení a k vydání Rozhodnutí o výjimkách na stavby D3 0301–0303 pověřen Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě podaných námitek účastníků řízení.
- Žádost o vydání výjimek podána 3. 7. 2018, na základě velkého množství námitek v řízení několikrát prodlužována lhůta na seznámení účastníků s podklady v řízení.
- Dne 7. 5. 2019 vydáno Usnesení o přerušení řízení Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem životního prostředí do doby doplnění podkladů.
- Dne 25. 11. 2021 Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost ve věci první aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, čím definitivně potvrdil platnost aktualizovaných ZÚR a ukončil tak dlouholetý spor o vedení dálnice. Další opravné prostředky již nelze proti koridoru uplatňovat a proto je v rámci krajské dokumentace stabilizovaný. K potvrzení západní varianty došlo v roce 2015 schválením první aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Proti této aktualizaci následně byla podána odpůrci stavby žaloba, kterou Krajský soud v Praze v roce 2018 zamítl. Stěžovatelé (Krajina 2000, spolek pro ochranu přírody dolního Posázaví a obec Okrouhlo) následně podali kasační stížnost k NSS.

### Aktuální stav řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK:

- D3 0301–0303 Praha–Václavice – oznámení o pokračování řízení a výzva vyjádření se k podkladům – 18. 10. 2019, lhůta pro podání námitek uplynula 20. 11. 2019 => KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí 18. 5. 2020 – k vydanému rozhodnutí bylo doručeno 11 odvolání (Krajina 2000, Město Jesenice, Děti Země, ČSOP Benešov, Obec Lešany, Obec Krňany, Městys Netvořice, Obec Okrouhlo, Sdružení Miláčov, Věra Červová, Josef Žížala).
- Odvolací řízení ukončeno – dne 5. 11. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1997 Sb. ze dne 18. 5. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 18.12.2020 oznámil KÚ Plzeňského kraje pokračování řízení a vyzval ŘSD ČR k doplnění podkladů (stanoviska vlastníků dotčených realizací kompenzačních opatření, konkretizaci časové působnosti požadované výjimky, řádovou kvantifikaci počtu jedinců druhů jednotlivých zvláště chráněných druhů živočichů, zdůvodnění veřejného zájmu Václavické spojky, bližší určení plošné působnosti výjimky).
- Požadované podklady KÚ PK byly ze strany ŘSD ČR doplněny 31. 3. 2021, KÚ PK zahájil správní kroky k vydání nového Rozhodnutí.

### Opatření k urychlení přípravy/výstavby

### Opatření vyžadovaná od ministra/premiéra

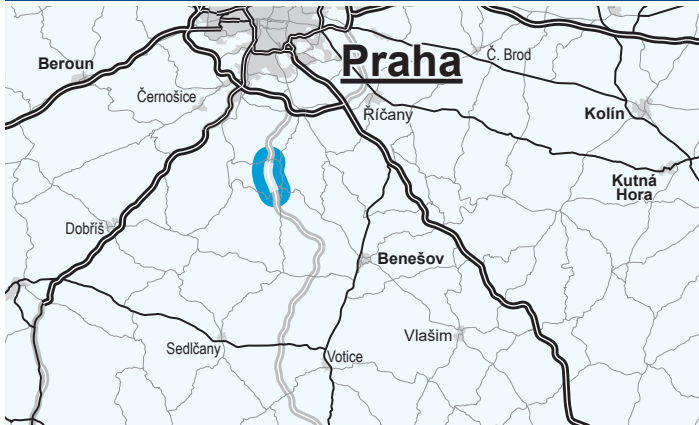

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2012	10/2015	2023	2025	2025	2026	2029
<b>Stav</b>		V přípravě				
<b>Délka (m)</b>		4486				
<b>Kategorie</b>		D 27,5/120				
<b>Tunely</b>		Luka (1843 m)				
<b>Mosty (dálniční)</b>		3				
<b>MÚK</b>		MÚK Hostěradice				
<b>Zhotovitel DÚR</b>		Pragoprojekt, Amberg, Mott Macdonald				
<b>Cena (bez DPH)</b>		5 589 000 000 Kč				

<b>Stav MPV</b>	Dosud nebylo zahájeno.
<b>Aktuální problém v přípravě</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Územní řízení je přerušeno</b> - chybí pravomocné Rozhodnutí o výjimkách ze zvláště chráněných druhů organismů podle §56 zák. č. 114/1992 Sb.</li> </ul>
<b>Další informace</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usnesením MŽP ze dne 8. 2. 2019 byl k pokračování v řízení a k vydání Rozhodnutí o výjimkách na stavby D3 0301–0303 pověřen Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí z důvodu systémové podjatosti Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství na základě podaných námitek účastníků řízení.</li> <li>Žádost o vydání výjimek podána 3. 7. 2018, na základě velkého množství námitek v řízení několikrát prodlužována lhůta na seznámení účastníků s podklady v řízení.</li> <li>Dne 7. 5. 2019 vydáno Usnesení o přerušení řízení Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem životního prostředí do doby doplnění podkladů.</li> <li>Dne 25. 11. 2021 Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost ve věci první aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, čím definitivně potvrdil platnost aktualizovaných ZÚR a ukončil tak dlouholetý spor o vedení dálnice. Další opravné prostředky již nelze proti koridoru uplatňovat a proto je v rámci krajské dokumentace stabilizovaný. K potvrzení západní varianty došlo v roce 2015 schválením první aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Proti této aktualizaci následně byla podána odpůrci stavby žaloba, kterou Krajský soud v Praze v roce 2018 zamítl. Stěžovatelé (Krajina 2000, spolek pro ochranu přírody dolního Posázaví a obec Okrouhlo) následně podali kasační stížnost k NSS.</li> </ul> <p><b>Aktuální stav řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>D3 0301–0303 Praha–Václavice – oznámení o pokračování řízení a výzva vyjádření se k podkladům – 18. 10. 2019, lhůta pro podání námitek uplynula 20. 11. 2019 =&gt; KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí 18. 5. 2020 – k vydanému rozhodnutí bylo doručeno 11 odvolání (Krajina 2000, Město Jesenice, Děti Země, ČSOP Benešov, Obec Lešany, Obec Krňany, Městys Netvořice, Obec Okrouhlo, Sdružení Miláčov, Věra Červová, Josef Žížala). ). Odvolací řízení ukončeno – dne 5. 11. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1997 Sb. ze dne 18. 5. 2020 a vrátilo věc k novému projednání.</li> <li>Požadované podklady KÚ PK byly ze strany ŘSD ČR doplněny 31. 3. 2021, KÚ PK zahájil správní kroky k vydání nového Rozhodnutí.</li> </ul>
<b>Opatření k urychlení přípravy/výstavby</b>	
<b>Opatření vyžadovaná od ministra/premiéra</b>	



## 0303 Hostěradice–Václavice



EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2012	10/2015	2023	2025	2025	2026	2029

<b>Stav</b>	V přípravě
<b>Délka (m)</b>	11 292
<b>Kategorie</b>	D 27,5/120
<b>Tunely</b>	Hostěradice; Vršky; Krňany (celkem 946 m)
<b>Mosty (dálniční)</b>	11
<b>MÚK</b>	MÚK Václavice, MÚK Dunávice
<b>Zhotovitel DÚR</b>	Pragoprojekt, Amberg, Mott Macdonald
<b>Cena (bez DPH)</b>	7 965 000 000 Kč

### Stav MPV

Dosud nebylo zahájeno.

### Aktuální problém v přípravě

- **Územní řízení je přerušeno** - chybí pravomocné Rozhodnutí o výjimkách ze zvláště chráněných druhů organismů podle §56 zák. č. 114/1992 Sb.

### Další informace


- Usnesením MŽP ze dne 8. 2. 2019 byl k pokračování v řízení a k vydání Rozhodnutí o výjimkách na stavby D3 0301–0303 pověřen Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí z důvodu systémové podjatosti Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství na základě podaných námitek účastníků řízení.
- Žádost o vydání výjimek podána 3. 7. 2018, na základě velkého množství námitek v řízení několikrát prodlužována lhůta na seznámení účastníků s podklady v řízení.
- Dne 7. 5. 2019 vydáno Usnesení o přerušení řízení Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem životního prostředí do doby doplnění podkladů. Dne 9. 11. 2020 oznámil KÚ Plzeňského kraje pokračování řízení a vyzval ŘSD ČR k doplnění podkladů (stanoviska vlastníků dotčených realizací kompenzačních opatření, konkretizaci časové působnosti požadované výjimky, řádovou kvantifikaci počtu jedinců druhů jednotlivých zvláště chráněných druhů živočichů).
- Dne 25. 11. 2021 Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost ve věci první aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, čím definitivně potvrdil platnost aktualizovaných ZÚR a ukončil tak dlouholetý spor o vedení dálnice. Další opravné prostředky již nelze proti koridoru uplatňovat a proto je v rámci krajské dokumentace stabilizovaný. K potvrzení západní varianty došlo v roce 2015 schválením první aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Proti této aktualizaci následně byla podána odpůrci stavby žaloba, kterou Krajský soud v Praze, v roce 2018 zamítl. Stěžovatelé (Krajina 2000, spolek pro ochranu přírody dolního Posázaví a obec Okrouhlo) následně podali kasační stížnost k NSS.

### Aktuální stav řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK:

- D3 0301–0303 Praha–Václavice – oznámení o pokračování řízení a výzva vyjádření se k podkladům – 18. 10. 2019, lhůta pro podání námitek uplynula 20. 11. 2019 => KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí 18. 5. 2020 – k vydanému rozhodnutí bylo doručeno 11 odvolání (Krajina 2000, Město Jesenice, Děti Země, ČSOP Benešov, Obec Lešany, Obec Krňany, Městys Netvořice, Obec Okrouhlo, Sdružení Miláčov, Věra Červová, Josef Žízala). Odvolací řízení ukončeno – dne 5. 11. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1997 Sb. ze dne 18. 5. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 18. 12. 2020 oznámil KÚ Plzeňského kraje pokračování řízení a vyzval ŘSD ČR k doplnění podkladů (stanoviska vlastníků dotčených realizací kompenzačních opatření, konkretizaci časové působnosti požadované výjimky, řádovou kvantifikaci počtu jedinců druhů jednotlivých zvláště chráněných druhů živočichů, zdůvodnění veřejného zájmu Václavické spojky, bližší určení plošné působnosti výjimky).
- Požadované podklady KÚ PK byly ze strany ŘSD ČR doplněny 31. 3. 2021, KÚ PK zahájil správní kroky k vydání nového Rozhodnutí.

### Opatření k urychlení přípravy/výstavby

### Opatření vyžadovaná od ministra/premiéra

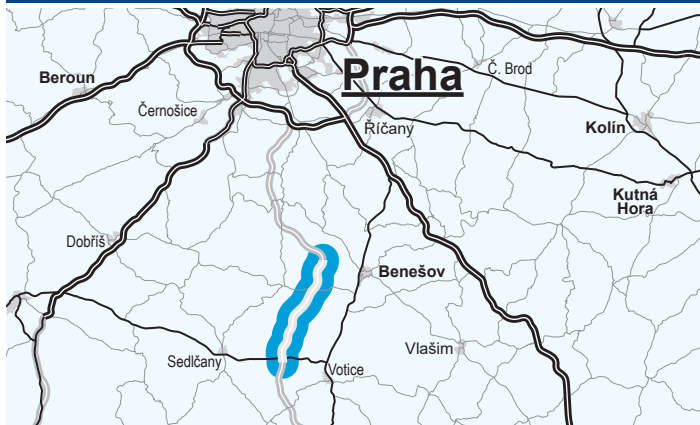

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2012	10/2015	2023	2025	2025	2026	2029

<b>Stav</b>	V přípravě
<b>Délka (m)</b>	16 700
<b>Kategorie</b>	D 27,5/120
<b>Tunely</b>	Prostřední vrch (960 m)
<b>Mosty (dálniční)</b>	12
<b>MÚK</b>	MÚK Voračice, MÚK Neštětice
<b>Zhotovitel TS</b>	SUDOP PRAHA a.s.
<b>Cena (bez DPH)</b>	9 422 000 000 Kč

<b>Stav MPV</b>	Dosud nebylo zahájeno.
<b>Aktuální problém v přípravě</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Probíhá zajišťovací řízení chybějících stanovisek a Rozhodnutí – chybí pravomocné Rozhodnutí o výjimkách ze zvláště chráněných druhů organismů podle §56 zákona č. 114/1992 Sb.</li> </ul>
<b>Další informace</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Žádosti o vydání výjimek podány 1. 12. 2017 a 3. 1. 2018, na základě velkého množství námitek v řízení několikrát prodlužována lhůta na seznámení účastníků s podklady v řízení.</li> <li>• Usnesením MŽP ze dne 8. 2. 2019 byl k pokračování v řízení a k vydání Rozhodnutí o výjimkách na stavbu 0304 pověřen Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí z důvodu systémové podjatosti Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství na základě podaných námitek účastníků řízení.</li> <li>• Dne 13. 5. 2019 vydáno Usnesení o přerušení řízení Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem životního prostředí do doby doplnění podkladů.</li> <li>• Dne 25. 11. 2021 Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost ve věci první aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, čím definitivně potvrdil platnost aktualizovaných ZÚR a ukončil tak dlouholetý spor o vedení dálnice. Další opravné prostředky již nelze proti koridoru uplatňovat a proto je v rámci krajské dokumentace stabilizovaný. K potvrzení západní varianty došlo v roce 2015 schválením první aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Proti této aktualizaci následně byla podána odpůrci stavby žaloba, kterou Krajský soud v Praze, v roce 2018 zamítl. Stěžovatelé (Krajina 2000, spolek pro ochranu přírody dolního Posázaví a obec Okrouhlo) následně podali kasační stížnost k NSS.</li> </ul> <p><b>Aktuální stav řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D3 0304 Václavice–Voračice – oznámení o pokračování řízení a výzva vyjádření se k podkladům – 1. 11. 2019. Lhůta pro podání námitek uplynula 20. 11. 2019 =&gt; KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí 25. 3. 2020. K vydanému rozhodnutí bylo doručeno 9 odvolání (Krajina 2000, Děti Země, Sdružení Miláčov, ČSOP Benešov, Obec Tisem, Městys Maršovice, Ing. Petr Hanzlík, Josef Žížala, Zdeněk Štěpánek). Odvolací řízení ukončeno – dne 10. 9. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1997 Sb. ze dne 20. 3. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 9. 11. 2020 oznámil KÚ Plzeňského kraje pokračování řízení a vyzval ŘSD ČR k doplnění podkladů (stanoviska vlastníků dotčených realizací kompenzačních opatření, konkretizaci časové působnosti požadované výjimky, řádovou kvantifikaci počtu jedinců druhů jednotlivých zvláště chráněných druhů živočichů).</li> <li>• Požadované podklady KÚ PK byly ze strany ŘSD ČR doplněny 31. 5. 2021, KÚ PK zahájil správní kroky k vydání nového Rozhodnutí.</li> </ul>
<b>Opatření k urychlení přípravy/výstavby</b>	
<b>Opatření vyžadovaná od ministra/premiéra</b>	



## 0305/1 Voračice–Nová Hospoda



EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2012	10/2015	2023	2025	2025	2026	2029



<b>Stav</b>	V přípravě
<b>Délka (m)</b>	16 454
<b>Kategorie</b>	D 27,5/120
<b>Mosty (dálniční)</b>	20
<b>MÚK</b>	MÚK Mezno, MÚK Loudilka
<b>Zhotovitel DÚR</b>	VPÚ DECO PRAHA a.s.
<b>Cena (bez DPH)</b>	7 646 000 000 Kč

<b>Stav MPV</b>	Dosud nebylo zahájeno.
<b>Aktuální problém v přípravě</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Probíhá zajišťovací řízení chybějících stanovisek a Rozhodnutí – chybí pravomocné Rozhodnutí o výjimkách ze zvláště chráněných druhů organismů podle §56 zákona č. 114/1992 Sb.</li> </ul>
<b>Další informace</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Žádosti o vydání výjimek podány 1. 12. 2017 a 3. 1. 2018, na základě velkého množství námitek v řízení několikrát prodlužována lhůta na seznámení účastníků s podklady v řízení.</li> <li>Usnesením MŽP ze dne 8. 2. 2019 byl k pokračování v řízení a k vydání Rozhodnutí o výjimkách na stavbu 0305 pověřen Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí z důvodu systémové podjatosti Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství na základě podaných námitek účastníků řízení.</li> <li>Dne 13. 5. 2019 vydáno Usnesení o přerušení řízení Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem životního prostředí na stavbu „D3 0305/1 Voračice – Nová Hospoda“ do doby doplnění podkladů.</li> <li>Dne 25. 11. 2021 Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost ve věci první aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, čím definitivně potvrdil platnost aktualizovaných ZÚR a ukončil tak dlouholetý spor o vedení dálnice. Další opravné prostředky již nelze proti koridoru uplatňovat a proto je v rámci krajské dokumentace stabilizovaný. K potvrzení západní varianty došlo v roce 2015 schválením první aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Proti této aktualizaci následně byla podána odpůrci stavby žaloba, kterou Krajský soud v Praze, v roce 2018 zamítl. Stěžovatelé (Krajina 2000, spolek pro ochranu přírody dolního Posázaví a obec Okrouhlo) následně podali kasační stížnost k NSS.</li> </ul> <p><b>Aktuální stav řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>D3 0305/1 Voračice – Nová Hospoda - oznámení o pokračování řízení a výzva vyjádření se k podkladům – 7. 11. 2019. Lhůta pro podání námitek uplynula 22. 11. 2019 =&gt; KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí 13. 3. 2020. K vydanému Rozhodnutí byla doručena 3 odvolání ((Krajina 2000, Děti Země, Sdružení Miláčov), odvolací řízení ukončeno – dne 1. 9. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1997 Sb. ze dne 13. 3. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 23. 10. 2020 oznámil KÚ Plzeňského kraje pokračování řízení a vyzval ŘSD ČR k doplnění podkladů (stanoviska vlastníků dotčených realizací kompenzačních opatření, konkretizaci časové působnosti požadované výjimky, řádovou kvantifikaci počtu jedinců druhů jednotlivých zvláště chráněných druhů živočichů).</li> <li>Požadované podklady KÚ PK byly ze strany ŘSD ČR doplněny 31. 5. 2021, KÚ PK zahájil správní kroky k vydání nového Rozhodnutí.</li> </ul>
<b>Opatření k urychlení přípravy/výstavby</b>	
<b>Opatření vyžadovaná od ministra/premiéra</b>	



## Dálnice D3

stavba 0301  
Praha – Jílové

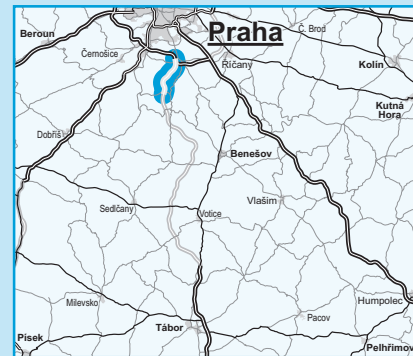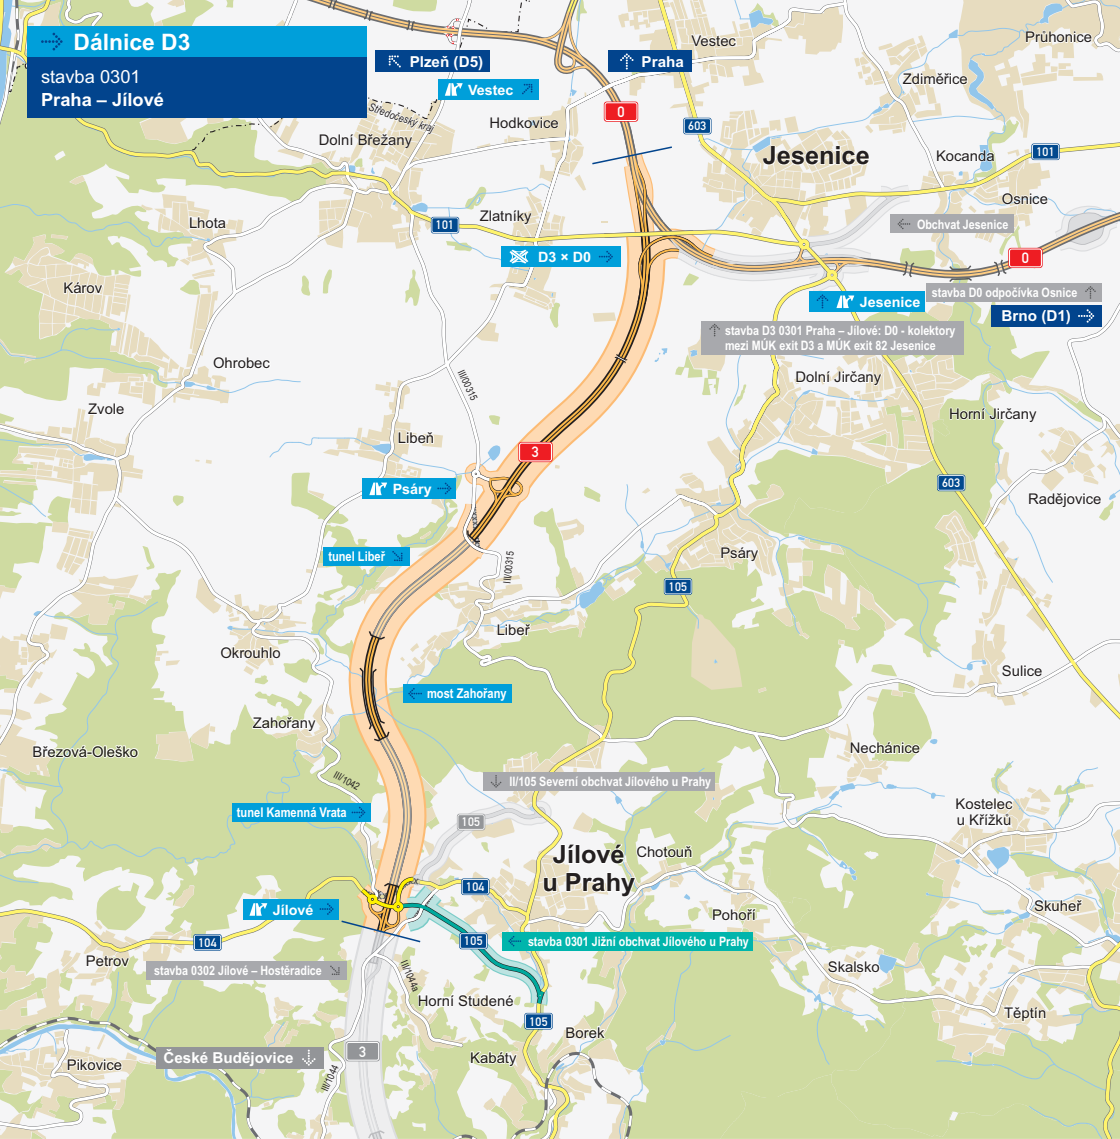

- řešená stavba
- související stavby
- jiné stavby



0 1 2 km

Geografická data poskytl VGHMÚF Dobruška, © MO ČR, 2013

ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## Praha – Jílové

## Dálnice D3

### STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V 07/2015 byla zpracována aktualizace záměru projektu, který byl v říjnu 2015 schválen. V prosinci 2016 byla dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí a probíhá inženýrská činnost související s vydáním ÚR. Dne 31. 10. 2018 byla podána žádost o vydání ÚR.

V další fázi přípravy byly realizovány doplňující hydrogeologické průzkumy pro předběžný GTP (od 01/2019 do 11/2019) a v 11/2021 byl zahájen podrobný geotechnický průzkum pro zpracování dokumentace ve stupni DSP.

Probíhá řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK. KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí o výjimkách 18. 5. 2020. K vydanému rozhodnutí bylo doručeno 11 odvolání.

Dne 5. 11. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí KÚ z 18. 5. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 26. 11. 2019 bylo předloženo Oznámení změny záměru „D3 0301–0303 Praha–Václavice, změny v úseku MÚK Jílové – MÚK Hostěradice“ na MŽP.

Dne 5. 12. 2019 zahájeno zjišťovací řízení (zveřejněno na portálu CENIA). Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 24. 6. 2020. K vydanému závěru zjišťovacího řízení přišly tři rozklady. Dne 21. 1. 2021 bylo vydáno Rozhodnutí o rozkladu MŽP – podané rozklady byly zamítnuty.

### DATA O STAVBĚ

#### Hlavní trasa:

délka: 9514 m  
kategorie: D 27,5/120  
počet stavebních objektů: 255

#### Tunely:

Libeň; Kamenná Vrata  
celková délka: 3207 m

#### Mostní objekty:

na dálnici: 5  
nadjezdy: 2  
na větších křižovatkách: 4  
mosty na účelové komunikaci: 2  
celková délka mostů: 1216 m

#### Mimourovňové křižovatky:

MÚK Jílové, MÚK Psáry, MÚK 3xD0  
celková délka větví: 4954 m

#### Protihlukové stěny:

počet: 5 (celková délka: 2753 m)

#### Zemní valy:

počet: 23

#### Úpravy ostatních komunikací:

silnice II. tříd: 1 (délka: 1002 m)  
silnice III. tříd: 2 (délka: 812 m)  
místní komunikace: 1 (délka: 180 m)  
účelové komun.: 9 (délka: 4301 m)  
přístupové kom.: 9 (délka: 11 400 m)  
polní cesty: 3 (délka: 522 m)

#### Přeložky a úpravy inž. sítí:

vodohospodářské objekty: 28  
objekty elektro: 11  
přeložky plynovodu: 1

#### Celkový objem zemních prací:

výkopy: 3 060 900 m<sup>3</sup>  
náspy: 3 755 500 m<sup>3</sup>

#### Název stavby:

Dálnice D3 0301 Praha – Jílové

#### Místo stavby:

Středočeský kraj

#### Katastrální území:

Hodkovice u Zlatníků, Jesenice u Prahy, Zlatníky u Prahy, Dolní

Jirčany, Psáry, Libeň u Libeře, Libeň, Okrouhlo, Jílové u Pr., Petrov u Prahy

#### Druh stavby:

novostavba

#### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

#### Zpracovatel DÚR:



Pragoprojekt/Amberg/MottMac-

Donald D3 0301–0303 (vedoucí

účastník sdružení Pragoprojekt)

#### Předpokládané náklady stavby:

8 462 000 000 Kč (bez DPH)

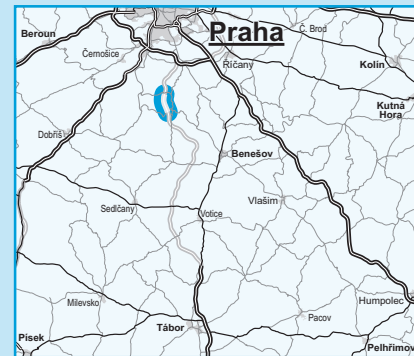

řešená stavba  
jiné stavby



0 1 2 km

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2013

ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## Jílové – Hostěradice

Dálnice **D3**

### STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V červenci 2015 byla zpracována aktualizace záměru projektu, který byl v říjnu 2015 schválen. V prosinci 2016 byla dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí a probíhá inženýrská činnost související s vydáním rozhodnutí o umístění stavby. Dne 31. 10. 2018 byla podána žádost o vydání ÚR.

V další fázi přípravy jsou realizovány doplňující hydrogeologické průzkumy pro předběžný GTP (od 01/2019 do 11/2019) a v 11/2021 byl zahájen podrobný geotechnický průzkum pro zpracování dokumentace ve stupni DSP. Probíhá řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK. KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí o výjimkách 18. 5. 2020. K vydanému rozhodnutí bylo doručeno 11 odvolání. Dne 5. 11. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí KÚ z 18. 5. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 18. 12. 2020 oznámil KÚ Plzeňského kraje pokračování řízení a vyzval ŘSD ČR k doplnění podkladů. Požadované podklady KÚ PK byly ze strany ŘSD ČR doplněny 31. 3. 2021, KÚ PK zahájil správní kroky k vydání nového Rozhodnutí. Dne 26. 11. 2019 bylo předloženo Oznámení změny záměru „D3 0301–0303 Praha–Václavice, změny v úseku MÚK Jílové – MÚK Hostěradice“ na MŽP. Dne 5. 12. 2019 bylo zahájeno zjišťovací řízení (na portálu CENIA). K vydání závěru zjišťovacího řízení došlo 24. 6. 2020. K vydanému závěru zjišťovacího řízení přišly tři rozklady. Dne 21. 1. 2021 bylo vydáno Rozhodnutí o rozkladu MŽP – podané rozklady byly zamítnuty.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2012	10/2015	2023	2025	2025	2026	2029

**Význam zkratk:** EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

Dne 5. 11. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí KÚ z 18. 5. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 18. 12. 2020 oznámil KÚ Plzeňského kraje pokračování řízení a vyzval ŘSD ČR k doplnění podkladů. Požadované podklady KÚ PK byly ze strany ŘSD ČR doplněny 31. 3. 2021, KÚ PK zahájil správní kroky k vydání nového Rozhodnutí. Dne 26. 11. 2019 bylo předloženo Oznámení změny záměru „D3 0301–0303 Praha–Václavice, změny v úseku MÚK Jílové – MÚK Hostěradice“ na MŽP. Dne 5. 12. 2019 bylo zahájeno zjišťovací řízení (na portálu CENIA). K vydání závěru zjišťovacího řízení došlo 24. 6. 2020. K vydanému závěru zjišťovacího řízení přišly tři rozklady. Dne 21. 1. 2021 bylo vydáno Rozhodnutí o rozkladu MŽP – podané rozklady byly zamítnuty.

### DATA O STAVBĚ

#### Hlavní trasa:

délka: 4486 m

kategorie: D 27,5/120

počet všech stavebních objektů: 139

#### Tunely:

Luka (délka: 1843 m)

#### Mostní objekty:

na dálnici: 3, nadjezdy: 2

na přeložce II/106: 1

lávka pro pěší: 1

celková délka mostů: 1261 m

#### Mimoúrovňové křižovatky:

MÚK Hostěradice (délka větví: 927 m)

#### Protihlukové stěny:

počet: 4 (celková délka: 2310 m)

#### Zemní valy:

počet: 3

#### Úpravy ostatních komunikací:

silnice II. tříd: 1 (1696 m)

silnice III. tříd: 2 (700 m)

místní komunikace: 2 (441 m)

účel. a příst. komun.: 11 (6940 m)

#### Přeložky a úpravy inž. sítí:

vodohospodářské objekty: 16

objekty elektro: 15

přeložky plynovodu: 1

#### Celkový objem zemních prací:

výkopy: 1 268 100 m<sup>3</sup>

násypy: 453 200 m<sup>3</sup>

#### Název stavby:

Dálnice D3 0302 Jílové–Hostěradice

#### Místo stavby:

Středočeský kraj

#### Katastrální území:

Jílové u Prahy, Petrov u Prahy, Luka

pod Medníkem, Hostěradice

#### Druh stavby:

novostavba

#### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR





#### Zpracovatel DÚR:

Pragoprojekt/Amberg/Mott MacDonald

D3 0301–0303 (vedoucí účastník sdružení Pragoprojekt)

#### Předpokládané náklady stavby:

5 589 000 000 Kč (bez DPH)

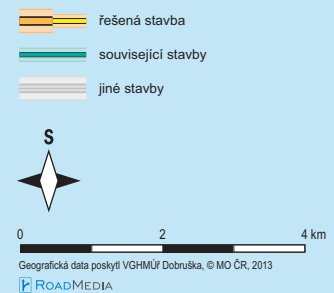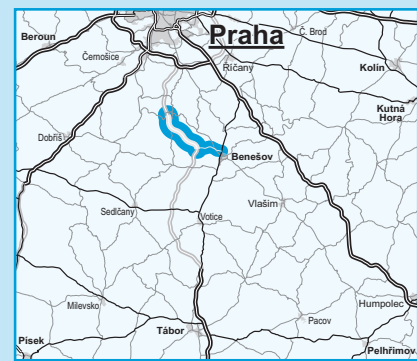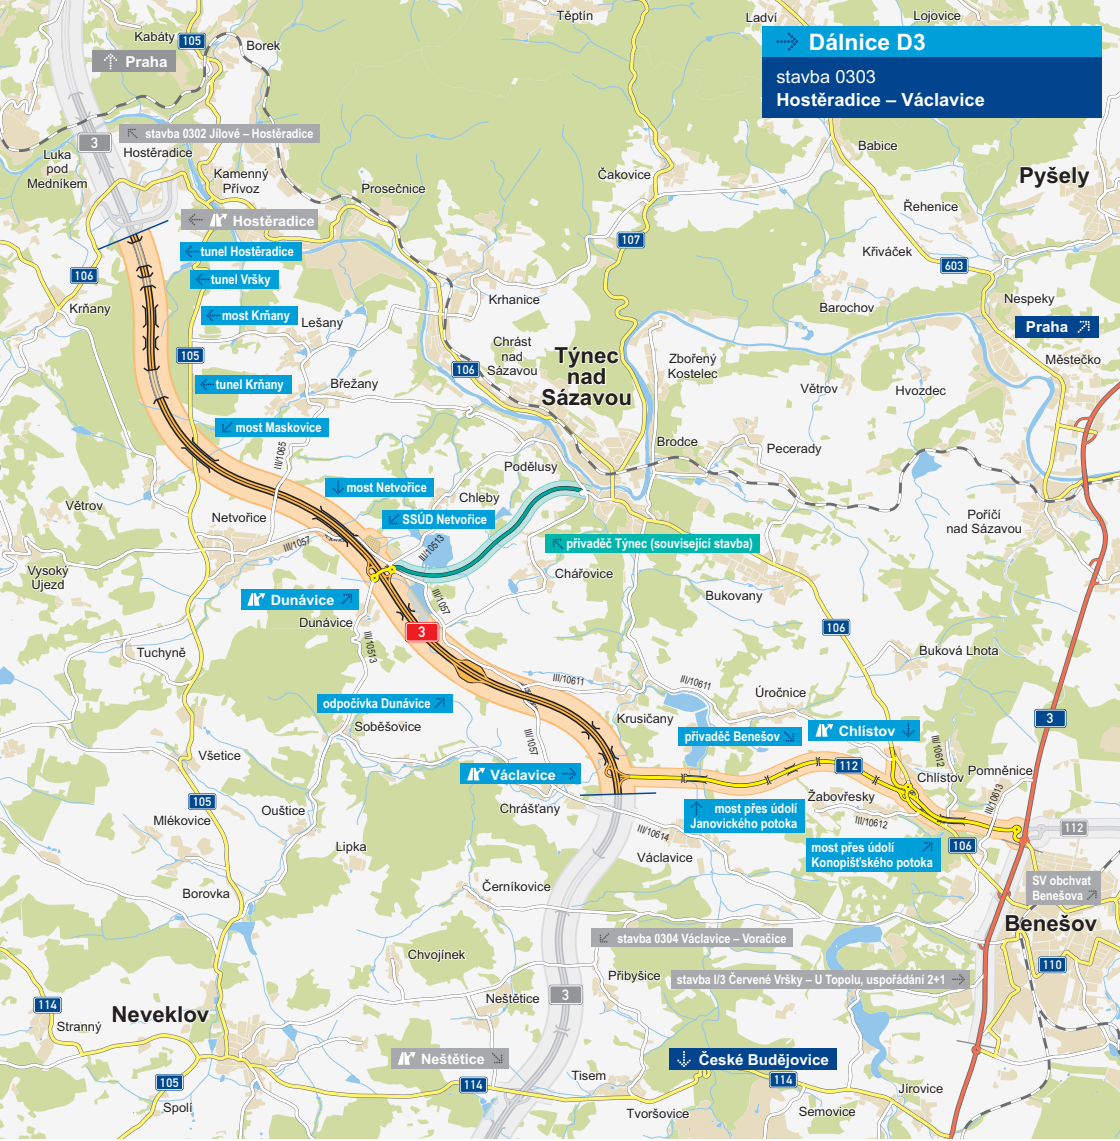

## Hostěradice – Václavice

## Dálnice D3

### STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V 07/2015 byla zpracována aktualizace záměru projektu, který byl v 10/2015 schválen. V 12/2016 byla dokončena DÚR a probíhá inženýrská činnost související s vydáním rozhodnutí o umístění stavby. Dne 31. 10. 2018 byla podána žádost o vydání ÚR. V další fázi přípravy byly realizovány doplňující hydrogeologické průzkumy pro předběžný GTP (od 01/2019 do 11/2019) a v 11/2021 byl zahájen podrobný GT průzkum pro zpracování dokumentace ve stupni DSP. Probíhá řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK. KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí o výjimkách 18. 5. 2020. K vydanému rozhodnutí bylo doručeno 11 odvolání. Dne 5. 11. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí KÚ z 18. 5. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 18. 12. 2020 oznámil KÚ PK pokračování řízení a vyzval ŘSD ČR k doplnění podkladů (splněno 31. 3. 2021). Dne 26. 11. 2019 bylo předloženo Oznámení změny záměru „D3 0301–0303 Praha–Václavice, změny v úseku MÚK Jílové – MÚK Hostěradice“ na MŽP. Dne 5. 12. 2020 bylo zahájeno zjišťovací řízení (zveřejněno na portálu CENIA). Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 24. 6. 2020. K vydanému závěru zjišťovacího řízení přišly tři rozklady. Dne 21. 1. 2021 bylo vydáno Rozhodnutí o rozkladu MŽP – podané rozklady byly zamítnuty.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2012	10/2015	2023	2025	2025	2026	2029

**Význam zkratk:** EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

### DATA O STAVBĚ

**Hlavní trasa:**  
 délka: 11 292 m  
 kategorie: D 27,5/120  
 počet všech stavebních objektů: 378  
**Tunely:**  
 Hostěradice; Vršky; Krňany  
 celková délka tunelů: 946 m  
**Mostní objekty:**  
 na dálnici: 11  
 nad dálnicí: 2  
 na přivaděči: 5  
 nadjezdy na přivaděči: 4  
 na přeložkách: 2  
 celková délka mostů: 2739 m




**Mimoúrovňové křižovatky:**  
 MÚK Václavice, MÚK Dunávice  
 na přivaděči: MÚK Chlístov  
 celková délka větví: 3115 m  
**Protihlukové stěny:**  
 počet: 13 (celková délka: 5584 m)  
**Zemní valy:**  
 počet: 16  
**Úpravy ostatních komunikací:**  
 přivaděč Benešov: S 9,5/80, 5800 m  
 silnice II. tříd: 1 (1452 m)  
 silnice III. tříd: 7 (2686 m)  
 místní komunikace: 5 (1661 m)  
 účel. a přístup. kom.: 24 (19 436 m)  
 polní a lesní cesty: 16 (3725 m)

**Odbočivky:**  
 Dunávice (oboustranná)  
**Přeložky a úpravy inž. sítí:**  
 vodohospodářské objekty: 64  
 objekty elektro: 41  
 přeložky plynovodu: 4  
**Celkový objem zemních prací:**  
 výkopy: 1 919 400 m<sup>3</sup>  
 násypy: 2 040 900 m<sup>3</sup>  
**Název stavby:**  
 D3 0303 Hostěradice–Václavice  
**Místo stavby:**  
 Střeadočeský kraj  
**Katastrální území:**  
 Hostěradice, Lešany nad Sázavou,

Břežany u Lešan, Maskovice, Netvořice, Dunávice, Chářovice, Krusičany, Václavice u Benešova, Chrástky u Benešova  
**Druh stavby:**  
 novostavba  
**Objednatel:**  
 Ředitelství silnic a dálnic ČR  
**Zpracovatel DÚR:**  
 Pragoprojekt/Amberg/Mott MacDonald D3 0301–0303 (vedoucí účastník sdružení Pragoprojekt)  
**Předpokládané náklady stavby:**  
 6 782 000 000 Kč (bez DPH)

## Dálnice D3

stavba 0304  
Václavice – Voračice

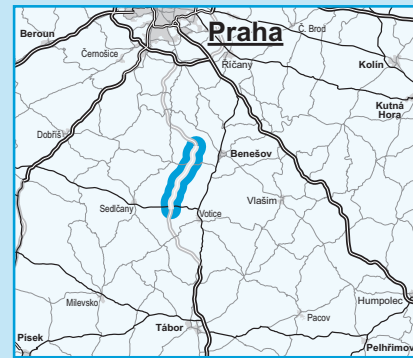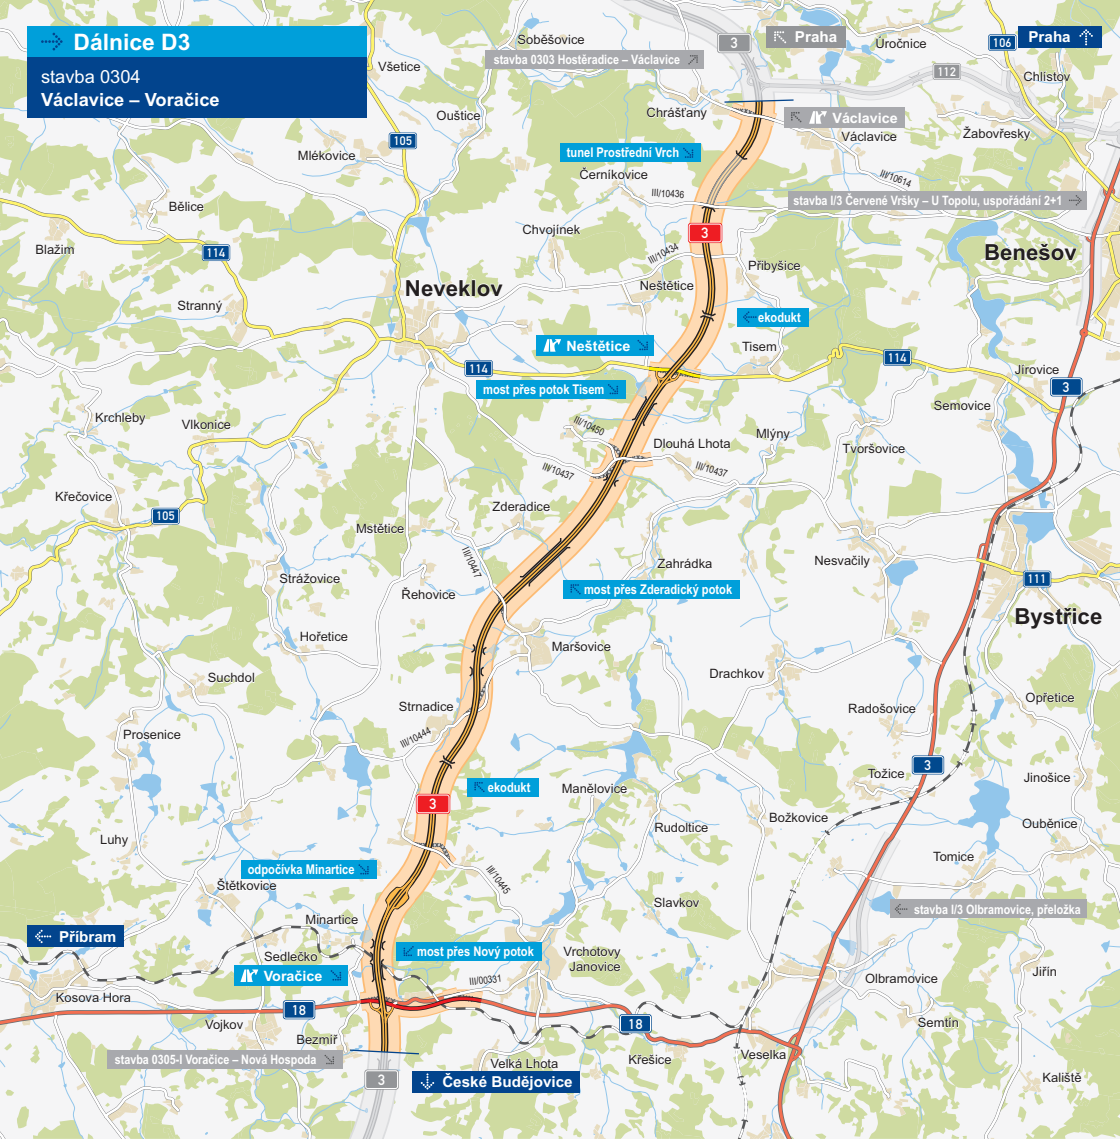

řešená stavba  
jiné stavby



0 2 4 km

Geografická data poskytl VGHMÚF Dobruška, © MO ČR, 2013

ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## Václavice – Voračice

Dálnice **D3**

### STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V 07/2015 byla zpracována aktualizace záměru projektu, který byl v 10/2015 schválen. V 01/2017 byla dokončena DÚR a byla inženýrská činnost související s vydáním rozhodnutí o umístění stavby. Dne 31. 10. 2018 byla podána žádost o vydání ÚR. Výzva k doplnění podkladů vydána 25. 11. 2019, termín pro doplnění podkladů k územnímu řízení stanoven do 30. 6. 2021. V další fázi přípravy byly realizovány doplňující hydrogeologické průzkumy pro předběžný GTP (od 01/2019 do 11/2019) a v 11/2021 byl zahájen podrobný geotechnický průzkum pro zpracování dokumentace ve stupni DSP. Probíhá řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK. KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí o výjimkách 13. 3. 2020. K vydanému Rozhodnutí bylo doručeno devět odvolání. Odvolací řízení bylo ukončeno. Dne 1. 9. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1997 Sb. ze dne 20. 3. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 9. 11. 2020 oznámil KÚ PK pokračování řízení a vyzval ŘSD k doplnění podkladů. Požadované podklady KÚ PK byly ze strany ŘSD doplněny 31. 5. 2021, KÚ PK zahájil správní kroky k vydání nového Rozhodnutí.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2012	10/2015	2023	2025	2025	2026	2029

**Význam zkratk:** EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

### DATA O STAVBĚ

#### Hlavní trasa:

délka: 16 700 m  
kategorie: D 27,5/120  
počet všech stavebních objektů: 273

#### Tunely:

Prostřední vrch (960 m)

#### Mostní objekty:

na dálnici: 12  
na dálnici: 5  
na silnici I/18: 2  
ekodukty: 2  
celková délka mostů: 2351 m

#### Mimoúrovňové křižovatky:

MÚK Voračice, MÚK Neštětice  
celková délka větví: 2300 m

#### Odpočívky:

Minartice (oboustranná)  
**Protihlukové stěny**  
počet: 6 (celková délka: 2864 m)

#### Zemní valy:

počet: 6  
**Úpravy ostatních komunikací:**  
silnice I. tříd: 1 (2033 m)  
silnice II. tříd: 1 (783 m)  
silnice III. tříd: 10 (5211 m)  
účelové komun.: 6 (1318 m)  
polní/lesní cesty: 23 (17 916 m)

#### Přeložky a úpravy inž. sítí:

vodohospodářské objekty: 63  
objekty elektro: 24

#### Celkový objem zemních prací:

výkopy: 4 500 400 m<sup>3</sup>  
náspy: 2 000 000 m<sup>3</sup>

#### Název stavby:

Dálnice D3 0304 Václavice–Voračice

#### Místo stavby:

Středočeský kraj  
**Katastrální území:**  
Chrástany u Benešova, Václavice u Benešova, Příbyšice, Tísem, Neštětice, Zahrádka u Benešova, Zderadice, Maršovice u Benešova, Strnadice, Šebáňovice, Vrchotovy Janovice, Minartice, Bezmíř

#### Druh stavby:

novostavba

#### Objednatel:




Ředitelství silnic a dálnic ČR

#### Zpracovatel DÚR:

Sdružení SUDOP Group, vedoucí účastník sdružení SUDOP a.s.

#### Předpokládané náklady stavby:

9 422 000 000 Kč (bez DPH)

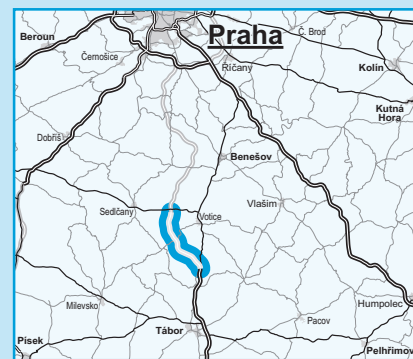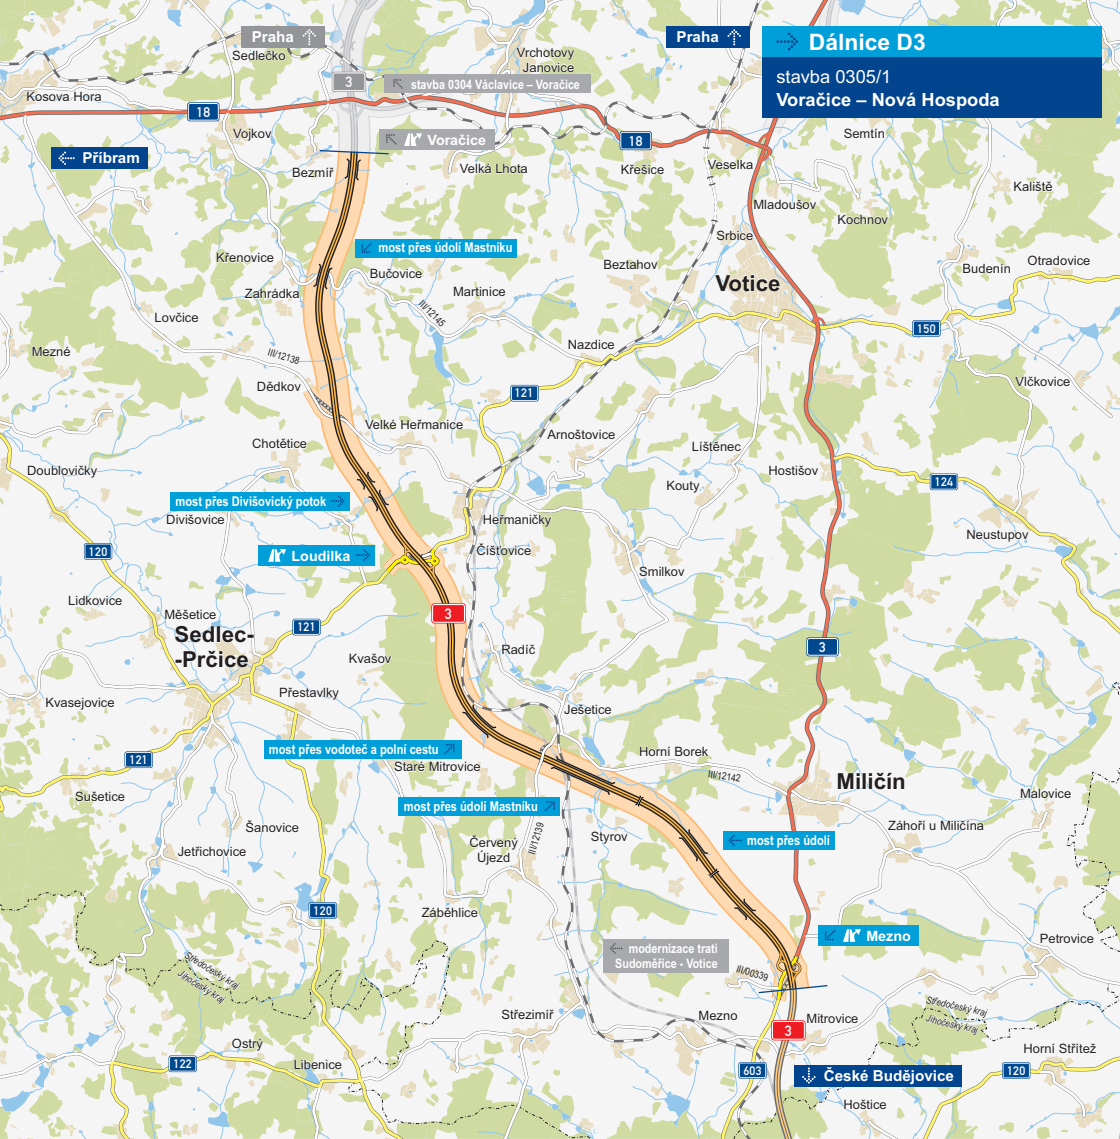

řešená stavba  
jiné stavby



0 2 4 km

Geografická data poskytl VGHMÚF Dobruška, © MO ČR, 2013

ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## Voračice – Nová Hospoda

Dálnice **D3**

### STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V červenci 2015 byla zpracována aktualizace záměru projektu, který byl v říjnu 2015 schválen. V lednu 2017 bude dokončena DÚR a byla zahájena inženýrská činnost související s vydáním rozhodnutí o umístění stavby. Dne 31. 10. 2018 byla podána žádost o vydání ÚR. Územní řízení přerušeno do doby doplnění podkladů.

V další fázi přípravy byly realizovány doplňující hydrogeologické průzkumy pro předběžný GTP (od 01/2019 do 11/2019) a v 11/2021 byl zahájen podrobný geotechnický průzkum pro zpracování dokumentace ve stupni DSP.

Probíhá řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK. KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí dne 13. 3. 2020. K vydanému Rozhodnutí byla doručena tři odvolání. V odvolacím řízení dne 1. 9. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1997 Sb. ze dne 13. 3. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 23. 10. 2020 oznámil KÚ Plzeňského kraje pokračování řízení a vyzval ŘSD ČR k doplnění podkladů. Požadované podklady KÚ PK byly ze strany ŘSD ČR doplněny 31. 5. 2021, KÚ PK zahájil správní kroky k vydání nového Rozhodnutí.

### DATA O STAVBĚ

#### Hlavní trasa:

délka: 16 454 m  
kategorie: D 27,5/120  
počet všech stavebních objektů: 226

#### Mostní objekty:

na dálnici: 20, nad dálnicí: 3  
celková délka mostů: 3543 m

#### Mimoúrovňové křižovatky:

MÚK Mezno, MÚK Loudilka  
celková délka větví: 2508 m

#### Protihlukové stěny:

počet: 9 (celková délka: 3594 m)

#### Opěrné zdi:

počet: 1 (délka: 24 m)

#### Zemní valy:

počet: 8 (celková délka: 3044 m)

#### Úpravy ostatních komunikací:

silnice I. tříd: 1 (1268 m)  
silnice II. tříd: 1 (821 m)  
silnice III. tříd: 2 (1239 m)  
místní a účel. kom.: 4 (1638 m)  
polní cesty: 21 (10 807 m)  
přjezd k RN: 10 (1491 m)

#### Přeložky a úpravy inž. sítí:

vodohospodářské objekty: 57  
objekty elektro: 22  
přeložky plynovodu: 3

EIA

ZP

UR

SP

VŘ

ZS

UP

02/2012

10/2015

2023

2025

2025

2026

2029

**Význam zkratk:** EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

#### Název stavby:

Dálnice D3 0305/1 Voračice – Nová Hospoda

#### Místo stavby:

Středočeský kraj

#### Katastrální území:

Bezmří, Martinice u Votic, Velké Heřmanice, Divišovice, Heřmaničky, Prčice, Ješetice, Červený Újezd u Miličína, Horní Borek, Miličín, Lažany u Mezno, Mitrovice

#### Druh stavby:

novostavba

#### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

#### Zpracovatel DÚR:



Sdružení SUDOP Group, vedoucí účastník sdružení SUDOP a.s.

#### Předpokládané náklady stavby:

7 646 000 000 Kč (bez DPH)

## Dálnice D3

stavba 0301  
Jižní obchvat Jílového u Prahy

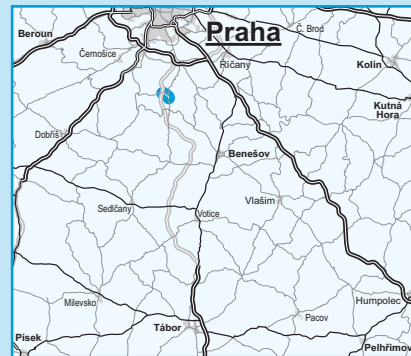

řešená stavba  
jiné stavby



0 250 500 m

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2015

ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## Jižní obchvat Jílového u Prahy

Dálnice **D3**

### STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Na stavbu je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Probíhá inženýrská činnost pro získání ÚR. K podání žádosti o vydání ÚR došlo 31. 3. 2021. U výjimek ze zvláště chráněných druhů organismů (podle §56 zákona č. 114/1992 Sb.) bylo dne 22. 1. 2020 vydáno nepravomocné Rozhodnutí. Proti vydanému Rozhodnutí byla podána dvě odvolání. Dne 4. 8. 2020 bylo MŽP potvrzeno vydané Rozhodnutí a nabylo právní moci. Dne 26. 10. 2020 ale bylo doručeno podání žaloby na vydané Rozhodnutí spolkem Krajina 2000. V 11/2021 byl zahájen podrobný geotechnický průzkum pro zpracování dokumentace ve stupni DSP.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
-	-	2023	2025	2025	2026	2029

**Význam zkratk:** EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

### DATA O STAVBĚ

#### Hlavní trasa:

délka: 1974 m  
kategorie: S 7,5/50  
počet všech stavebních objektů: 23

#### Mostní objekty:

počet: 2  
celková délka mostů: 69 m

#### Úrovnňové křižovatky:

okružní: 1  
průsečné: 1

#### Úpravy ostatních komunikací:

úprava ulice Nádražní: 1 (délka: 40 m)  
provizorní komunikace: 1  
přístupové cesty: 3 (délka: 1000 m)

#### Přeložky a úpravy inž. sítí:

vodohospodářské objekty: 2  
objekty elektro: 8

#### Demolice:

počet objektů: 2

#### Název stavby:

D3 0301 Jižní obchvat Jílového u Prahy

#### Místo stavby:

Středočeský kraj

#### Katastrální území:

Jílové u Prahy

#### Druh stavby:

novostavba

#### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

#### Zpracovatel DÚR:



Mott McDonald CZ, spol. s r.o.

#### Předpokládaná cena stavby:

226 000 000 Kč (bez DPH)

## Dálnice D3

stavba 0303  
Přivaděč Týnec n. S.

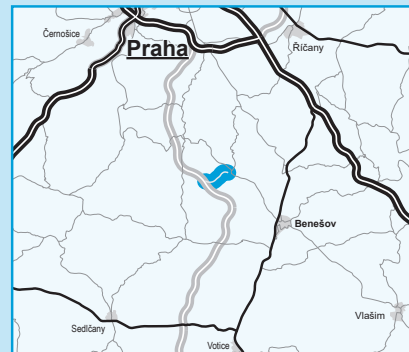

řešená stavba  
jiné stavby



0 0,5 1 km

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2015

ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## Přivaděč Týnec nad Sázavou

Dálnice **D3**

### STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Na stavbu je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Dne 31. 10. 2018 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. V 11/2021 byl zahájen podrobný geotechnický průzkum pro zpracování dokumentace ve stupni DSP.

Probíhá řízení o výjimkách podle § 56 ZOPK. KÚ Plzeňského kraje vydal Rozhodnutí o výjimkách dne 2. 4. 2020. K vydanému Rozhodnutí doručena tři odvolání. V odvolacím řízení dne 28. 8. 2020 doručeno Rozhodnutí MŽP, které zrušilo Rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů dle §56 zákona č. 114/1997 Sb. ze dne 2. 4. 2020 a vrátilo věc k novému projednání. Dne 15. 10. 2020 oznámil KÚ Plzeňského kraje pokračování řízení a vyzval ŘSD ČR k doplnění podkladů (stanoviska vlastníků dotčených realizací kompenzačních opatření, odůvodnění veřejného zájmu, řádovou kvantifikaci počtu jedinců druhů jednotlivých zvláště chráněných druhů živočichů). Dne 21. 12. 2021 bylo vydáno nové Rozhodnutí.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
-	-	2023	2025	2025	2026	2029

**Význam zkratk:** EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

### DATA O STAVBĚ

#### Hlavní trasa:

délka: 3240 m  
kategorie: S 7,5/50

#### Mostní objekty:

počet: 1

#### Úrovnňové křižovatky:

stykové: 2

#### Zemní valy:

počet: 3 (celková délka: cca 480 m)

#### Demolice:

počet objektů: 10

#### Celkový objem zemních prací:

výkopy: 110 500 m<sup>3</sup>  
násypy: 64 900 m<sup>3</sup>

#### Název stavby:

D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou

#### Místo stavby:

Středočeský kraj

#### Katastrální území:

Dunávice, Chleby u Týnce n. Sázavou, Chářovice, Podělusy, Týnec n. Sázavou

#### Druh stavby:

novostavba

#### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

#### Zpracovatel DÚR:

Pragoprojekt a.s.

#### Předpokládaná cena stavby:

203 000 000 Kč (bez DPH)



**ŘEDITELSTVÍ  
SILNIC A DÁLNIC ČR**
