

přehled staveb **ŘSD**



Silnice I/38

Stav k 06/2020


Znojmo obchvat a Znojmo–Hatě

Klíčová data

Silnice	Název stavby	Délka (km)	Zahájení	Zprovoznění	Cena (Kč)
I/38	Znojmo, obchvat II	3,4	07/2016	10/2019	264 185 000
I/38	Znojmo, obchvat I, II. etapa	1,7		2008**	
I/38	Znojmo, obchvat I, I. etapa	0,8	10/2021	10/2023	303 473 422*
I/38	Znojmo, obchvat IV	1,3	2023	2028	293 804 654*
I/38	Znojmo, obchvat III	4,3	2025	2029	1 433 600 000*
I/38	Znojmo–Hatě	5,9	2027	2029	915 000 000*
Celkem km / Kč		17,4			3 210 063 076


* Předpokládaná cena

** Dokončený úsek – nebude využit dokud nebude realizována I. etapa

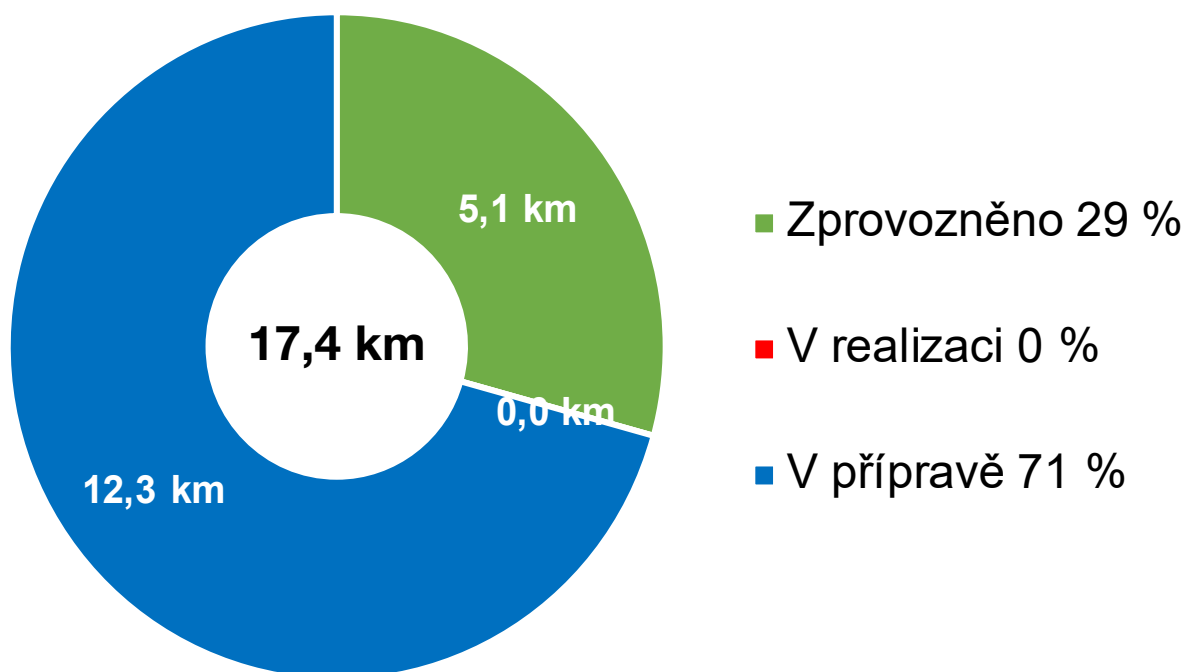


Silnice I/38

úseky Znojmo obchvat a Znojmo – Hatě

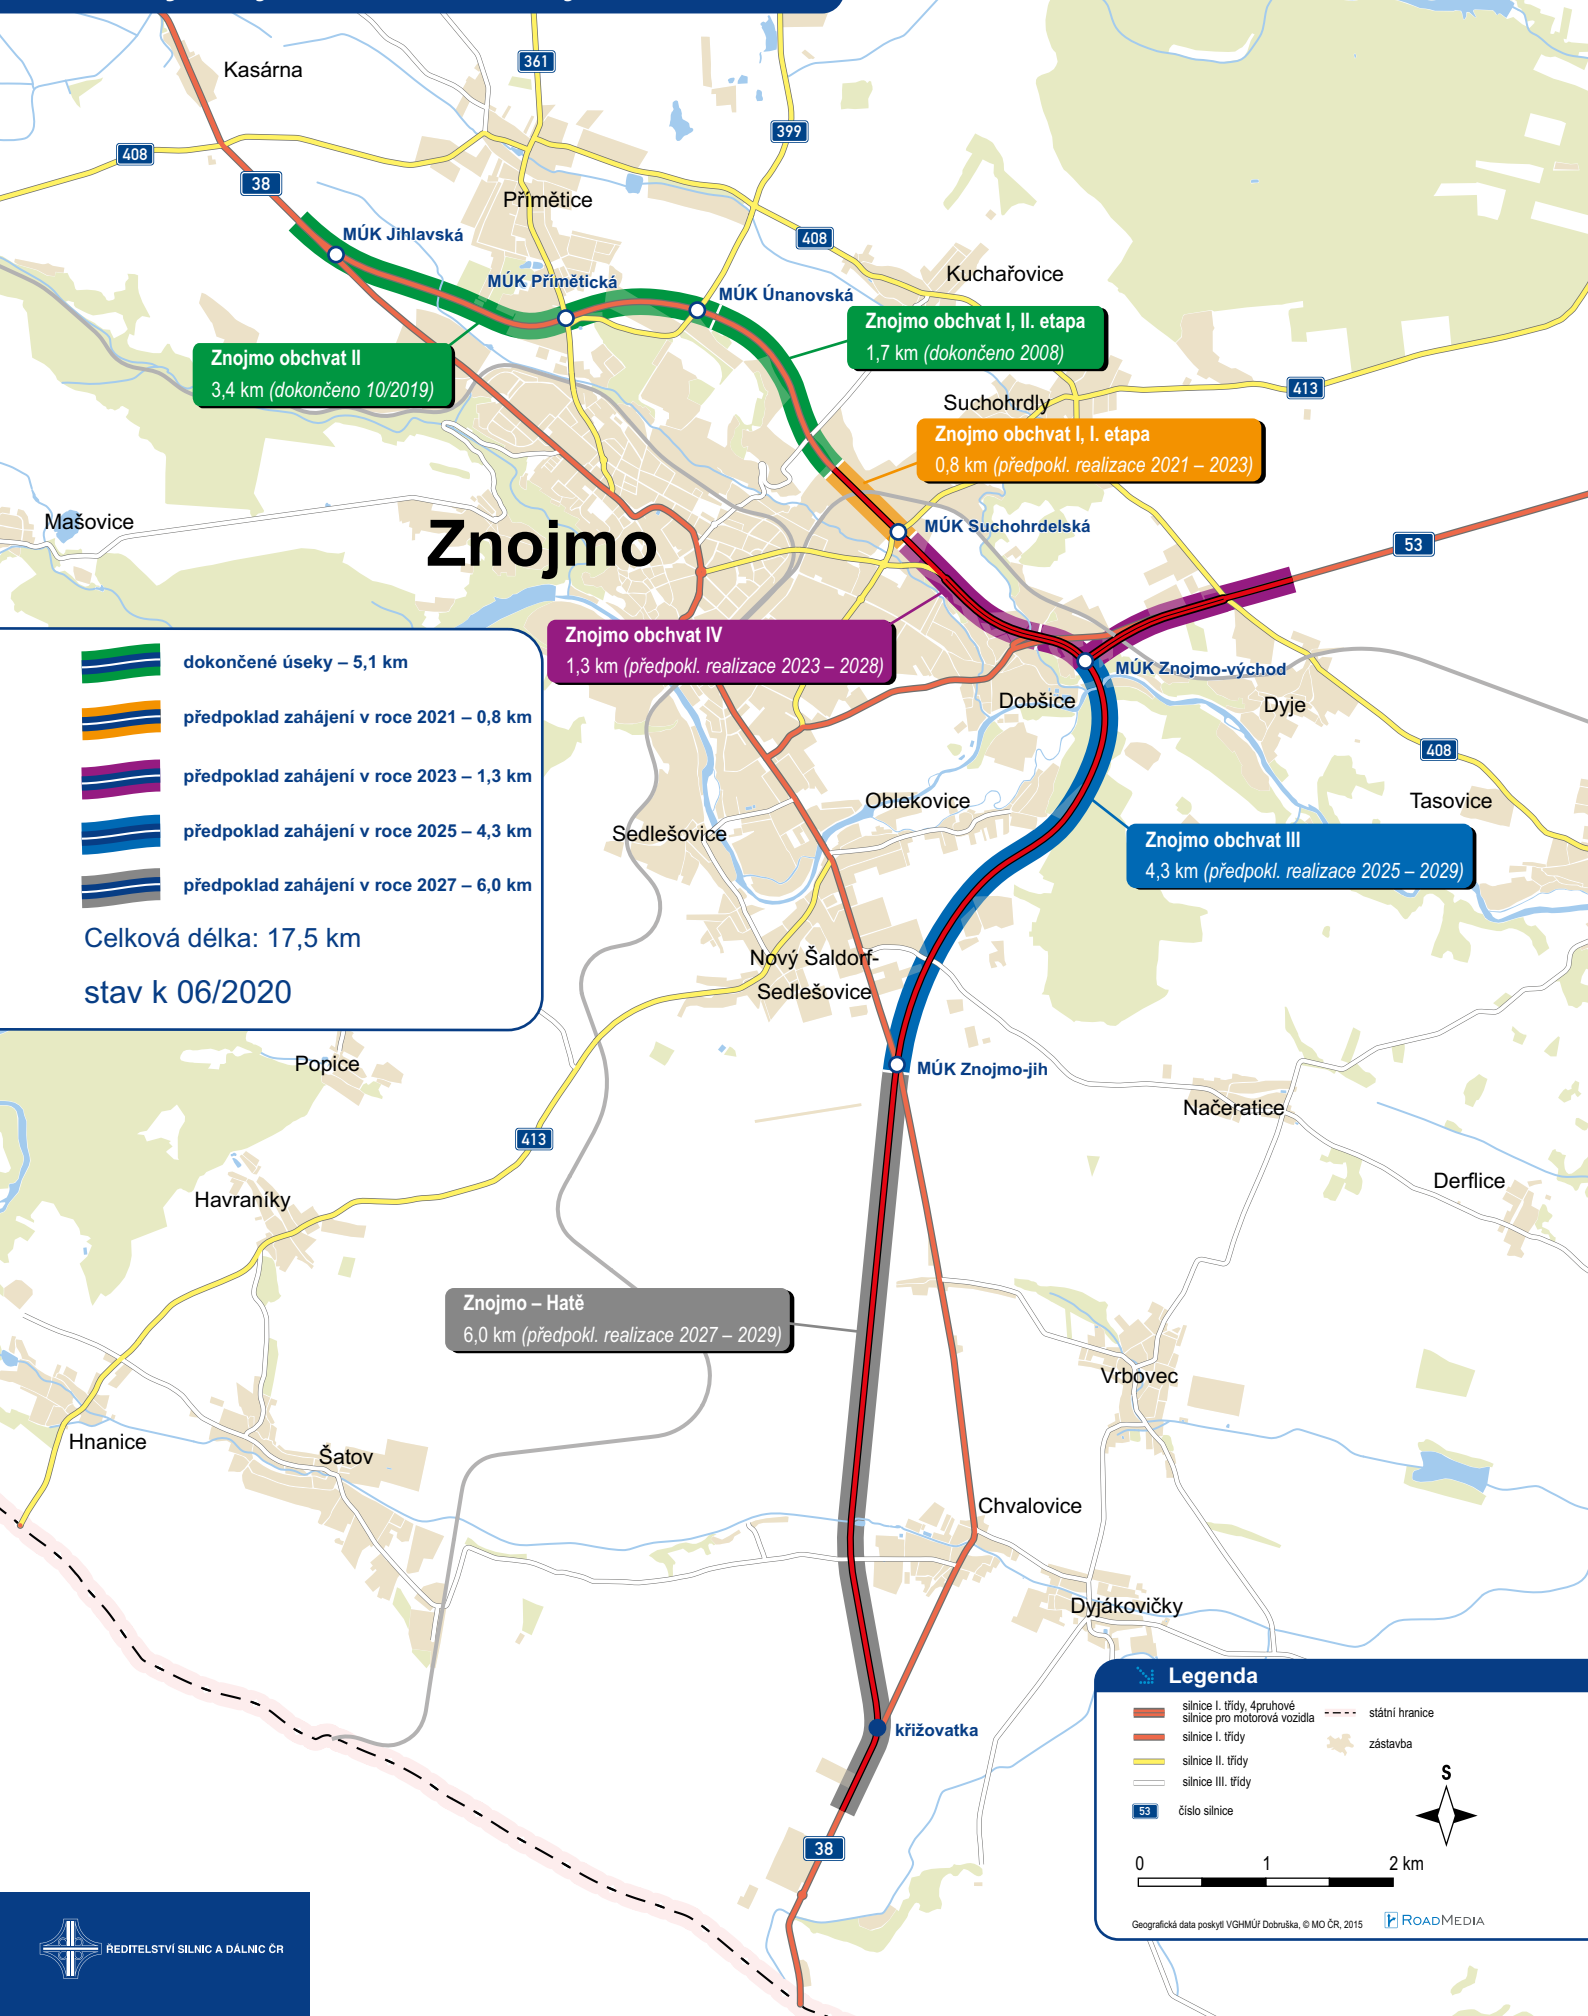



I/38 Znojmo, obchvat I, I. etapa

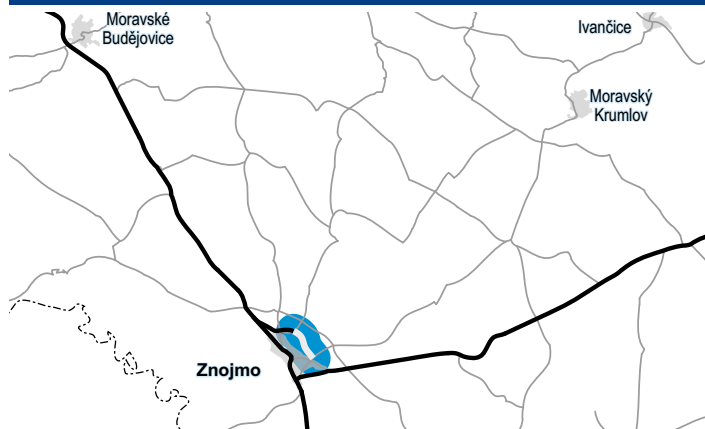

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
08/2011	09/2004	I. ET. 06/2020 II. ET. 04/2012	2020 11/2006	2021 10/2006	2021 12/2006	2023

Stav	V přípravě
Délka (m)	765
Kategorie	S 11,5/80
Mosty (silniční)	2
MÚK	MÚK Suchohrdelská
Zhotovitel DSP	Silniční projekt spol. s r.o.
Cena (bez DPH)	303 473 422 Kč

Stav MPV

Zbývá vykoupit jeden pozemek

Aktuální problém v přípravě

V návaznosti na oznámení o pokračování územního řízení byla občanským sdružením a dalšími opakovaně podána námítka na systémovou podjatost všech relevantních pracovníků MÚ Znojmo, což přípravu dále zdrželo. V 06/2020 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby. Lze očekávat odvolání ze strany odpůrců obchvatu.


Další informace

- Stavba byla zahájena již v roce 2006, doposud však není dokončena její první etapa kvůli nedorozuměním sporům s občanským sdružením. Výsledkem je rozpracovaný obchvat, kde zbývá dokončit 765 metrů dlouhý úsek silnice, který by jej napojil do stávající silniční sítě.
- Probíhá zpracování DSP a IČ pro SP, je vyhotoven podrobný GTP.

Opatření k urychlení přípravy/výstavby

Opatření vyžadovaná od PMD nebo PP

I/38 Znojmo, obchvat IV

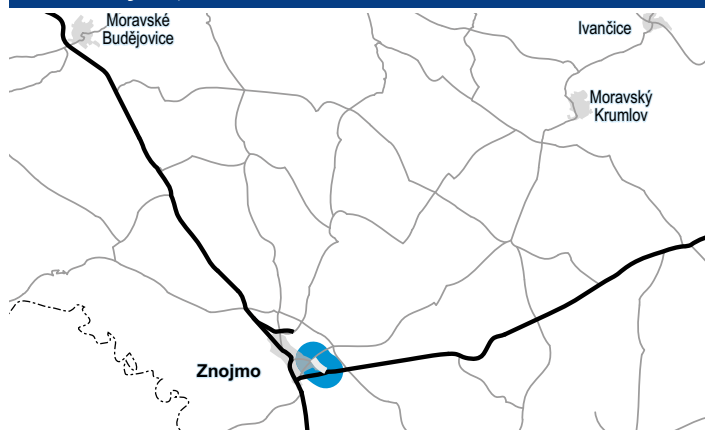

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
–	07/2017	2022	2023	2023	2023	2028

Stav	V přípravě
Délka (m)	1345
Kategorie	S 11,5/80
Mosty (silniční)	1
MÚK	MÚK Suchohrdelská
Zhotovitel TS	PK OSSENDORF spol. s r.o.
Cena (bez DPH)	293 804 654 Kč

Stav MPV

Dosud nebylo zahájeno.

Aktuální problém v přípravě

Stavební záměr bude znovu podán na zjišťovací řízení, dle rozhodnutí MŽP se jedná o stavbu podléhající zjišťovacímu řízení.


Další informace

- Byl dokončen záměr projektu, který byl v 07/2017 schválen bez připomínek Centrální komisí Ministerstva dopravy.
- Po ukončení zjišťovacího řízení bude následovat výběrové řízení na zpracovatele DÚR a na inženýrskou činnost související s vydáním územního rozhodnutí.

Opatření k urychlení přípravy/výstavby

Opatření vyžadovaná od PMD nebo PP

I/38 Znojmo, obchvat III

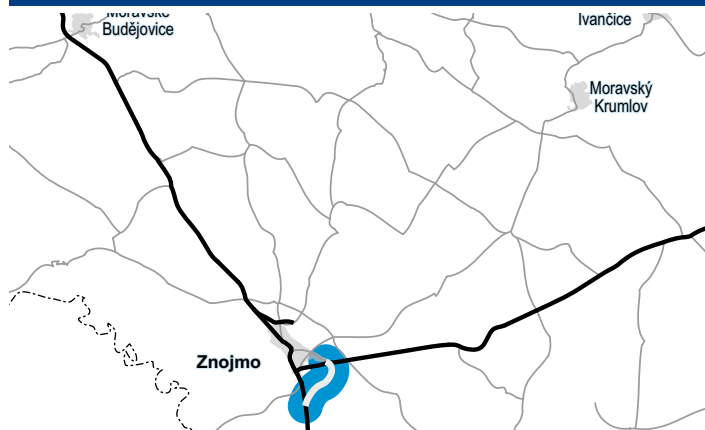

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
10/2011	06/2016	2022	2024	2025	2026	2030

Stav	V přípravě
Délka (m)	4277
Kategorie	S 11,5/80
Mosty (silniční)	4
MÚK	Znojmo-jih, Znojmo-východ, Dyjská
Zhotovitel DÚR	PK OSSENDORF s.r.o.
Cena (bez DPH)	1 433 600 000 Kč

Stav MPV

Dosud nebylo zahájeno.

Aktuální problém v přípravě

- Z důvodu dopadů nové územně plánovací dokumentace, změn v území a na základě biologického hodnocení bylo nutné zpracovat aktualizaci DÚR (04/2016).
- Probíhá inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí – v 04/2017 podána žádost o vydání ÚR. Výzvou byla stanovena lhůta k doplnění, která byla následně prodloužena.

Další informace

- Od roku 2015 do roku 2017 probíhal hydrogeologický monitoring podzemních vod, který bude i nadále pokračovat.
- Byl dokončen projekt pro podrobný geotechnický průzkum a také záměr projektu, který byl Centrální komisí Ministerstva dopravy schválen 29. 6. 2016.
- Probíhá zpracování nové technicko-ekonomické studie včetně ekonomického hodnocení HDM-4, která zahrnuje III. stavbu a Znojmo – Hatě (06/2020)

Opatření k urychlení přípravy/výstavby

Opatření vyžadovaná od PMD nebo PP

I/38 Znojmo–Hatě



EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
10/2005	2023	2023	2025	2027	2027	2029

Stav	V přípravě
Délka (m)	6000
Kategorie	S 11,5/80
Mosty (silniční)	4
MÚK	
Zhotovitel ZP	PK OSSENDORF spol. s r.o.
Cena (bez DPH)	915 000 000 Kč

Stav MPV

Dosud nebylo zahájeno.

Aktuální problém v přípravě


S ohledem na faktické skutečnosti ve věci ochranného pásma letiště bylo pozastaveno zpracování nového záměru projektu.

Další informace

Probíhá zpracování nové technicko-ekonomické studie včetně ekonomického hodnocení HDM-4, která zahrnuje III. stavbu a Znojmo – Hatě (06/2020).

Opatření k urychlení přípravy/výstavby

Opatření vyžadovaná od PMD nebo PP

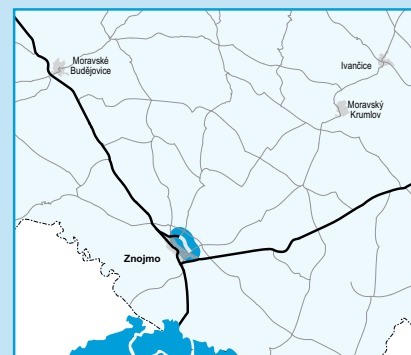

řešená stavba
jiné stavby



Geografická data poskytl VGHMÚF Dobruška, © MO ČR, 2008
ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Znojmo obchvat I

Silnice I/38

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Stavba byla zahájena již v roce 2006, doposud však není dokončena její první etapa kvůli nedorozuměním s občanským sdružením. Výsledkem je rozpracovaný obchvat, kde zbývá dokončit 752 metrů dlouhý úsek silnice, který by jej napojil do stávající silniční sítě.

V 11/2018 bylo zahájeno územní řízení a dne 3. 1. 2019 se uskutečnilo veřejné projednání ÚR. V 03/2019 proběhlo vypořádání námitek v rámci žádosti SÚ o vyjádření k podaným námítkám. Rovněž v 03/2019 bylo rozhodnuto o vyloučení účasti Děti Země a Voda z Tetčic. V 05/2019 byla občanským sdružením a dalšími občany v návaznosti na oznámení o pokračování územního řízení podána námítka na systémovou podjatost všech relevantních pracovníků MÚ Znojmo, což přípravu dále zdrželo.

Probíhá zpracování DSP (v 09/2019 byl dokončen koncept DSP) a IČ pro SP, je vyhotoven podrobný GTP. Po nabytí právní moci ÚR zbývá vykoupit jeden pozemek. Předpokládá se zahájení dokončovací práce v roce 2021. V 01/2020 proběhlo ústní jednání k územnímu řízení – opět byla podána námítka na systémovou podjatost MÚ Znojmo. Odbor výstavby MÚ Znojmo vydal 9. 6. 2020 ÚR (na celkem 30 stavebních objektů) stavby „Dopravní infrastruktura, napojení silnice II/413 na silnici I/38 Znojmo, Dobšice“. Hlavní trasa této části (I. etapa) je v délce 752 m. Přeložka silnice II/413 podcházející silnici I/38 bude dlouhá 490 m. Součástí stavby jsou dva mosty.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
08/2011	09/2004	I. ET. 06/2020 II. ET. 04/2012	2020 11/2006	2021 10/2006	2021 12/2006	2023

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 3037 m
kategorie: S 11,5/80
počet všech stavebních objektů: 56

Mostní objekty:

na silnici I/38: 4
podchod pod větví MÚK: 1
celková délka mostů: 149 m

Mimoúrovňové křižovatky:

počet: 1 (celková délka větví: 315 m)

Protihlukové stěny:

počet: 2 (celková délka: 180 m)

Úpravy ostatních komunikací:

počet: 13 (celková délka: 4062 m)

Přeložky a úpravy inž. sítí:

vodohospodářské objekty: 11

objekty elektro: 9

přeložky plynovodu: 1

Celkový objem zemních prací:

výkopy: 152 427 m³

násypy: 111 179 m³

Název stavby:

Silnice I/38 Znojmo obchvat I

Místo stavby:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Dobšice, Znojmo-město,

Kuchařovice

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracovatel DSP:



Silniční projekt spol. s r.o.

Zhotovitel:

COLAS CZ a.s.

Cena stavby dle smlouvy:

303 473 422 Kč (bez DPH)

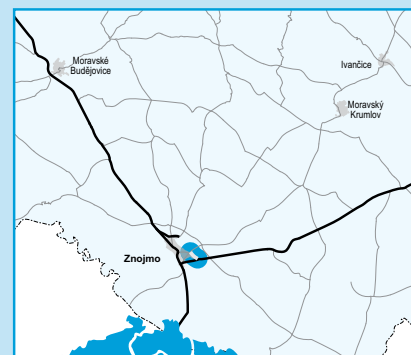

řešená stavba
jiné stavby



0 200 400 m

Geografická data poskytl VGHMÚF Dobruška, © MO ČR, 2013

ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Znojmo obchvat IV

Silnice I/38

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V 11/2015 byla zpracována technická studie. Dne 27. 4. 2016 bylo zveřejněno Oznámení EIA, ž na základě Závěrů zjišťovacího řízení nebude záměr dále posuzován. Proti tomuto byla v 02/2017 podána dvě odvolání. Dne 28. 11. 2017 KÚ JMK vyzval ŘSD k přepracování oznámení záměru. Probíhá přepracování oznámení záměru.

Byl dokončen záměr projektu, který byl v 07/2017 schválen bez připomínek Centrální komisí Ministerstva dopravy.

Stavební záměr bude znovu podán na zjišťovací řízení – dle rozhodnutí MŽP se jedná o stavbu podléhající zjišťovacímu řízení. Po ukončení zjišťovacího řízení bude následovat výběrové řízení na zpracovatele DÚR a na inženýrskou činnost související s vydáním územního rozhodnutí.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
–	07/2017	2022	2023	2023	2023	2028

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

Bude následovat výběrové řízení na zpracovatele DÚR a na inženýrskou činnost související s vydáním územního rozhodnutí.

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 1345 m
kategorie: S 11,5/80 (2+2)
počet všech stavebních objektů: 42

Mostní objekty:

na silnici I/38: 1
celková délka mostu: 117 m

Mimoúrovňové křižovatky:

MÚK Suchohrdelská
celková délka větví: 440 m

Protihlikové stěny:

počet: 5 (celková délka: 216 m)

Úpravy ostatních komunikací:

silnice III. třídy: 1 (délka: 165 m)
místní komunikace: 2 (délka: 240 m)
polní cesty: 6 (délka: 1267 m)
celková délka: 1672 m

Přeložky a úpravy inž. sítí:

vodohospodářské objekty: 3
objekty elektro: 4
objekty trubních vedení: 2

Název stavby:

I/38 Znojmo obchvat IV

Místo stavby:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Znojmo-město, Dobšice u Znojma

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracovatel technické studie:


PK OSSENDORF spol. s r.o.

Předpokládaná cena stavby:

293 804 654 Kč (bez DPH)

Silnice I/38

stavba
Znojmo obchvat III

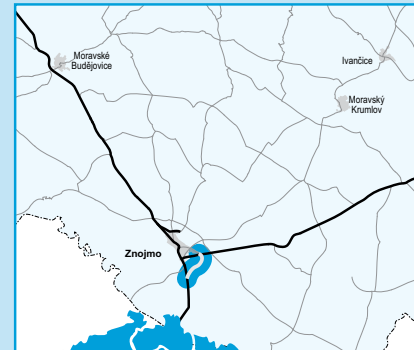

řešená stavba
jiné stavby



0 0,5 1 km

Geografická data poskytl VGHMÚF Dobruška, © MO ČR, 2013

ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Znojmo obchvat III

Silnice I/38

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Na stavbu je od září 2013 zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Z důvodu dopadů nové územně plánovací dokumentace, změn v území a na základě biologického hodnocení proběhla aktualizace DÚR (04/2016). Probíhala inženýrská činnost pro vydání ÚR – v 04/2017 podána žádost o vydání ÚR. Výzvou byla stanovena lhůta k doplnění, která byla následně prodloužena. Od roku 2015 do roku 2017 probíhal hydrogeologický monitoring podzemních vod, který bude i nadále pokračovat. Byl dokončen projekt pro podrobný geotechnický průzkum a také záměr projektu, který byl Centrální komisí Ministerstva dopravy schválen 29. 6. 2016.

Byl vybrán zpracovatel DSP a zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení.

V 04/2019 MŽP prodloužilo platnost stanoviska EIA do 19. 10. 2021. Byla zaslána žádost o prodloužení územního řízení.

V 06/2020 byl vybrán zpracovatel nové TES. Probíhá zpracování nové technicko-ekonomické studie včetně ekonomického hodnocení HDM-4, která zahrnuje III. stavbu a Znojmo – Hatě (06/2020)

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
10/2011	06/2016	2022	2024	2025	2026	2030

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 4277 m

kategorie: S 11,5/80 (2+1)

Úprava silnice I/53

délka: 1955 m (S 20,75/80)

Mostní objekty:

na silnici I/38: 4

na silnici I/53: 3

nadjezdy: 2

železniční most: 1

celková délka mostů: 320 m

Mimoúrovňové křižovatky:

Znojmo-jih, Znojmo-východ, Dyjská

Opěrné a zárubní zdi:

počet: 2 (celková délka: 216 m)

Úpravy ostatních komunikací:

silnice II/408: 439 m

silnice III/3978: 456 m

silnice III. třídy Dobšice–Dyje:

1034 m

polní a lesní cesty: 2040 m

Přeložky a úpravy inž. sítí:

vodohospodářské objekty: 13

objekty elektro: 35

objekty trubních vedení: 5

dražní objekty: 6

Celkový objem zemních prací:

výkopy: 362 430 m³

násypy: 41 885 m³

Název stavby:

I/38 Znojmo obchvat III

Místo stavby:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Znojmo-Louka, Oblekovice, Dobšice

u Znojma, Dyje

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:


Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracovatel DÚR:

PK OSSENDORF spol. s r.o.

Předpokládaná cena stavby:

1 433 600 000 Kč (bez DPH)

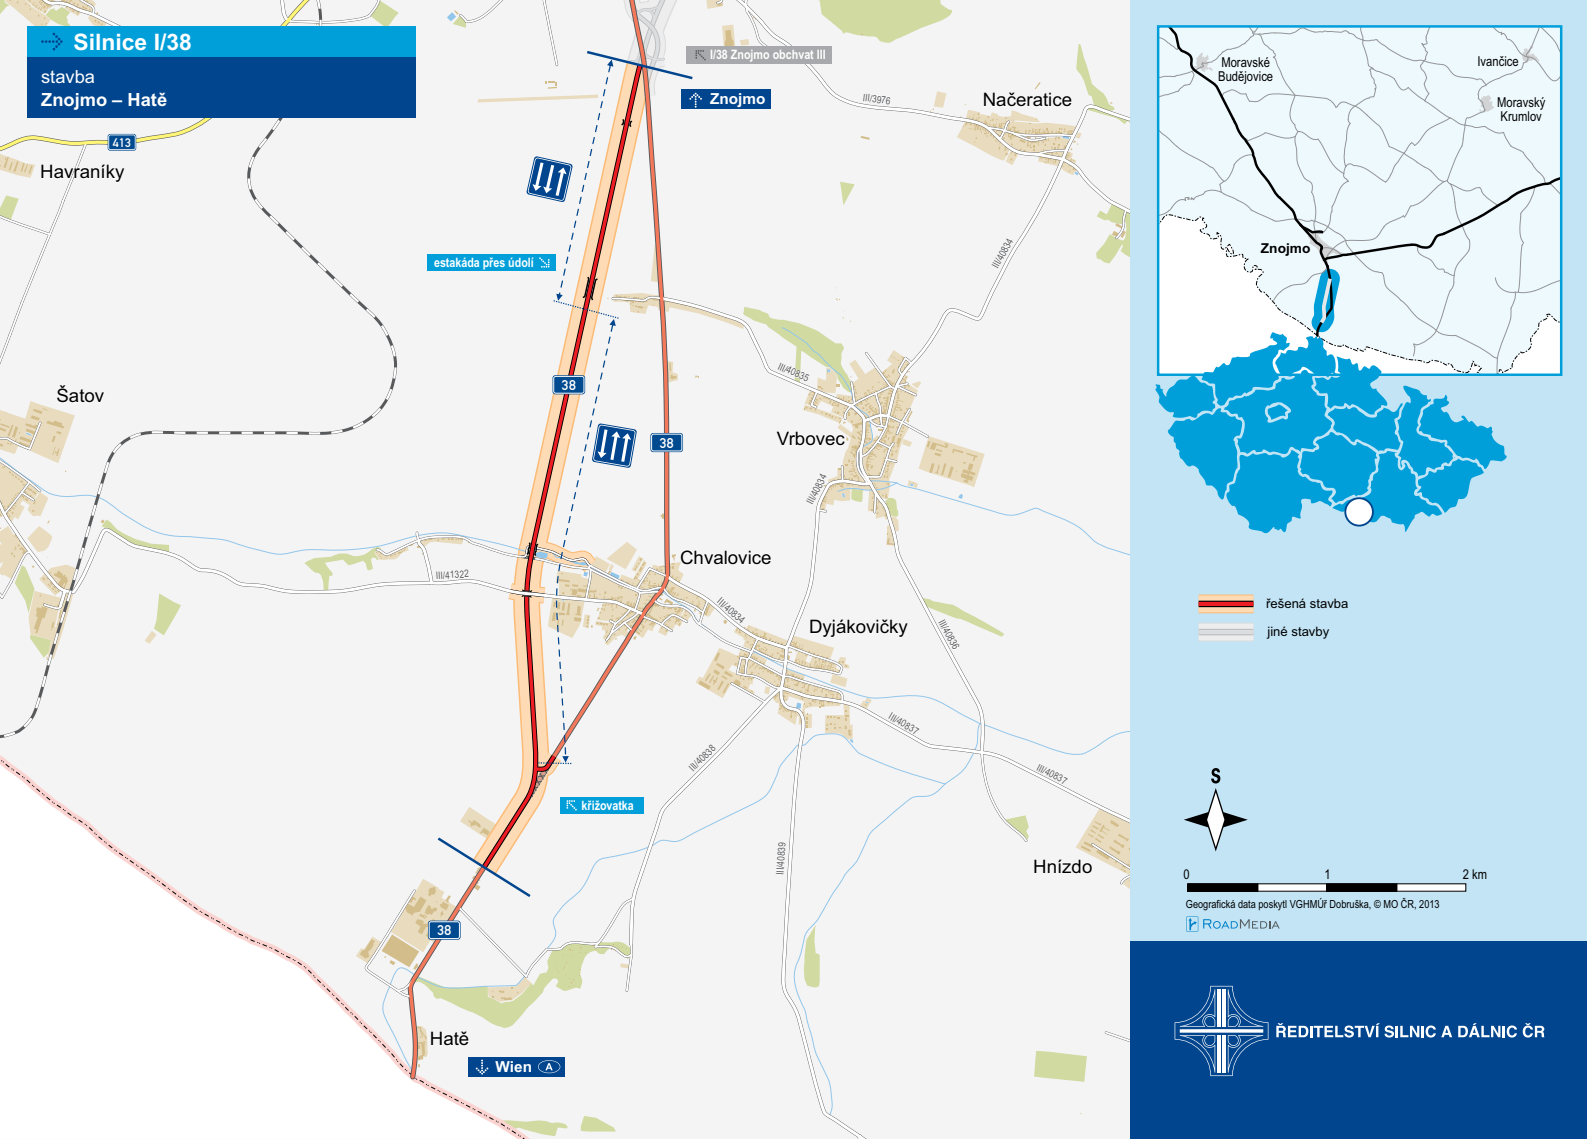

Znojmo – Hatě

Silnice **I/38**

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V roce 2015 byl proveden předběžný geotechnický průzkum. Na MŽP byla dne 14. 10. 2016 podána žádost o prodloužení platnosti stanoviska EIA, které se týká staveb „I/38 Znojmo obchvat III“ a „I/38 Znojmo–Hatě“. V roce 2017 bylo zadáno zpracování DÚR. V rámci přípravy stavby byl vybrán zhotovitel nového záměru projektu – s ohledem na faktické skutečnosti ve věci ochranného pásma letiště bylo pozastaveno zpracování nového záměru projektu. Od 06/2020 probíhá zpracování nové technicko-ekonomické studie včetně ekonomického hodnocení HDM-4, která zahrnuje i stavbu Znojmo obchvat III. stavba.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
10/2005	2023	2023	2025	2027	2027	2029

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 6000 m
kategorie: S 11,5/80 (2+1)

Mostní objekty:

na silnici I/38: 4
přes silnici I/38: 1
celková délka mostů: 252 m

Úpravy ostatních komunikací:

silnice III/41322: 230 m
místní komunikace: 550 m
účelové komunikace: 500 m
poľní a lesní cesty: 1000 m

Přeložky a úpravy inž. sítí:

vodohospodářské objekty: 1200 m
objekty elektro: 1255 m
objekty trubních vedení: 1380 m
Celkový objem zemních prací:
výkopy: 342 100 m³
násypy: 50 085 m³

Název stavby:

I/38 Znojmo – Hatě

Místo stavby:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Znojmo-Louka, Chvalovice, Dyjákovičky

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracovatel původního záměru projektu:

PK OSSENDORF spol. s r.o.

Předpokládaná cena stavby:

915 000 000 Kč (bez DPH)



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC A DÁLNIC ČR**
