


přehled staveb **ŘSD**

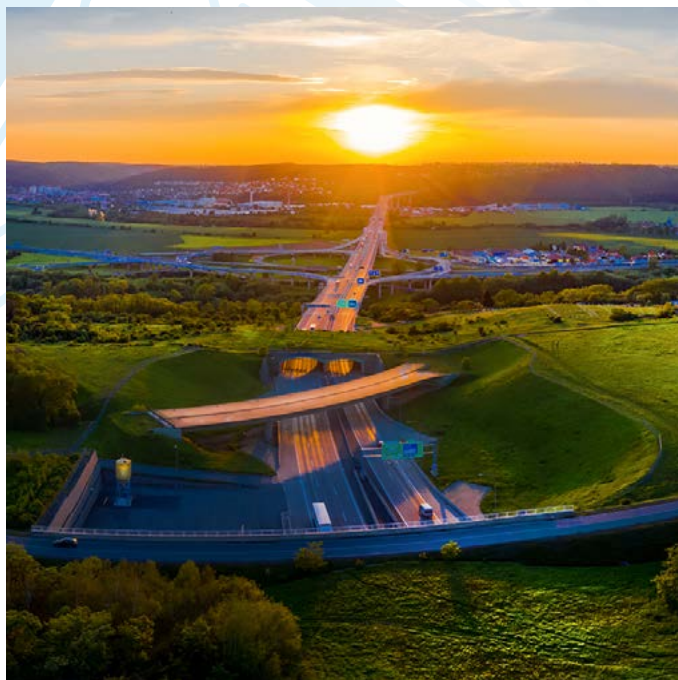

Dálnice D0
Pražský okruh

Stav k 02/2022


Klíčová data

Kód	Název stavby	Délka (km)	Zahájení	Zprovoznění	Cena (Kč)
	510 Satalice–Běchovice	4,7		1984/1993	
A1	511 Běchovice–D1	12,6	2024	2027	11 800 000 000 *
S64	I/12 Běchovice–Úvaly	12,6	2025	2027	6 411 696 000**
	512 D1–Vestec	8,8		09/2010	
	513 Vestec–Lahovice	8,3		09/2010	
	514 Lahovice–Slivenec	6		09/2010	
	515 Slivenec–Třebonice	7,2		1983	
	516 Třebonice–Řepy	3,3		2000	
	517 Řepy–Ruzyně	2,5		2001	
A5	518 Ruzyně–Suchdol	8,3	2027	2030	12 587 160 000 *
A6	519 Suchdol–Březiněves	6,7	2027	2030	11 361 449 728 *
A7	520 Březiněves–Satalice	13	2027	2030	Var. 1: 11 824 778 938* Var. 2: 13 829 497 298* Var. 3: 24 099 396 641*
Celkem km/Kč		82,8*			47 573 388 666 49 578 107 026 60 388 006 369

* včetně 1,4 km (součást stavby D7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně)


* Předpokládaná cena

**Cena není zahrnuta do celkové částky staveb D0

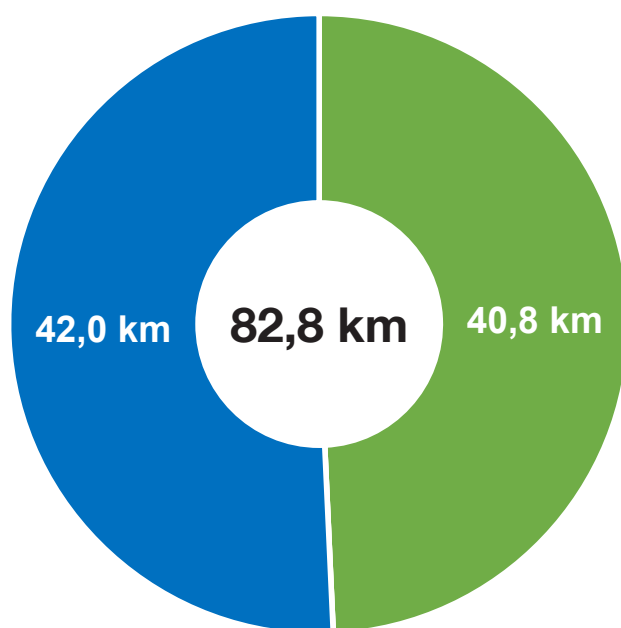

- Zprovozněno 50 %
- V realizaci 0 %
- V přípravě 50 %

POSTUP ZPROVOZŇOVÁNÍ PRAŽSKÉHO OKRUHU



Dálnice D0


Pražský okruh



Poznámky



D0 511 Běchovice–D1

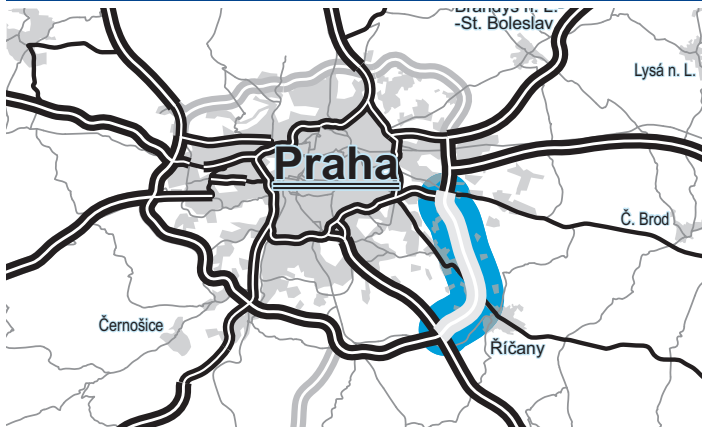

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
11/2017	04/2010	07/2020*	2022	2023	2024	2027

Stav	V přípravě
Délka (m)	12 637
Kategorie	D 34,5/100
Tunely	Dubeč 275 m / 267 m Na Vysoké 385 m / 392 m)
Mosty (dálniční)	5
MÚK	MÚK Dubeč, MÚK Uhřetěves, MÚK Říčany, MÚK Lipany
Zhotovitel DÚR+DSP	Satra, spol. s r.o., APIS, ing. Lebeda
Cena (bez DPH)	11 800 000 000 Kč

Stav MPV

- Ke dni 15. 7. 2019 byly zahájeny práce na majetkoprávní přípravě. Dle pokynu MD ČR byly zahájeny pouze práce na bezúplatných převodech, vyřešení duplicitních záznamů v KN a na problematických pozemcích s žalobou či s neprovedenými dědickými řízeními. Byl také dán souhlas s výkupy pozemků dotčených jak stavbou 511, tak i kompenzačními opatřeními hlavního města Prahy (se vzájemnou koordinací v souladu s uzavřeným Memorandem vč. jeho dodatku č.1).

Majetkoprávní přehled

- Počet LV: 238; počet vlastníků: 501; počet pozemků: 640 (k 10/2020 bylo vypořádáno 44 LV tj, 14%).
- Z toho počet duplicit: 14, počet dědických řízení: 9, počet žalob: 2.

Zásadní podmínky

Koordinace staveb SOKP 511 a Přeložky I/12 tak, aby byly uvedeny do zkušebního provozu nebo předčasného užívání ve stejném termínu. Zisk pravomocného územního rozhodnutí závisí na vypořádání všech podaných odvolání. MMR vyhovělo dne 28.12.2020 námítce systémové podjatosti a rozhodlo, že magistrát o odvoláních rozhodovat nemá.

Další informace

- 23. 11. 2017 bylo vydáno závazné stanovisko stavby D0 511 k posouzení vlivů provedení záměru na životní posouzení.
- Čistopis dokumentace DÚR byl dokončen 18. 5. 2018. Následně započalo projednání dokumentace DÚR s DOSS. Žádost o ÚR podaná 25. 9. 2018 na MČ Praha 22. Dne 24. 7. 2019 se uskutečnilo ústní jednání k územnímu rozhodnutí. Stavební úřad z důvodu zajištění transparentnosti svolal nové veřejné projednání stavby na 18. 12. 2019. Dne 30. 7. 2020 bylo vydáno a zveřejněno ÚR stavby SOKP 511. Proti vydanému ÚR bylo podáno 47 odvolání (4. 9. 2020 bylo zveřejněno na úřední desce). MMR ČR dne 23. 2. 2021 vydalo usnesení, ve kterém byl pověřen Krajský úřad Jihočeského kraje (JK) k vydání rozhodnutí ve věci odvolání proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 22.
- K 1. 6. 2019 byl vydán pokyn k zahájení prací na DSP. Projednání konceptu DSP. Zapracování požadavků architektonické studie. Dokumentaci DSP je možné z časového hlediska dokončit v čístopisu po vydání pravomocného územního rozhodnutí (do 03/2022). Projednání DSP s DOSS započne následně po vydání pravomocného ÚR s předpokládaným dokončením do 6 měsíců od zahájení. Po vydání pravomocného ÚR budou rozeslány kupní smlouvy pro trvalý zábor stavby.
- V současné době JK (odvolací orgán) vydal oznámení o pokračování v odvolacím řízení po doplnění všech potřebných dokladů.

Rizika přípravy

Očekávají se problémy s výkupem / vyvlastňováním.


Opatření k urychlení přípravy/výstavby

V současné době se připravují výkupy pozemků v koordinaci s hl. m. Prahou, a to v souladu s uzavřeným memorandem vztahujícím se na pozemky potřebné současně pro SOKP a pro kompenzační opatření (zelené pásy v režii hl. m. Prahy).

Zahájení prací na DSP před vydáním pravomocného ÚR.



I/12 Běchovice – Úvaly (podmiňující stavba v rámci stavby 511)

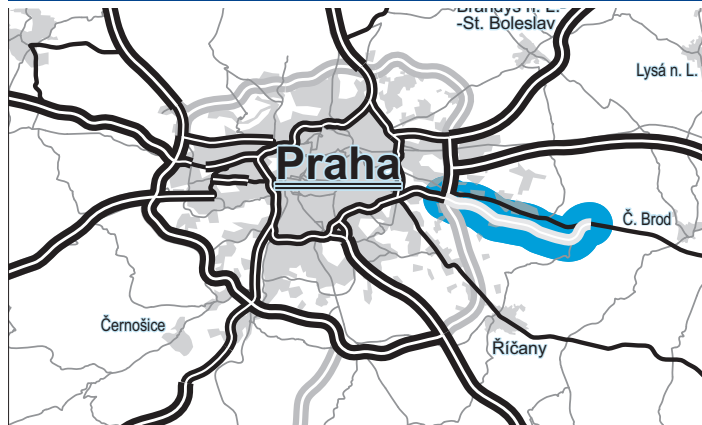

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2018	06/2002 2022	2022	2023	2024	2025	2027

Stav	V přípravě
Délka (m)	12 640
Kategorie	S 24,5/110
Mosty (na trase)	6
MÚK	MÚK Běchovice, MÚK Koloděje, MÚK Újezd nad Lesy, MÚK Květnice, MÚK Škvorec, MÚK Tuklaty
Zhotovitel DSP	SUDOP Praha a.s.
Cena (bez DPH)	6 411 696 000 Kč

Stav MPV

K 15. 7. 2021 byla zahájena majetkoprávní příprava dle pokynu MD ČR na bezúplatných převodech, příprava geometrických plánů v rozsahu trvalých záborů stavby, zavádění údajů do systému majetkoprávní přípravy ŘSD ČR, výkupy pozemků v koordinaci s Hl. m. Praha, a to v souladu s uzavřeným memorandem vztahujícím se na pozemky současně pro stavbu I/12 Běchovice – Úvaly a pro kompenzační opatření (Zelené pásy v režii Hl. m. Prahy).

Aktuální problém v přípravě

Další informace

- V únoru 2018 bylo vydáno závazné stanovisko stavby přeložky I/12 k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
- V lednu 2019 byl schválen čístopis DÚR a následně bylo zahájeno projednávání dokumentace DÚR s DOSS.
- Podrobný GTP byl dokončen v srpnu 2021.
- Dne 16. 9. 2021 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení územního řízení. Veřejné ústní jednání se konalo 2. 11. 2021. Předpoklad vydání nepravomocného ÚR do března 2022
- Byl dokončen koncept čístopisu DSP v 11/2021. Proběhlo vypořádání připomínek specialistů ŘSD ČR. Čístopis bude dokončen až po vydání pravomocného ÚR.

Rizika přípravy


- Případná odvolání k vydanému ÚR, problémy s výkupem – nesouhlasy vlastníků.

Opatření k urychlení přípravy/výstavby

- Zahájení prací na DSP a majetkoprávní příprava před vydáním pravomocného ÚR.



D0 518 Ruzyně – Suchdol

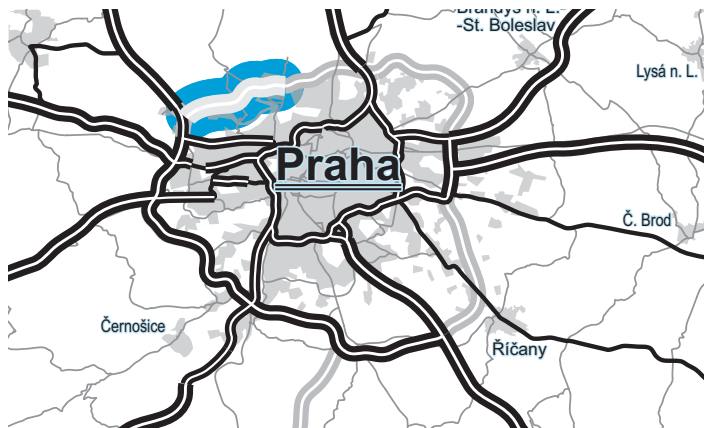


EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
2023	2022	2025	2025	2025	2027	2030
Stav		V přípravě				
Délka (m)		8260				
Kategorie		D 34/100				
Tunely		Suchdol, Rybářka – celková délka: 2870 m				
Mosty (dálniční)		8				
MÚK		MÚK Přední Kopanina, MÚK Horoměřice, MÚK Suchdol, MÚK Rybářka				
Zhotovitel DÚR		Pragoprojekt a.s				
Cena (bez DPH)		12 587 160 000 Kč				

Stav MPV	Nebylo zahájeno
Zásadní podmínky	Základní podmínkou realizace stavby SOKP 518 a SOKP 519 je společné uvedení obou staveb do provozu současně.
Další informace	Stavby 518 a 519 mají v současné době dokončeny čistopisy Technické studie (TES). Tyto dokumentace byly podkladem pro zpracování oznámení záměru, případně i pro dokumentaci EIA. Trasa SOKP vedená v těchto studiích je vedená výhradně v koridoru schválených ZUR hl.m. Prahy a Středočeského kraje (2. Aktualizace ZUR Středočeského kraje nabyla účinnosti dne 4. 9. 2018). Oznámení záměru stavby 518 předloženo na MŽP 3. 9. 2019 – Závěr zjišťovacího řízení MŽP byl vydán 18. 12. 2019. - Na základě připomínek hl. m. Prahy a dotčených obcí (městských částí) bylo v rámci závěrů zjišťovacích řízení uloženo ŘSD dopracovat dokumentaci - technické studie o další nové varianty, které budou použity pro zpracování dokumentace EIA. - Pro stavby SOKP 518 a 519 bude zpracována a na MŽP předložena jedna EIA společná za obě stavby. - Dokončení dokumentace EIA a předání na MŽP do 1. 4. 2023. - Vydání závazného stanoviska v 12/2023. - Zpracování DUSP v 12/2023, vydání pravomocného společného povolení předpokládáme v 12/2025. Přetrvávající odpor MČ.
Rizika přípravy	
Opatření k urychlení přípravy/výstavby	Požadavky hl.m. Prahy na úpravy technického řešení mohou způsobit změny v zásadách územního rozvoje bez jejichž schválení může být příprava stavby pozastavena!



D0 519 Suchdol – Březiněves

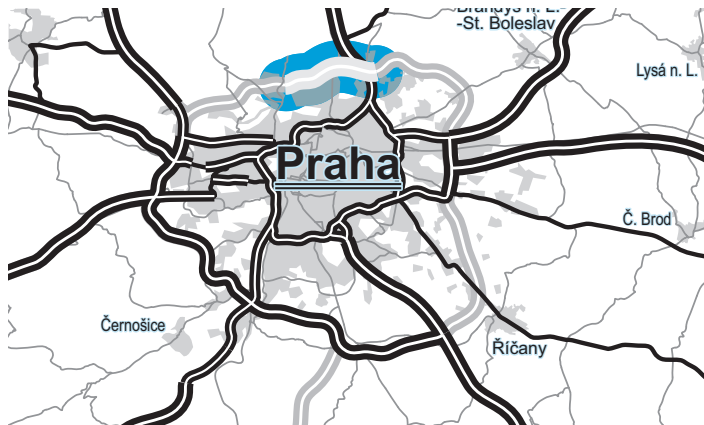

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
2023	2023	2025	2025	2026	2027	2030

Stav	V přípravě
Délka (m)	6670
Kategorie	D 34/100
Mosty (dálniční)	3
MÚK	MÚK Čimice, MÚK Ústecká, MÚK Březiněves
Zhotovitel DÚR	AFRY CZ s.r.o.
Cena (bez DPH)	11 361 449 728 Kč

Stav MPV

Nebylo zahájeno

Zásadní podmínky

- Hl.m.Praha – IPR předložil návrh vedení trasy v prostoru Dražanského údolí v tunelu mimo ceněné údolí Čimického potoka. Z pohledu HMP tato varianta otevírá nový prostor pro jednání s městskými částmi a dle jejich názoru přispěje k lepší projednatelnosti stavby v rámci povolenacích procesů.
- Dokumentace variantního řešení D0 519 byla dokončena 01/2020 a zaslána na IPR a MD, zároveň byla TES připomínkována PÚ ŘSD, závěrem je doporučení nezabývat se předmětnou tunelovou variantou z důvodu negativnímu vlivu na podzemní vody a výrazně vyšších stavebních nákladů.

Další informace

U staveb 518 a 519 byly dokončeny čístopisy Technické studie (TES). Tyto dokumentace byly podkladem pro zpracování oznámení záměru, případně i pro dokumentaci EIA. Trasa SOKP vedená v těchto studiích je vedená výhradně v koridoru schválených ZÚR hl.m. Prahy a Středočeského kraje (2. Aktualizace ZÚR Středočeského kraje nabyla účinnosti dne 4. 9. 2018).

- **Oznámení záměru stavby 519 předloženo na MŽP 3. 9. 2019 – závěr zjišťovacího řízení MŽP byl vydán 18. 12. 2019.**
- Na základě připomínek hl. m. Prahy a dotčených obcí (městských částí) bylo v rámci závěrů zjišťovacích řízení uloženo ŘSD dopracovat dokumentaci - technické studie o další nové varianty, které budou použity pro zpracování dokumentace EIA.
- Pro stavby SOKP 518 a 519 bude zpracována a na MŽP předložena jedna EIA společná za obě stavby.
- Dokončení dokumentace EIA a předání na MŽP do 1. 4. 2023.
- Vydání závazného stanoviska v 12/2023.
- Zpracování DUSP v 12/2023, vydání pravomocného společného povolení předpokládáme v 12/2025.

Přetrvávající odpor MČ.


Rizika přípravy

Opatření k urychlení přípravy/výstavby

Požadavky hl.m. Prahy na úpravy technického řešení mohou způsobit změny v zásadách územního rozvoje bez jejichž schválení může být příprava stavby pozastavena!



D0 520 Březiněves – Satalice

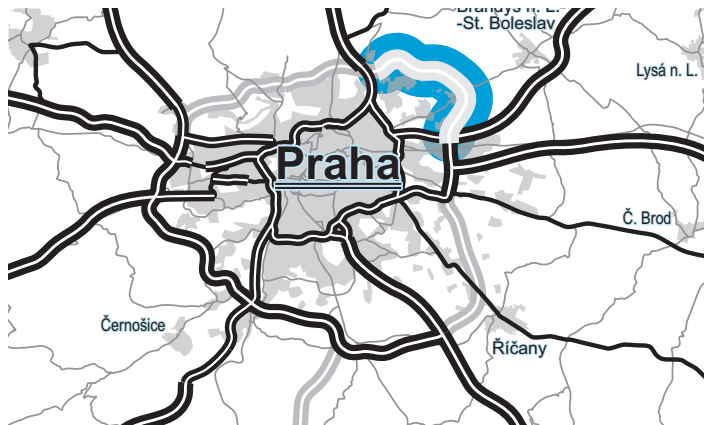

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
2024	2023	2026	2026	2027	2027	2030
Stav		V přípravě				
Délka (m)		12 953				
Kategorie		D 34/100				
Tunely (varianta)		Třeboradice (1330 m), Veleň (450 m), Vinoř (2050 m)				
Mosty (dálniční)		8/5 (dle výsledné varianty)				
MÚK		MÚK Třeboradice, MÚK Přezletice, MÚK Vinoř, MÚK Satalice				
Zhotovitel TS		Pragoprojekt a.s.				
Cena (bet DPH)		Var. 1: 11 824 778 938 Kč Var. 2: 13 829 497 298 Kč Var. 3: 24 099 396 641 Kč				

Stav MPV


Nebylo zahájeno

Zásadní podmínky

- V 01/2019 byly započaty práce na konsolidované TES, která variantně obsahuje 1. optimální řešení trasy, 2. řešení trasy zahloubené a 3. řešení trasy s tunelovou variantou.
- Posléze bude zpracována dokumentace pro oznámení EIA a následně dokumentace EIA. Konsolidovaná TES je zadána jako technicko-ekonomická studie, jejíž součástí je ekonomické hodnocení HDM-4 navržených variant.
- Představení konsolidované TES včetně ekonomického hodnocení CK MD za účasti zastupitelů dotčených MČ obcí se uskutečnilo 12. 2. 2020. Centrální komise MD rozhodla, že budou posuzovány všechny tři varianty. Na základě požadavku obcí i CK MDČR začalo ŘSD prověřovat technickou proveditelnost přeložky silnice II/610 v úseku Brandýs nad Labem – dálnice D0 jako přivaděče, a to mimo zástavbu obcí Dřevčice a Podolanka.
- Práce na oznámení EIA zahájeny 30. 4. 2020.

Další informace

- Dokumentace pro oznámení záměru byla dokončena v 08/2020.
- Předání oznámení záměru na MŽP 10/2020.
- Závěry zjišťovacího řízení 03/2021.
- Ze ZZŘ vyplynulo podrobnější dopracování technického řešení variant 2 a 3 nejlépe kombinací technického řešení variant 2 a 3, a to s důrazem na vedení nivelety trasy D0 520 tak, aby byly v maximální možné míře eliminovány její vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, a to se zohledněním relevantních požadavků v obdržených vyjádřeních.
- Dokumentace EIA bude zpracována do 07/2023 (tj. zjištění aktuálních dopravních intenzit vč. modelů pro budoucí hodnocené roky, akustické studie, emisní studie, biologické monitoringy a další nezbytné průzkumy atd).
- Vydání závazného stanoviska předpokládáme do 03/2024.
- Vydání pravomocného společného povolení: předpoklad v 02/2026 (následuje Dokumentace pro stavební povolení, výkupy pozemků, projednání, stavební povolení, soutěž na zhotovitele).
- Dokončení stavby předpoklad 2030 dle vybrané varianty.

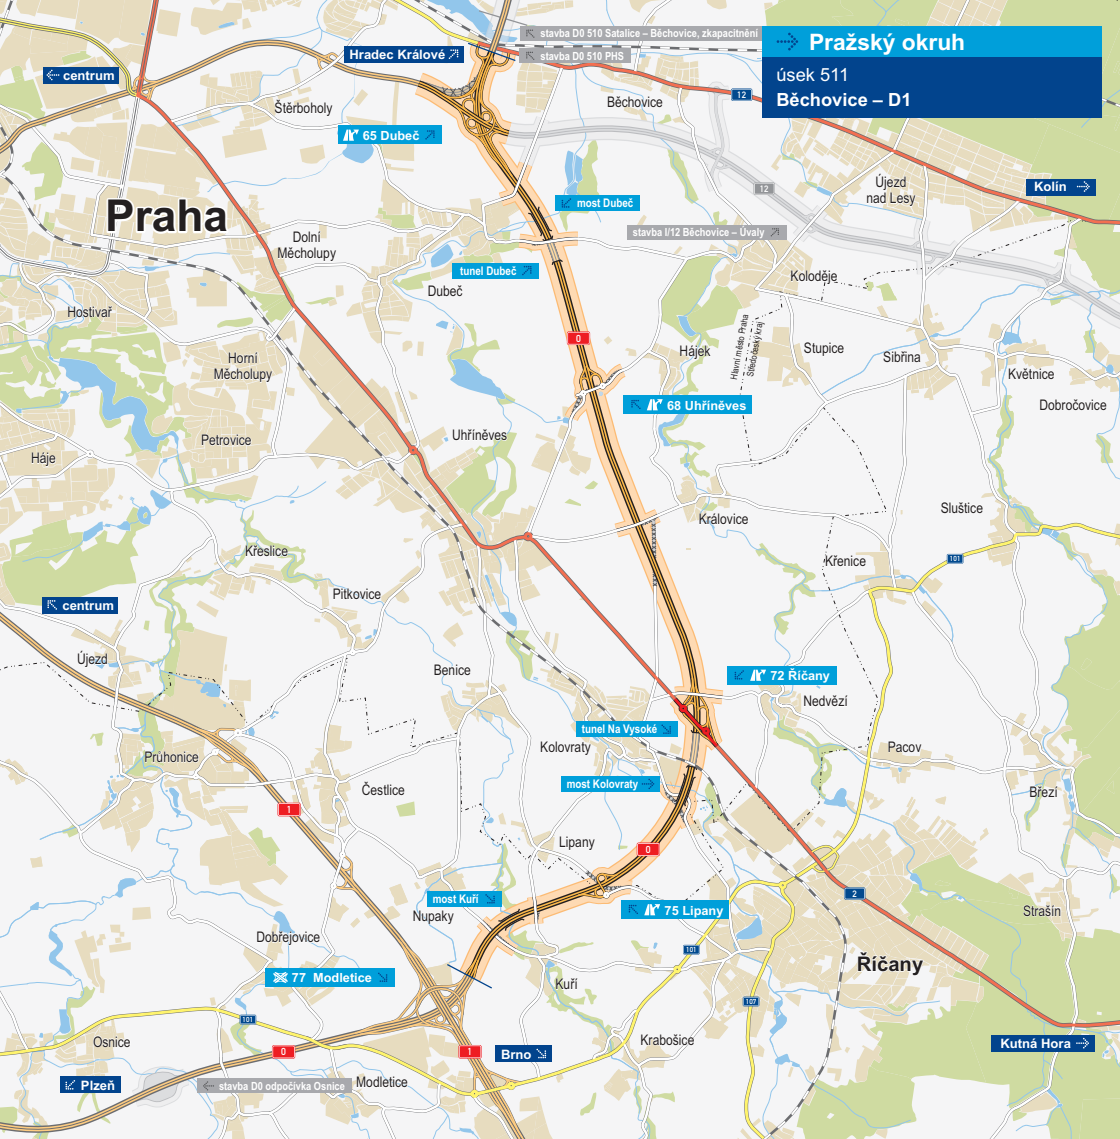

řešená stavba
jiné stavby



Geografická data poskytl VGHMÚR Dobruška, © MO ČR, 2008
ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

úsek 511 Běchovice–D1

Dálnice **D0**

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V 09/2016 byly zahájeny práce na nové dokumentaci EIA. ŘSD ČR dokončilo dokumentaci EIA pro chybějící části Pražského okruhu na konci 04/2017. MŽP vydalo 27. 11. 2017 závazné stanovisko EIA. Následovalo zpracování podmínek stanoviska do DÚR, její projednání s dotčenými orgány a příprava žádosti o ÚR. Dne 24. 7. 2019 se v Praze-Uhřetěvsi uskutečnilo veřejné ústní projednání územního řízení. ŘSD dodalo SÚ všechny požadované dokumenty, včetně vypořádání podaných připomínek. Kvůli procesní chybě SÚ ve věci obeslání vlastníků se ale muselo uskutečnit nové ústní projednání, k němuž došlo 18. 12. 2019. K vydání ÚR (zatím nepravomocného) došlo 30. 7. 2020. Proti ÚR bylo podáno 47 odvolání. Zisk pravomocného ÚR závisí na vypořádání všech podaných odvolání odvolacím orgánem, kterým byl rozhodnutím MMR z 23. 2. 2021 určen Krajský úřad Jihočeského kraje. V současné době JK (odvolací orgán) prověřuje doklady vydané k územnímu řízení. Koncem 04/2021 byl dokončen čistopis DSP. Aktuálně se poptává zpracovatel pyrotechnického průzkumu.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
11/2017	04/2010	07/2020*	2022	2023	2024	2027

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu ***zatím nepravomocné**

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 12 637 m
kategorie: D 34,5/100 (kategorie D 33,5 dle ČSN s rozšířeným SDP)

Tunely:

Dubeč – 232 m, Na Vysoké – 394 m

Mostní objekty:

mosty na trase: 5, nadjezdy: 9
na větvích MÚK: 2
ostatní mosty mimo hlavní trasu: 3
lávky pro pěší a cyklisty: 2 (127 m)
propustky: 9

Mimoúrovňňové křižovatky:

Dubeč, Uhřetěves, Říčany, Lipany

Přeložky a úpravy ost. komun.:

Štěrboholská radiála: délka 1463 m
(kategorie: R 25,5/100)
silnice I/2: (délka: 731 m)
silnice III. třídy: 9 (délka: 5027 m)
místní komunikace: 1 (délka: 550 m)
chodníky a cyklostezky: 2 (1260 m)
polní cesty: 10

Opěrné zdi a zárubní zdi:

opěrné: 2 (délka: 184 m)
zárubní: 16 (délka: 15 134 m)

Protihlukové stěny:

počet: 16 (celková délka: 7800 m)

Celkový objem zemních prací:

násypy: 1 800 000 m³
výkopy: 2 600 000 m³

Přeložky a úpravy inž. sítí:

vodohospodářské objekty: 55
objekty elektro: 48
objekty trubních vedení: 2
dražní objekty: 10

Název stavby:

D0 511: Běchovice–D1

Místo stavby:

Praha a Středočeský kraj

Katastrální území:

Dolní Počernice, Běchovice, Dubeč,

Hájek u Uhř., Uhřetěves, Královce, Kolovraty, Nedvězí u Říčan, Říčany u Prahy, Lipany, Kuří u Říčan, Nupaky

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracovatel DÚR:

APIS, ing. Lebeda

Zpracovatel DSP:

Satra, spol. s r.o.

Předpokládaná cena stavby:

11 800 000 000 Kč (bez DPH)



řešená stavba
jiné stavby



0 2 4 km
Geografická data poskytl VGHMÚF Dobruška, © MO ČR, 2013
ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Běchovice–Úvaly

Silnice I/12

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Na stavbu je dokončena dokumentace EIA, tedy vliv stavby na životní prostředí podle nových pravidel. Nová dokumentace EIA je paralelně dle shodných pravidel připravena i pro stavbu 511 silničního okruhu kolem Prahy, neboť obě dvě stavby spolu světybně souvisí. Dokumentace EIA byla předložena na MŽP, které ji začátkem roku 2018 odsouhlasilo. Podrobný geotechnický průzkum byl dokončen v 08/2021. Byly podrobně vy-
pořádávány požadavky obcí a městských částí. V lednu 2019 byl schválen čistopis DÚR a následně bylo zahájeno projednávání dokumentace DÚR s DOSS. Dne 28. 2. 2018 bylo vydáno závazné stanovisko stavby přeložky I/12 k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Dne 3. 6. 2019 bylo požádáno o územní rozhodnutí u MČ Praha 21, dne 11. 7. 2019 byla předložena výzva MČ Praha 21 k doplnění žádosti do 17. 1. 2020, dne 15. 1. 2020 doplnění části dokladů a žádost o prodloužení termínu do 30. 6. 2020. Byly doloženy všechny doklady. Dne 16. 9. 2021 bylo zveřejněno Oznámení zahájení územního řízení. Veřejné ústní jednání se uskutečnilo 2. 11. 2021. Předpoklad vydání nepravomocného ÚR je do 03/2022. V 11/2021 byl dokončen koncept DSP. Přípomínky byly poté vypořádány a zapracovány do konceptu čistopisu. Čistopis bude dopracován až po vydání pravomocného ÚR. Během roku 2022 budou probíhat potřebné průzkumy území.

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 12 640 m
kategorie: S 24,5/110
počet stavebních objektů: 269

Mostní objekty:

na hlavní trase: 6
nadjezdy: 15
na ostatních komunikacích: 2
celková délka mostů: 1761 m

Mimoúrovňové křižovatky:

Běchovice, Koloděje, Újezd nad Lesy, Květnice, Škvorec, Tuklaty
celková délka větví: 5381 m
+ MUK Dubeč (část větve D délky 41 m)


Ostatní křižovatky

okružní: 4
Protihlukové stěny a valy:
počet: 8 (celková délka: 1106 m)
Protihlukové valy:
počet: 1 (délka: 605 m)
Zemní valy:
počet: 25 (celková délka: 8370 m)
Úpravy ostatních komunikací:
sil. I/12 (větve Úvaly): 1 (délka: 188 m)
silnice II. tříd: 1 (délka: 537 m)
silnice III. tříd: 7 (délka: 4128 m)
místní komunikace: 1 (délka: 564 m)
úcelové komun.: 2 (délka: 667 m)
příjezdové komun.: 9 (délka: 2555 m)

polní cesty: 8 (délka: 1342 m)
přístupové cesty: 12 (d: 8258 m)
stezky pro pěší a cyklisty: 5 (2670 m)
chodník: 1 (délka: 1015 m)
Naváděcí zidky:
počet: 7 (celková délka: 645 m)
Přeložky a úpravy inž.sítí:
vodo hospodářské objekty: 62
objekty elektro: 47
přeložka plynovodu: 5
Celkový objem zemních prací:
výkopy: 1 980 000 m³
náspy: 1 510 000 m³
Název stavby:
I/12 Běchovice–Úvaly

Místo stavby:

Praha a Středočeský kraj
Katastrální území:
Dubeč, Běchovice, Koloděje, Újezd n. Lesy, Sibiřna, Květnice, Dobročovice, Škvorec, Úvaly, Tuklaty
Druh stavby:
novostavba
Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DSP:
Sudop Group I
Předpokládaná cena stavby:
6 411 696 000 Kč (bez DPH)

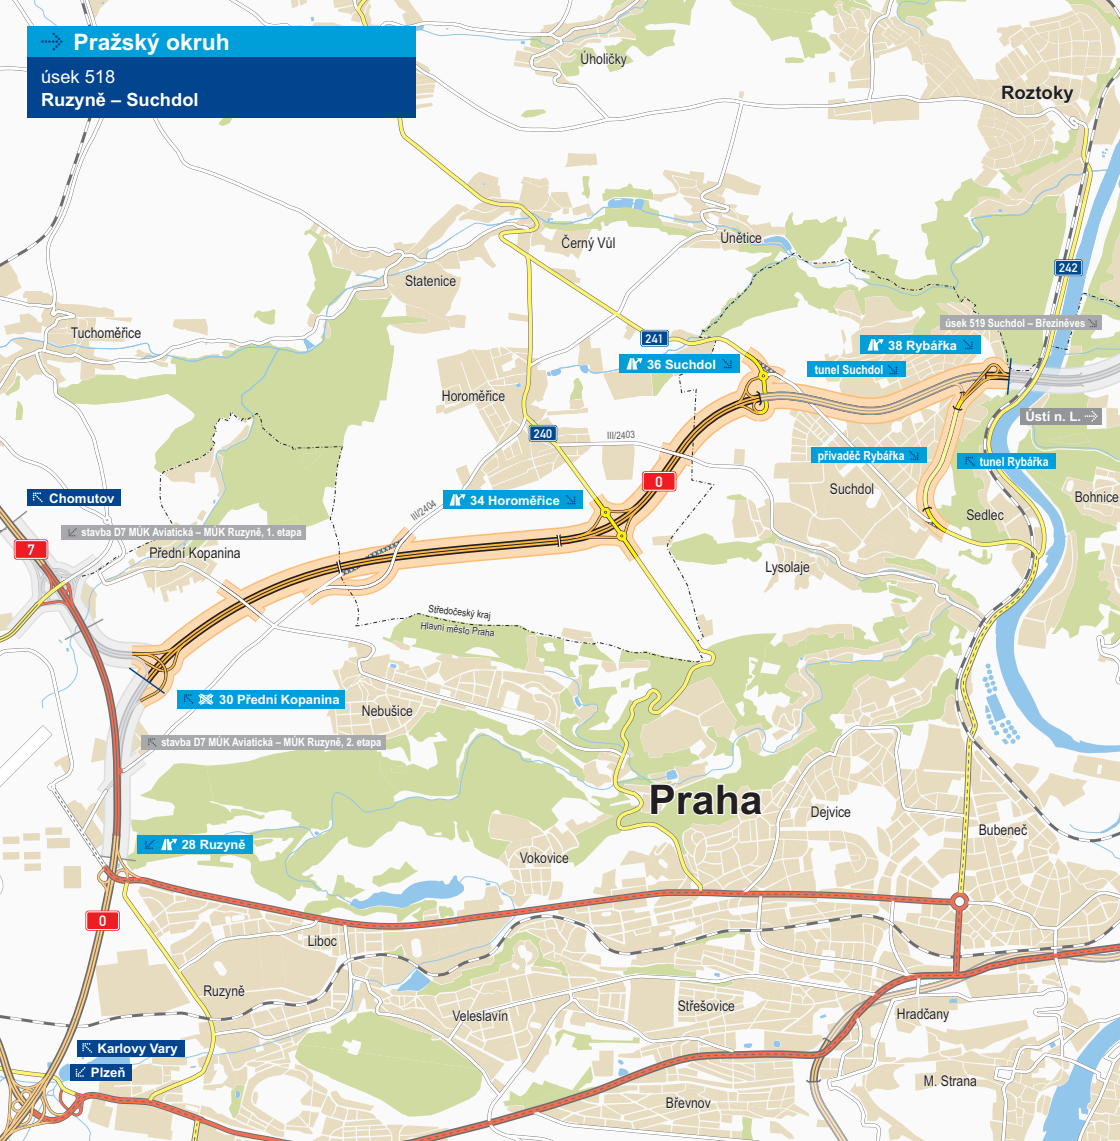

řešená stavba
jiné stavby



0 1 2 km

Geografická data poskytl VGHMÚF Dobruška, © MO ČR, 2008

ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

úsek 518 Ruzyně – Suchdol

Dálnice **D0**

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Trasa SOKP vedená v těchto studiích je vedená výhradně v koridoru schválených ZÚR hl.m. Prahy a Středočeského kraje (2. Aktualizace ZÚR Středočeského kraje nabyla účinnosti dne 4. 9. 2018). Závěr zjišťovacího řízení MŽP byl vydán 18.12.2019. Závěr vyžaduje prověřit možnost zrušení přivaděče Rybářka, snížení nivelety tunelu v Suchdole, snížení nivelety trasy v oblasti Horoměřic, vybudování tunelu Suchdol raženou metodou. Tato opatření mají zásadní vliv na obě stavby 518, 519. Tento požadavek vyvolal nutnost zpracování TES s termínem do 12/2020. Uvedené varianty jsou dokončeny.

Na stavbu byl dokončen čistopis technické studie (TES), která byla podkladem pro zpracování oznámení záměru. Probíhá aktualizace TES, která bude podkladem pro zpracování dokumentace EIA. Dokončení aktualizované TES v čistopise se předpokládá v 03/2022. Zahájení prací na dokumentaci EIA (po zajištění veškerých požadovaných podkladů dle závěrů zjišťovacího řízení) se předpokládá v 03/2022. Dokončení čistopisu dokumentace EIA v 12/2022 a předání na MŽP v 04/2023. Vydání závazného stanoviska pak do 12/2023.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
2023	2022	2025	2025	2025	2027	2030

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 8260 m
kategorie: D 34/100 (kategorie D 33,5 dle ČSN s rozšířeným SDP)

Tunely:

počet: 2 (Suchdol, Rybářka)
celková délka: 2870 m

Mostní objekty:

počet: 8
z toho nadjezdů: 8
celková délka mostů: 586 m

Mimoúrovňové křižovatky:

MÚK Přední Kopanina, MÚK Horoměřice, MÚK Suchdol, MÚK Rybářka
celková délka větví: 6359 m

Protihlukové stěny:

počet: 6 (celková délka: 1936 m)

Přeložky ostatních komunikací:

počet: 18
z toho přivaděč Rybářka:
MS2 9/9/50, 1860 m

silnice II. třídy: 2 (délka: 1371 m)
silnice III. třídy: 2 (délka: 1571 m)
místní komunikace: 5 (délka: 538 m)
obslužné komun.: 2 (délka: 1515 m)
polní cesty: 6 (délka: 4665 m)
celková délka: 11 520 m

Název stavby:

D0 518 Ruzyně – Suchdol

Místo stavby:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj

Katastrální území:

Přední Kopanina, Nebušice, Horoměřice, Lysolaje, Suchdol, Sedlec

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracovatel DÚR:

Pragoprojekt a.s.

Předpokládaná cena stavby:

12 587 160 000 Kč (bez DPH)



řešená stavba
jiné stavby



0 1 2 km

Geografická data poskytl VGHMÚF Dobruška, © MO ČR, 2008

ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

úsek 519 Suchdol – Březiněves

Dálnice **D0**

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Trasa SOKP vedená v těchto studiích je vedená výhradně v koridoru schválených ZÚR hl. m. Prahy a Středočeského kraje (2. Aktualizace ZÚR Středočeského kraje nabyla účinnosti dne 4. 9. 2018). Oznámení záměru stavby 519 předloženo na MŽP 3. 9. 2019 – závěr zjišťovacího řízení MŽP byl vydán 18. 12. 2019. Hlavní podmínkou je sloučení záměru D0 518 a 519 do jednoho záměru a předložit jednu dokumentaci EIA. ŘSD dále prověří korekci trasy kolem Dolních Chabíř. Stavby 518 a 519 mají rozpracované aktualizace Technické studie (TES). Dokončení TES v čistopise se očekává v 03/2022. Tato dokumentace bude podkladem pro zpracování dokumentace EIA. Dokončení čistopisu dokumentace EIA se předpokládá v 12/2022 a předání na MŽP v 04/2023. Vydání závazného stanoviska pak do 12/2023.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
2023	2023	2025	2025	2026	2027	2030

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 6670 m
kategorie: D 34/100 (kategorie D 33,5 dle ČSN s rozšířeným SDP)

Mostní objekty:

dálniční mosty: 3, nadjezdy: 5
na Prosecké radiále: 3
na větších křižovatkách: 4
nadchod pro zvěř: 1
lávka pro pěší: 1
celková délka mostů: 2185 m

Mimoúrovňové křižovatky:

MÚK Čimice, MÚK Ústecká,
MÚK Březiněves
celková délka větví: 11 978 m

Protihlukové stěny:

počet: 6

Přeložky ostatních komunikací:

počet: 18
přestavba Prosecké radiály na D8: 1
přivaděč Čimice: 1, (750 m)
silnice II. tříd: 3 (1652 m)
místní komunikace: 5
polní cesty: celková délka 8444 m
celková délka: 11 520 m

Celkový objem zemních prací:

výkopy: 2 265 764 m³
násypy: 1 029 289 m³

Název stavby:

D0 519 Suchdol – Březiněves

Místo stavby:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj

Katastrální území:

Suchdol, Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Zdíby, Březiněves, Dáblice

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracovatel TS:


AF-CITYPLAN spol. s r.o.

Zpracovatel DÚR:

Pudis a.s.

Předpokládaná cena stavby:

11 361 449 728 Kč (bez DPH)

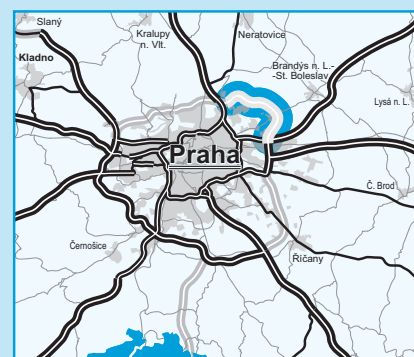

- řešená stavba
- tunelová varianta
- jiné stavby



0 1 2 km

Geografická data poskytl VGHMÚF Dobruška, © MO ČR, 2015

ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

úsek 520 Brezíněves – Satalice

Dálnice **D0**

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V 01/2019 byly započaty práce na konsolidované TES, která variantně obsahuje 1. optimální řešení trasy, 2. řešení trasy zahloubené a 3. řešení trasy s tunelovou variantou 2. Konsolidovaná TES je zadána jako technicko-ekonomická studie, jejíž součástí je ekonomické hodnocení HDM-4 navržených variant. Představení konsolidované TES včetně ekon. hodnocení CK MD za účasti zastupitelů dotčených MČ obcí se uskutečnilo 12. 2. 2020. Odevzdání čistopisu TES se předpokládá v 03/2022. Centrální komise MD rozhodla, že budou posuzovány všechny tři varianty. Na základě požadavku obcí i CK MD začalo RSD prověřovat technickou proveditelnost přeložky silnice II/610 v úseku Brandýs nad Labem – dálnice D0 jako přivaděče, a to mimo zástavbu obcí Dřevčice a Podolanka. Dne 19. 10. 2020 bylo zveřejněno oznámení o zahájení zjišťovacího řízení EIA k záměru. Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 24. 3. 2021. Ze závěru např. plyne, že v dokumentaci EIA je nutné detailněji rozpracovat technické řešení variant 2 a 3 nebo (lépe) kombinaci těchto variant. Naopak varianta 1 se nedoporučuje v dokumentaci EIA nadále rozpracovávat a prověřovat. Zahájení prací na dokumentaci EIA se předpokládá v 08/2022. Následné zpracování dokumentace EIA se předpokládá do 07/2023.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
2024	2023	2026	2026	2027	2027	2030

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 12 953 m
kategorie: D 34/100 (kategorie D 33,5 dle ČSN s rozšířeným SDP)
Tunely (jen v tunelové variantě):
Třeboradice (1330 m), Veleň (450 m), Vínov (2050 m)
Mostní objekty:
počet: 21/15
z toho dálniční mosty: 8/5
nadjezdy: 8/4
na větších křižovatkách: 1/1
na kolektoru: 1/1
most na místní komunikaci: 1/1

železniční most: 1/1
technolog. mosty přes SOKP: 1/2
celková délka mostů: 1166/656 m
Mimourovňové křižovatky:
MÚK Třeboradice, MÚK Přezletice, MÚK Vínov, MÚK Satalice
Protihlukové stěny a zemní valy:
počet stěn: 1, počet valů: 24/14
Přeložky ostatních komunikací:
počet: 18
silnice II. třídy: 1 (420 m)
silnice III. třídy: 7 (5044 m)
polní cesty: 4
celková délka: 5464 m

Celkový objem zemních prací:

výkopy: 3 037 090/4 789 359 m³
násypy: 94 246/317 881 m³

Název stavby:

D0 520 Brezíněves – Satalice

Místo stavby:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj
Katastrální území:
Brezíněves, Dáblčice, Horní Počernice, Miškovice, Satalice, Třeboradice, Vínov, Jenštejn, Podolanka, Přezletice, Radonice u Prahy, Veleň, Zdíby

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracovatel TS:

Společnost Pragoprojekt/APIS - SOKP 520

Předpokládaná cena stavby

(bez DPH):

Varianta 1: 11 824 778 938 Kč
Varianta 2: 13 829 497 298 Kč
Varianta 3: 24 099 396 641 Kč

Poznámky



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC A DÁLNIC ČR**
